

2009 年中央水利投资计划落实情况

旬报

第 18 期

水利部规划计划司

2009 年 11 月 6 日

一、投资计划下达情况

2009 年已累计安排中央水利建设投资计划共计 435.03 亿元（不含南水北调 45 亿元），其中包括 2009 年新增中央水利预算内投资计划（以下简称第二批投资）140 亿元，扩大内需第三批中央水利建设投资计划（以下简称第三批投资）180 亿元以及扩大内需第四批中央预算内投资计划（以下简称第四批投资）115.03 亿元，分别累计投入农村饮水安全工程、大中型病险水库除险加固工程、大型灌区续建配套与节水改造工程和重大水利项目 152 亿元、88 亿元、32 亿元和 163.03 亿元。截至 2009 年 10 月 31 日，各省（区、市）已下达到项目单位的中央投资计划 434.06 亿元：其中第二、三批中央投资计划 320 亿元已全部下达；第四批投资计划已下达 114.06 亿元，占投资计划的 99.6%（不含西藏一江两河专项非水利部门实施项目投资 0.5 亿元）。

第四批投资计划按工程类型分，大型灌区续建配套与节水改造工程和重大水利项目分别有 32.0 亿元和 82.1 亿元的投资下达

到项目单位，下达率分别为 100%和 99.4%（见表 1）。

表 1 第四批新增中央水利投资计划下达情况


工程类型	09 年累计安排中央水利投资计划（亿元）	累计下达投资	投资计划下达比例
合计	115.03	114.06	99.6%
大型灌区续建配套与节水改造	32.00	32.00	100.0%
重大水利工程	83.03	82.06	99.4%
农村小水电	6.00	5.99	99.8%
血防	2.00	1.93	96.5%
石羊河治理	8.00	8.00	100.0%
首都水资源	1.00	1.00	100.0%
丹江口水土保持	6.00	6.00	100.0%
其他重大水利项目	60.03	59.15	99.4%

第二、第三批中央水利建设投资要求地方配套共计 223.4 亿元（包括银行贷款）。截至 10 月 31 日，各省（区、市）已下达地方配套投资计划 222.1 亿元，占要求配套的 99.4%。计划未全部下达的有山东、青海、山西和新疆。截至 10 月 31 日，各直属单位、省（区、市）已下达第四批中央水利建设投资地方配套投资计划 103.7 亿元，占要求配套的 95.2%。计划下达率低于 90% 的有广东、山西、西藏、河南、湖北、贵州、新疆和青海。

二、资金到位情况


截至 10 月 31 日，第二、第三批投资已拨付项目单位中央投资 319.94 亿元，拨付率为 99.98%。甘肃省中央投资尚未全部拨付。第二、第三批地方配套投资已拨付项目单位 191.5 亿元，拨付率为 85.7%（见图 1），其中省级配套投资 90.0 亿元，地县级配套投资 76.3 亿元，其他配套投资 25.2 亿元。

图1 第二、三批新增水利投资地方配套投资拨付率

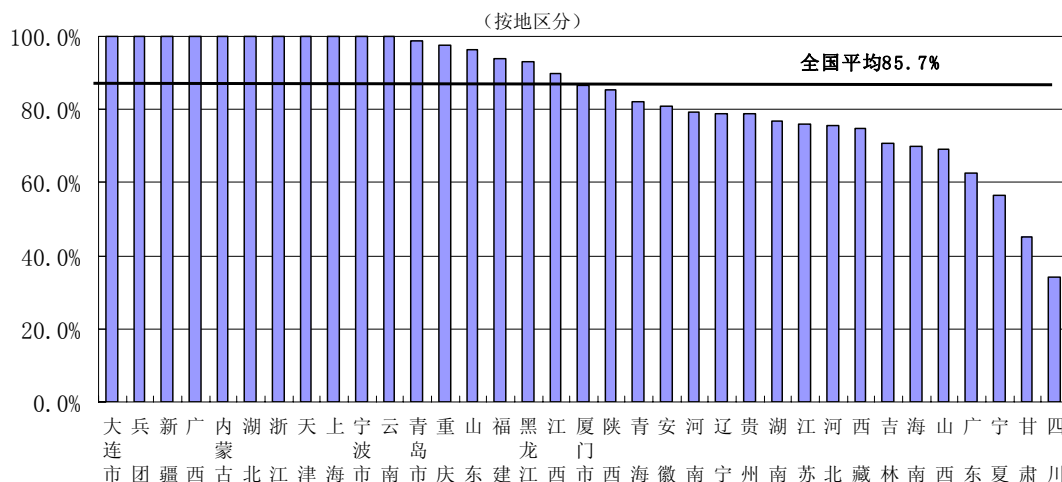

第四批投资，各直属单位、省（区、市）已拨付项目单位中央投资 88.3 亿元，拨付率为 77.1%（见图 2）。已拨付地方配套投资 44.3 亿元，拨付率为 40.6%。

图2 第四批新增水利投资拨付情况

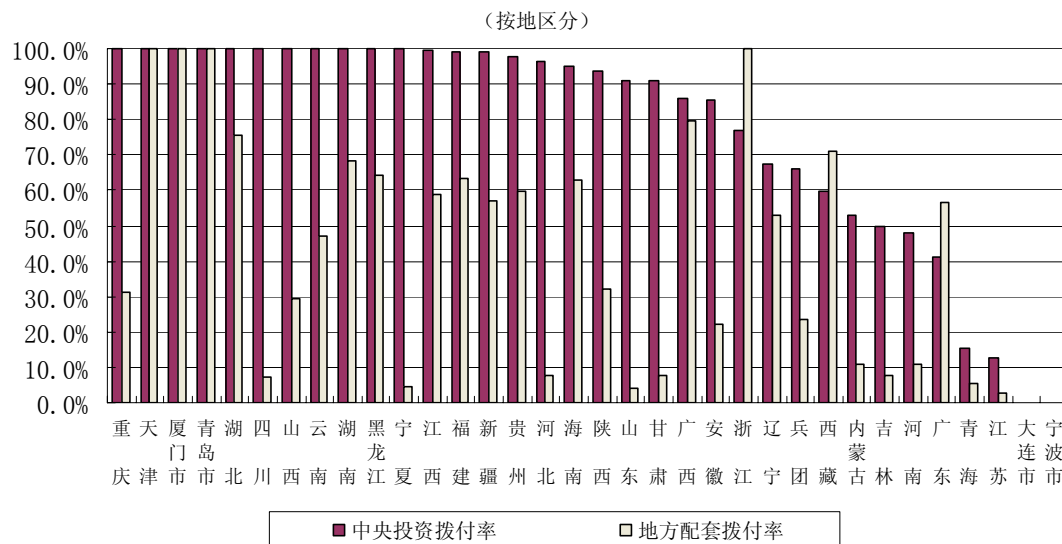

三、前期工作和开工情况


2009 年中央新增水利投资计划各地已分解落实水利建设项目 4793 个，其中第二、第三批水利投资计划项目 3322 个，第四批 1471 个。

四、投资完成情况

截至10月31日，第二、第三批投资已累计完成253.2亿元，其中，中央投资167.9亿元，地方配套投资85.3亿元，投资计划完成率分别为52.5%（见图4）和38.2%。在完成的中央投资中，农村饮水安全项目100.2亿元，占计划的65.9%；重大水利项目39.7亿元，占计划的49.6%；大中型病险水库除险加固工程28.0亿元，占计划的31.8%。

第四批水利投资计划已累计完成42.7亿元，其中，中央投资24.7亿元，地方配套投资18.0亿元，投资计划完成率分别为21.6%和16.5%。在完成的中央投资中，大型灌区续建配套与节水改造4.2亿元，占计划的13.1%；重大水利工程20.5亿元，占计划的24.8%。

图4 第二、三批新增中央水利投资完成率
(按地区分)

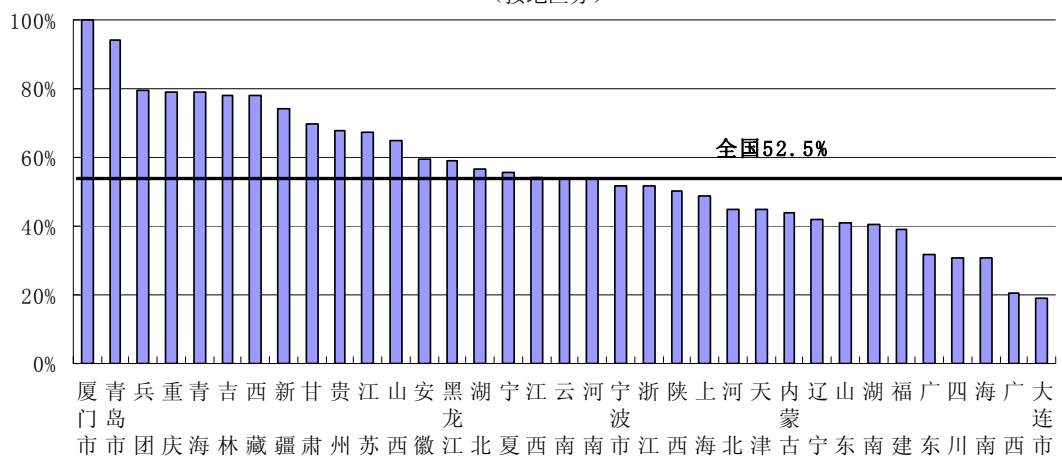

五、工程进展情况

第二、第三批水利投资计划已开工项目累计投入劳动力8659.9万工日，累计完成土方40011.3万立方米，石方4936.9

万立方米，砼 493.8 万立方米，金属结构 19.1 万吨。已解决农村饮水安全人口 2200.8 万人，累计新建及加固堤防长度 356.6 公里，河道清淤疏浚和岸线整治 36.5 公里，累计治理水土流失面积 1787.4 平方公里。第四批水利投资计划已开工项目累计投入劳动力 718.6 万工日，累计完成土方 2760.4 万立方米，石方 828.2 万立方米，砼 62.3 万立方米，金属结构 2.4 万吨。

发送：部领导，总工程师、总规划师、副总工程师，部有关司局、直属单位；国家发展改革委投资司、农经司；监察部综合室；国家审计署投资司、农林水审计局；有关省（自治区、直辖市）政府主管领导、水利（水务）厅（局），有关计划单列市水利（水务）局，新疆生产建设兵团水利局。

共印 150 份
