

# 水利规划计划简报

(中央水利建设投资统计月报 2015-6)

2015 年第 25 期

水利部规划计划司

2015 年 7 月 8 日

## 一、2015 年中央水利建设投资情况


截至 2015 年 6 月 30 日,已累计下达中央水利建设投资计划 1598.16 亿元,地方累计分解下达 1317.15 亿元、累计拨付项目单位资金 1073.84 亿元、累计完成投资 339.89 亿元,中央投资下达率、资金到位率、投资完成率分别为 82.4%、67.2%和 21.3%。分项目类型、分地区中央水利建设投资及配套投资的落实及完成情况详见附表 1、附表 2。

### (一) 投资计划下达情况

1. 中央预算内投资。2015 年中央预算内水利投资计划 754.3 亿元,要求地方配套投资 514.9 亿元。已下达项目单位中央投资 660.5 亿元、地方配套投资 452.6 亿元,投资计划下达率分别为 87.6%和 87.9%。在中央预算内水利投资计划中,农村饮水安全、大中型病险水库(闸)除险加固、水土保持、中型水库、主要支流治理项目的下达率分别为 99.7%、82.9%、38.8%、86.8%和


63.8%。分地区中央预算内投资下达情况见图 1。

图1 2015年中央预算内投资计划下达率  
(按地区分)

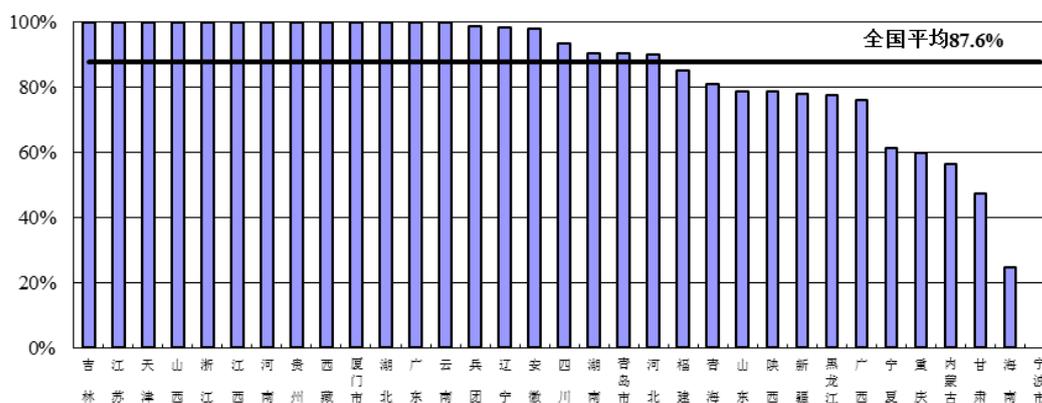

2. 中央财政专项资金。2015 年中央财政水利专项资金预算 843.9 亿元，要求地方配套投资 355.5 亿元。已分解下达项目单位中央财政水利专项资金预算 656.7 亿元，地方配套投资 327.0 亿元，预算分解下达率分别为 77.8%和 92.0%。其中，江河湖库水系综合整治、农田水利建设和水土保持专项、山洪灾害防治项目的预算分解下达率分别为 88.1%、62.7%和 85.5%。分地区中央财政水利专项资金下达情况见图 2。

图2 2015年中央财政水利专项投资下达率  
(按地区分)

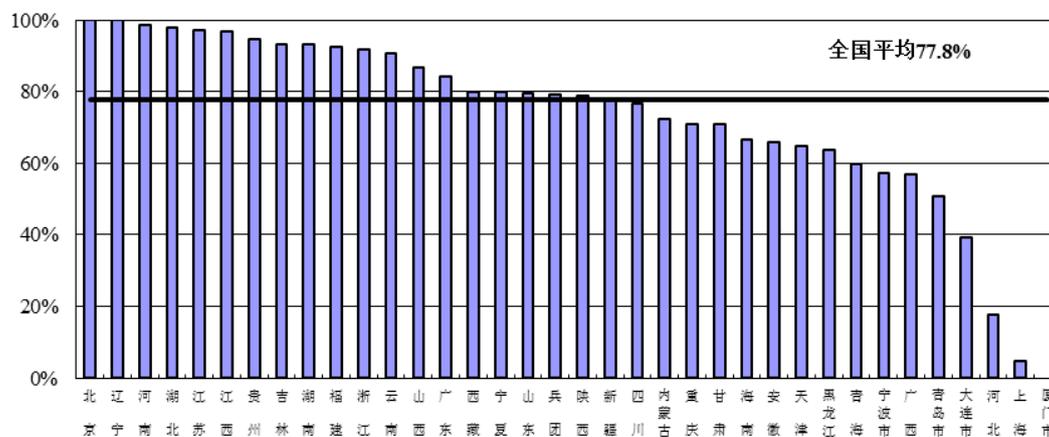

其中，重大水利工程已下达中央投资计划 526 亿元，地方已分解下达到项目单位 488.6 亿元，投资计划分解下达率 92.9%。其中，重大农业节水工程、重大引调水工程、重点水源工程、江河湖泊治理骨干工程、新建大型灌区工程及其他工程中央投资下达率分别为 96.5%、100%、91.0%、84.6%、83.3%和 100%。

## **（二）资金到位情况**

1. **中央预算内资金。**2015 年中央预算内水利建设投资计划，已拨付项目单位中央投资 513.4 亿元、地方配套投资 188.1 亿元，到位率分别为 68.1%和 36.5%。

2. **中央财政专项资金。**2015 年中央财政水利专项资金预算，已拨付项目单位中央资金 560.5 亿元，资金到位率为 66.4%；已拨付项目单位配套资金 199.4 亿元，资金到位率为 56.1%。

其中，重大水利工程专项投资已到位资金 326.1 亿元，投资到位率 62.0%。其中，重大农业节水工程、重大引调水工程、重点水源工程、江河湖泊治理骨干工程、新建大型灌区工程及其他工程中央投资到位率分别为 74.4%、96.2%、59.9%、66.8%、59.5%和 30.8%。


## **（三）项目开工情况**

2015 年中央水利投资计划已分解落实水利建设项目 9686 个，其中中央预算内水利投资计划 4107 个，累计开工 2426 个，开工率 59.1%；中央财政水利专项资金预算 5579 个，累计开工 2346 个，开工率 42.1%。

#### (四) 投资完成情况


1. 中央预算内投资。2015 年中央预算内水利投资计划，已累计完成投资 348.2 亿元。其中，中央投资 235.9 亿元，地方配套投资 112.2 亿元，完成率分别为 31.3%和 21.8%。在完成的中央投资中，农村饮水安全、大中型病险水库（闸）除险加固、水土保持、中型水库、主要支流治理项目的完成率分别为 57.7%、16.2%、0.8%、27.3%和 8.1%。分地区中央预算内投资完成情况见图 3。

图3 2015年中央预算内投资中央投资完成率  
(按地区分)

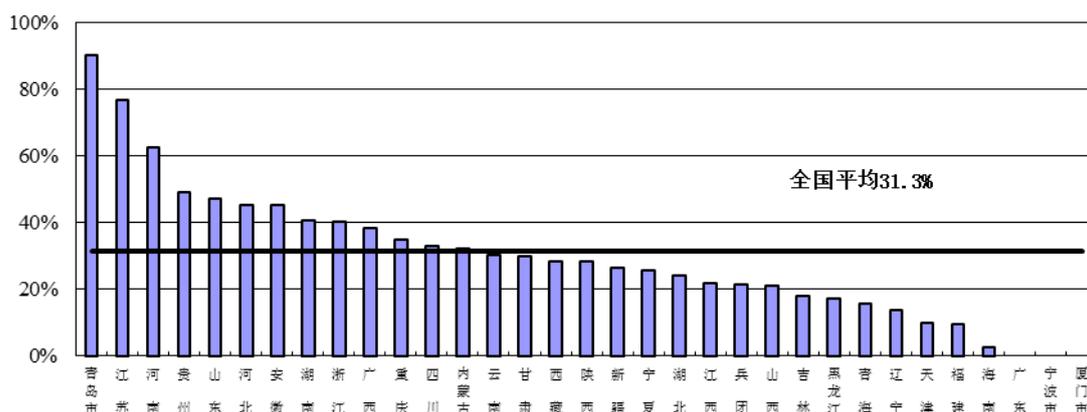


2. 中央财政专项资金。2015 年中央财政水利专项资金预算，已累计完成投资 153.4 亿元。其中，中央资金 104.0 亿元，地方配套资金 49.4 亿元，完成率分别为 12.3%和 13.9%。在完成的中央资金中，江河湖库水系综合整治、农田水利建设和水土保持专项、山洪灾害防治项目的完成率分别为 24.3%、6.6%和 7.6%。分地区中央财政专项资金完成情况见图 4。

图4 2015年中央财政水利专项投资完成率  
(按地区分)

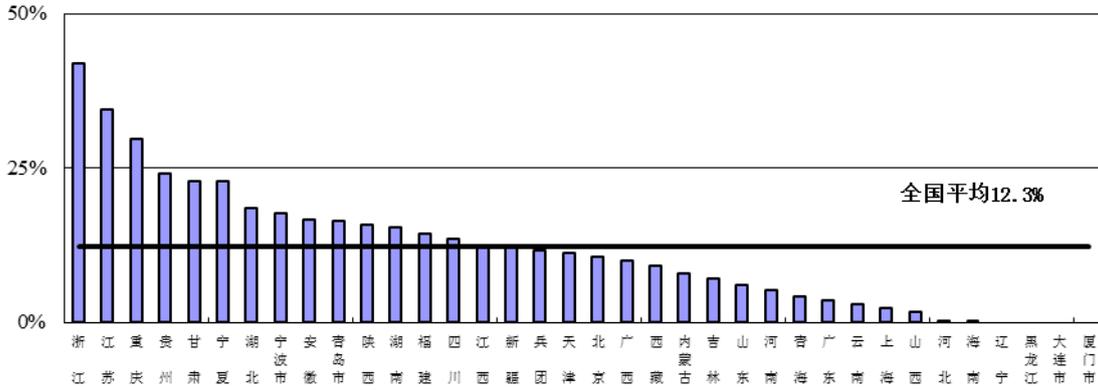

其中，重大水利工程专项投资已完成 87.5 亿元，投资完成率 16.6%。其中，重大农业节水工程、重大引调水工程、重点水源工程、江河湖泊治理骨干工程、新建大型灌区工程及其他工程中央投资完成率分别为 2.4%、33.4%、16.7%、25.7%、8.5%和 15.7%。

图5 重大水利工程中央投资完成

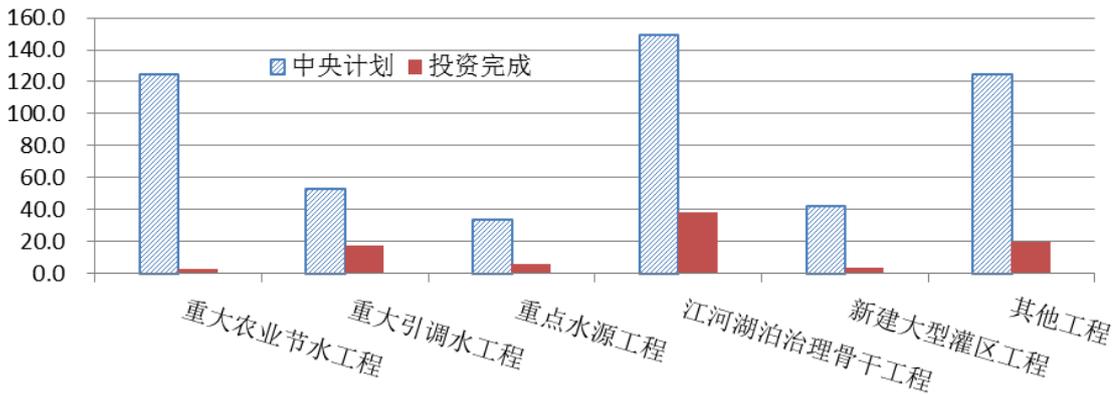

## 二、2014 年中央水利建设投资情况

截至 2015 年 6 月 30 日，纳入月报统计的 2014 年中央水利建设投资 1604.55 亿元，累计下达项目单位投资计划 1603.5 亿

元，累计拨付项目单位资金 1592.3 亿元，项目单位累计完成投资 1478.5 亿元，投资下达率、资金到位率、投资完成率分别为 99.9%、99.2%和 92.1%。
