

水利规划计划简报

(中央水利建设投资统计月报 2015-7)

2015 年第 29 期

水利部规划计划司

2015 年 8 月 10 日

今年 1~7 月,各地累计完成中央水利建设投资计划 1464.5 亿元,较去年同期增加 656 亿元,增幅 81.1%。当月完成中央投资计划 232.7 亿元,较上月增加 14 亿元。

一、2015 年中央水利建设投资情况

截至 2015 年 7 月 31 日,已累计下达中央水利建设投资 1632.66 亿元,地方累计分解下达 1526.18 亿元、累计拨付项目单位资金 1363.62 亿元、累计完成投资 497.33 亿元,中央投资分解下达率、资金到位率、投资完成率分别为 93.5%、83.5%和 30.5%,项目开工率为 54.3%。中央投资完成率前 5 位的省份有:浙江、河南、江苏、安徽和贵州;后 5 位的省份是:**上海、河北、天津、山西和黑龙江**。其中,重大水利工程中央投资完成率前 5 位的省份有江苏、海南、福建、浙江和贵州;后 5 位的省份是:**甘肃、广西、河北、内蒙古和云南**。


分项目类型、分地区中央水利建设投资及配套投资的落实及

完成情况详见附表 1、附表 2。

（一）投资计划分解下达情况

2015 年已安排中央水利建设投资计划 2533.2 亿元，其中，中央投资 1632.7 亿元，地方配套投资 900.5 亿元。截至 7 月 31 日，各地已分解下达到项目单位年度中央投资计划 2419.2 亿元，投资分解下达率 95.5%，其中中央投资、地方配套投资分解下达率分别为 93.5%和 99.2%。中央投资分解下达率不足 90%的地区有：安徽、河北、广西、陕西、天津、甘肃、海南、青岛、宁波。

图1 2015年中央投资下达率（按地区分）

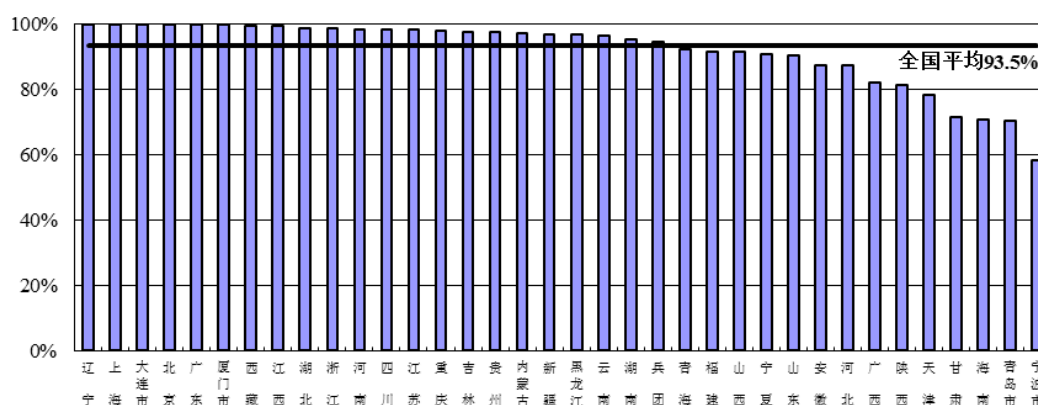

1. 中央预算内投资。2015 年已安排中央预算内水利投资计划 1303.3 亿元（中央投资 788.8 亿元，地方配套投资 514.5 亿元），地方已分解下达 1274.7 亿元，分解下达率 97.0%。其中，中央投资已分解下达 744.1 亿元，分解下达率 94.3%；地方配套投资已分解下达 520.6 亿元，分解下达率 101.2%。从项目类别看，农村饮水安全、大中型病险水库（闸）除险加固、水土保持、中型水库、主要支流治理项目的中央投资下达率分别为 100.0%、

3. 重大水利工程。重大水利工程已安排年度中央水利投资计划 960.4 亿元(中央投资 560.5 亿元,地方配套投资 399.9 亿元),地方已分解下达 912.5 亿元,分解下达率 95.0%。其中,中央投资已分解下达 535.1 亿元,分解下达率 95.5%;地方配套投资已分解下达 377.4 亿元,分解下达率 94.4%。从工程类别看,重大农业节水工程、重大引调水工程、重点水源工程、江河湖泊治理骨干工程、新建大型灌区工程及其他工程中央投资分解下达率分别为 99.7%、81.4%、100.0%、92.4%、100.0%和 99.7%。

(二) 资金到位情况

2015 年中央水利建设年度投资计划已拨付项目单位 1866.0 亿元,资金到位率 73.7%。其中,中央投资到位 1363.6 亿元,到位率 83.5%;地方配套投资到位 502.4 亿元,到位率 55.8%。

1. 中央预算内投资。2015 年中央预算内水利建设投资计划已拨付项目单位 932.6 亿元,资金到位率 71.6%。其中,中央投资到位 668.0 亿元,到位率 84.7%;地方配套投资到位 264.6 亿元,到位率 51.4%。

2. 中央财政专项资金。2015 年中央财政水利专项资金预算已拨付项目单位 933.5 亿元,资金到位率 75.9%。其中,中央资金到位 695.7 亿元,到位率为 82.4%;地方配套资金到位 237.8 亿元,到位率为 61.6%。

3. 重大水利工程。重大水利工程投资已到位 619.1 亿元,资

金到位率 64.5%。其中，中央投资到位 461.3 亿元，到位率 82.3%；地方配套投资到位 157.8 亿元，到位率 39.5%。从工程类别看，重大农业节水工程、重大引调水工程、重点水源工程、江河湖泊治理骨干工程、新建大型灌区工程及其他工程中央投资到位率分别为 85.6%、78.3%、76.9%、78.4%、88.3%和 86.0%。


（三）项目开工情况

2015 年中央水利投资计划已分解落实水利建设项目 12444 个，较上月增加 2758 个，工程开工率 54.3%，较上月增加 5%。其中中央预算内水利投资计划 4885 个，累计开工 3022 个，开工率 61.9%；中央财政水利专项资金预算 7559 个，累计开工 3736 个，开工率 49.4%。项目开工率较高的地区有北京、浙江、西藏、宁夏和陕西，较低的地区有：海南、辽宁、江苏、内蒙古和上海。

（四）投资完成情况


已累计完成 2015 年中央水利建设投资计划 734.3 亿元，完成率 29.0%。其中，完成中央投资 497.3 亿元，完成率 30.5%；完成地方配套投资 237.0 亿元，完成率 26.3%。中央投资完成率较高省份有浙江、河南、江苏、安徽和贵州，较低省份有：黑龙江、山西、天津、河北和上海。

图4 2015年中央投资完成率
(按地区分)

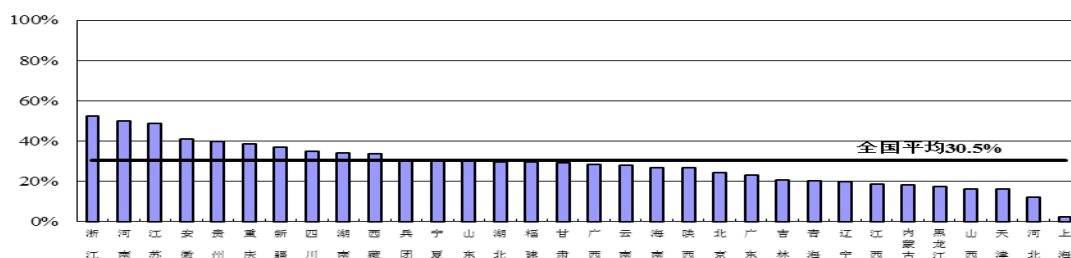


1. 中央预算内投资。已累计完成中央预算内水利投资计划495.9亿元，完成率38.1%。其中，完成中央投资323.9亿元，完成率41.1%；完成地方配套投资172.0亿元，完成率33.4%。从项目类别看，农村饮水安全、大中型病险水库（闸）除险加固、水土保持、中型水库、主要支流治理项目的中央投资完成率分别为71.7%、30.8%、2.7%、48.6%和18.4%。分地区中央预算内投资完成情况见图5。

图5 2015年中央预算内投资完成率
(按地区分)

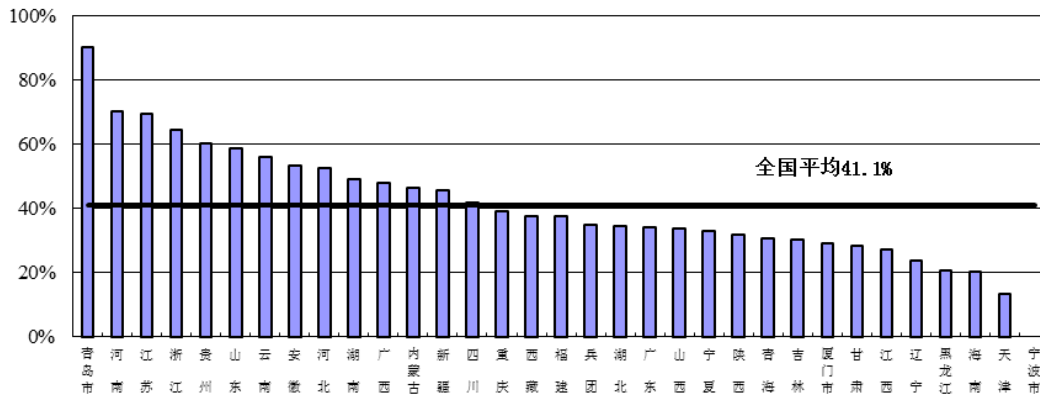


2. 中央财政专项资金。已累计完成中央财政水利专项资金预算238.3亿元，完成率19.4%。其中，完成中央资金173.4亿元，完成率20.6%；完成地方配套资金64.9亿元，完成率16.8%。从项目类别看，江河湖库水系综合整治、山洪灾害防治项目、农田水利建设和水土保持专项的中央资金完成率分别为33.4%、15.1%、10.8%。分地区中央财政专项资金完成情况见图6。

图6 2015年中央财政水利专项资金完成率
(按地区分)

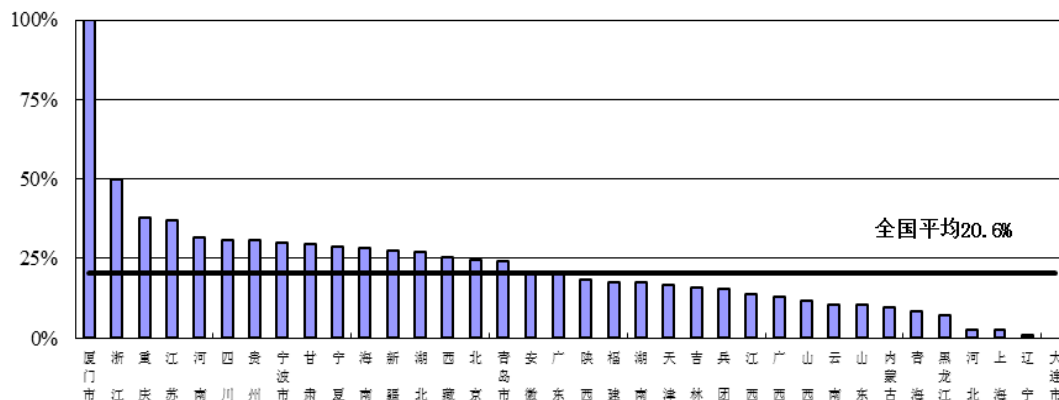

3. 重大水利工程。重大水利工程已完成年度中央水利投资计划 222.6 亿元，投资完成率为 23.2%。其中，完成中央投资 147.3 亿元，完成率 26.3%；完成地方配套投资 75.3 亿元，完成率 18.8%。从工程类别看，重大农业节水工程、重大引调水工程、重点水源工程、江河湖泊治理骨干工程、新建大型灌区工程及其他工程中央投资完成率分别为 5.7%、33.6%、25.7%、37.3%、38.5%和 24.4%。

图7 2015年重大水利工程中央投资完成情况

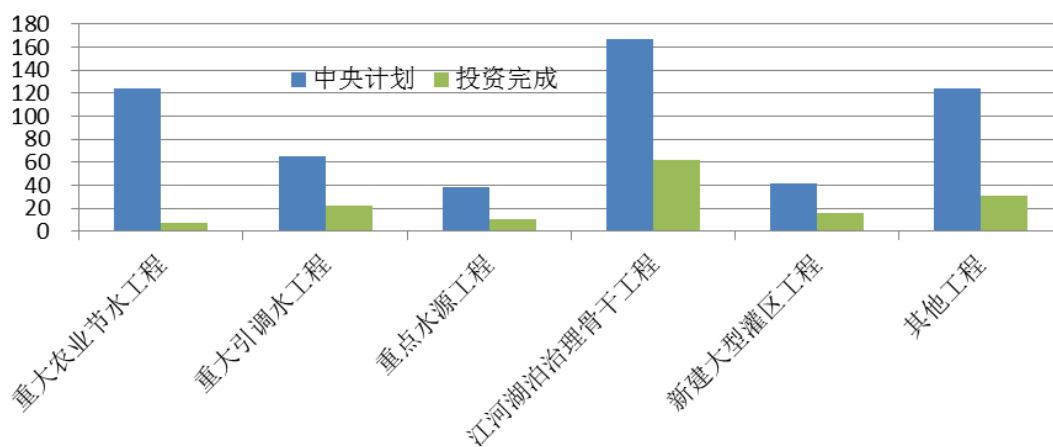

二、2014 年中央水利建设投资情况

截至 2015 年 7 月 31 日，纳入月报统计的 2014 年中央水利建设投资 1604.55 亿元，累计下达项目单位投资计划 1603.9 亿元，累计拨付项目单位资金 1593.5 亿元，项目单位累计完成投资 1496.3 亿元，投资下达率、资金到位率、投资完成率分别为 99.9%、99.3%和 93.3%。
