

# 水利规划计划简报

(中央水利建设投资统计月报 2015-9)

2015 年第 37 期

水利部规划计划司

2015 年 10 月 13 日

今年 1~9 月,各地累计完成中央水利建设投资计划 2206.3 亿元,较去年同期增加 996.9 亿元,增幅 82.4%。当月完成中央投资计划 385.6 亿元,较上月增加 29.4 亿元。

## 一、2015 年中央水利建设投资情况

截至 2015 年 9 月 30 日,已累计下达中央水利建设投资 1683.32 亿元,地方累计分解下达 1676.55 亿元、累计拨付项目单位资金 1629.59 亿元、累计完成投资 939.56 亿元,中央投资分解下达率、资金到位率、投资完成率分别为 99.6%、96.8%和 55.8%,项目开工率为 82.1%。中央投资完成率前 5 位的地区有:浙江、江苏、青岛、云南和兵团;后 5 位的地区是:**河北、上海、江西、吉林和陕西**。其中,重大水利工程中央投资完成率前 5 位的地区有天津、福建、浙江、江苏和海南;后 5 位的地区是:**青海、河北、宁波、北京和广西**。

分项目类型、分地区中央水利建设投资及配套投资的落实及

完成情况详见附表 1、附表 2。

### **(一) 投资计划分解下达情况**

2015 年已安排中央水利建设投资计划 2613.7 亿元，其中，中央投资 1683.3 亿元，地方配套投资 930.4 亿元。截至 9 月 30 日，各地已分解下达到项目单位年度中央投资计划 2637.9 亿元，投资分解下达率 100.9%。中央投资未全部分解下达的地区有：**黑龙江、辽宁、安徽、四川、广西、陕西、江西、兵团、内蒙古、西藏、山东、湖南和青海。**

1. **中央预算内投资。**2015 年已安排中央预算内水利投资计划 1353.6 亿元（中央投资 839.1 亿元，地方配套投资 514.5 亿元），地方已分解下达 1391.1 亿元，分解下达率 102.77%。其中，中央投资已分解下达 838.8 亿元，分解下达率 99.96%；地方配套投资已分解下达 552.3 亿元，分解下达率 107.3%。从项目类别看，中央预算内投资未全部分解下达的只有行业能力建设，分解下达率为 97.64%。

2. **中央财政专项资金。**2015 年中央财政水利专项资金预算 1260.1 亿元（中央资金 844.2 亿元，地方配套资金 415.9 亿元），已分解下达 1246.8 亿元，分解下达率 98.9%。其中，中央资金已分解下达 837.8 亿元，分解下达率 99.2%；地方配套资金已分解下达 409.1 亿元，分解下达率 98.4%。从项目类别看，中央财政专项资金未全部分解下达的有小型病险水库出险加固、中小河流治理、小型农田水利建设、山洪灾害防治、农发资金用于水土

保持和农发资金用于中型灌区，分解下达率分别为 99.8%、99.97%、99.72%、99.97%、87.4%和 70.0%。

其中，重大水利工程已安排年度中央水利投资计划 1009.8 亿元（中央投资 609.95 亿元，地方配套投资 399.85 亿元），地方已分解下达 995.8 亿元，分解下达率 98.6%。其中，中央投资已分解下达 609.95 亿元，分解下达率 100.0%；地方配套投资已分解下达 385.87 亿元，分解下达率 96.5%。

## （二）资金到位情况

2015 年中央水利建设年度投资计划已拨付项目单位 2345.8 亿元，资金到位率 89.8%。其中，中央投资到位 1629.6 亿元，到位率 96.8%；地方配套投资到位 716.2 亿元，到位率 77.0%。

1. 中央预算内投资。2015 年中央预算内水利建设投资计划已拨付项目单位 1210.9 亿元，资金到位率 89.5%。其中，中央投资到位 807.7 亿元，到位率 96.3%；地方配套投资到位 403.1 亿元，到位率 78.4%。

2. 中央财政专项资金。2015 年中央财政水利专项资金预算已拨付项目单位 1135.0 亿元，资金到位率 90.1%。其中，中央资金到位 821.9 亿元，到位率为 97.4%；地方配套资金到位 313.1 亿元，到位率为 75.3%。

其中，重大水利工程投资已到位 817.3 亿元，资金到位率 80.9%。其中，中央投资到位 579.5 亿元，到位率 95.0%；地方

配套投资到位 237.8 亿元，到位率 59.5%。从工程类别看，重大农业节水工程、重大引调水工程、重点水源工程、江河湖泊治理骨干工程、新建大型灌区工程及其他工程中央投资到位率分别为 97.8%、97.6%、81.1%、93.1%、97.7%和 97.0%。


### （三）项目开工情况

2015 年中央水利投资计划已分解落实水利建设项目 15138 个，较上月增加 509 个，工程开工率 82.1%，较上月增加 14.0%。其中中央预算内水利投资计划 5129 个，累计开工 4486 个，开工率 87.5%；中央财政水利专项资金预算 10009 个，累计开工 7947 个，开工率 79.4%。项目全部开工的地区有北京、天津、西藏、大连、宁波和厦门，开工率较低的地区有：安徽、江西、上海、河北、吉林、内蒙古和海南。

### （四）投资完成情况


已累计完成 2015 年中央水利建设投资计划 1404.8 亿元，完成率 53.8%。其中，完成中央投资 939.6 亿元，完成率 55.8%；完成地方配套投资 465.2 亿元，完成率 50.0%。当月完成中央投资计划 349.7 亿元，较上月增加 28.8 亿元，增幅 9.0%。其中，完成中央投资 224.5 亿元，较上月增加 6.8 亿元，增幅 3.1%；完成地方配套投资 125.1 亿元，较上月增加 21.9 亿元，增幅 21.2%。中央投资完成率较高地区有浙江、江苏、青岛、云南和兵团，较低省份有：内蒙古、海南、陕西、吉林、江西、上海和河北。

图1 2015年中央投资完成率  
(按地区分)

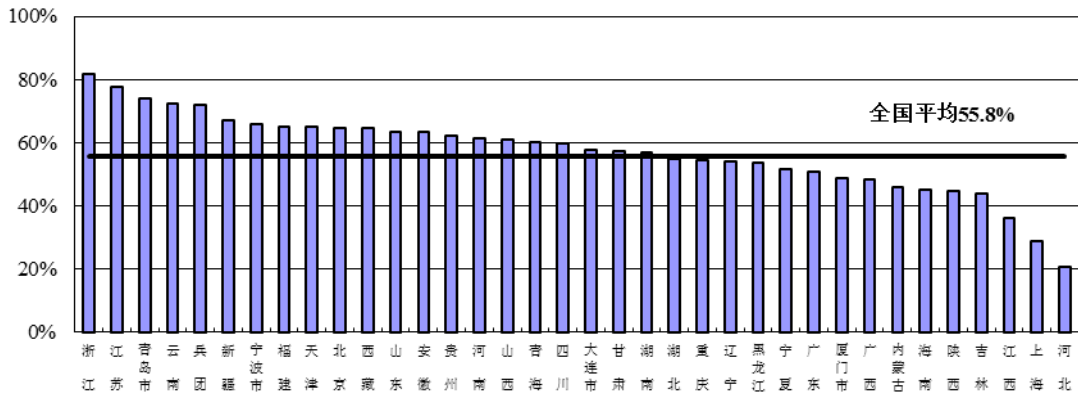

1. 中央预算内投资。已累计完成中央预算内水利投资计划872.0亿元，完成率64.4%。其中，完成中央投资552.8亿元，完成率65.9%；完成地方配套投资319.2亿元，完成率62.0%。从项目类别看，农村饮水安全、大中型病险水库（闸）除险加固、水土保持、中型水库、主要支流治理项目的中央投资完成率分别为92.5%、56.5%、26.8%、80.0%和51.3%。分地区中央预算内投资完成情况见图2。


图2 2015年中央预算内投资完成率  
(按地区分)

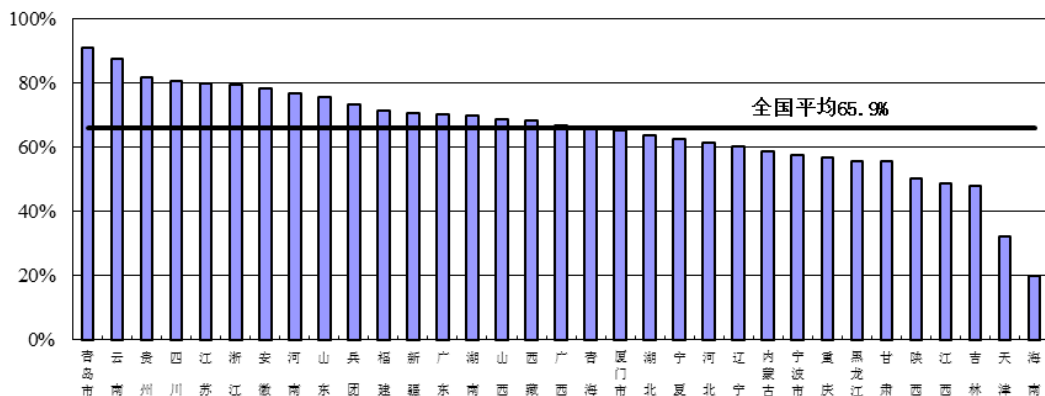

2. 中央财政专项资金。已累计完成中央财政水利专项资金预


算 532.8 亿元，完成率 42.3%。其中，完成中央资金 386.8 亿元，完成率 45.8%；完成地方配套资金 146.1 亿元，完成率 35.1%。从项目类别看，江河湖库水系综合整治、山洪灾害防治项目、农田水利建设和水土保持专项的中央资金完成率分别为 58.1%、44.8%、34.0%。分地区中央财政专项资金完成情况见图 3。

图3 2015年中央财政水利专项资金完成率  
(按地区分)

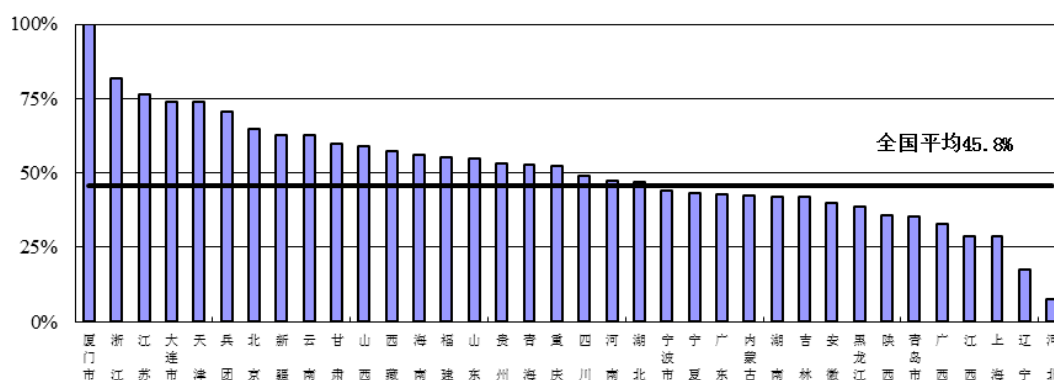

其中，重大水利工程已完成年度中央水利投资计划 478.2 亿元，投资完成率为 47.4%。其中，完成中央投资 324.6 亿元，完成率 53.2%；完成地方配套投资 153.6 亿元，完成率 38.4%。从工程类别看，重大农业节水工程、重大引调水工程、重点水源工程、江河湖泊治理骨干工程、新建大型灌区工程及其他工程中央投资完成率分别为 40.4%、52.1%、46.2%、55.3%、60.8%和 62.9%。

图4 2015年重大水利工程中央投资完成

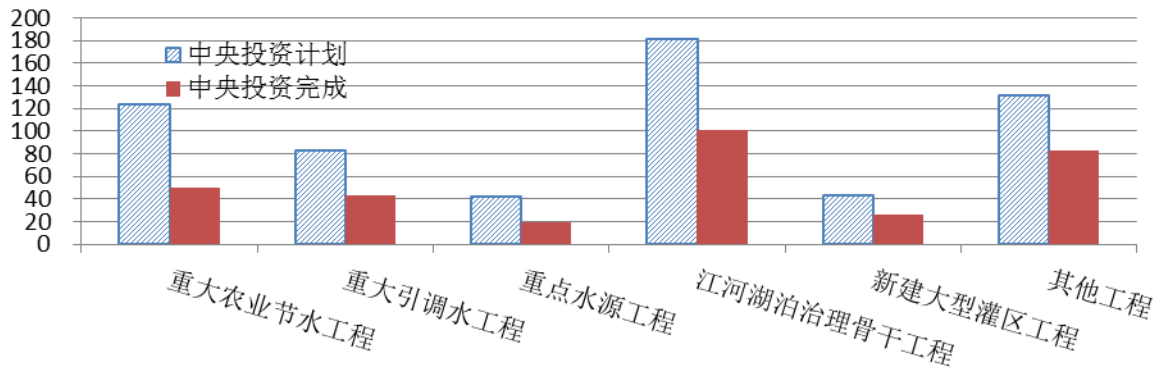

## 二、2014 年中央水利建设投资情况

截至 2015 年 9 月 30 日，纳入月报统计的 2014 年中央水利建设投资 1604.55 亿元，累计下达项目单位投资计划 1604.4 亿元，累计拨付项目单位资金 1598.8 亿元，项目单位累计完成投资 1530.4 亿元，投资下达率、资金到位率、投资完成率分别为 99.99%、99.6%和 95.4%。
