

# 水利规划计划简报

(中央水利建设投资统计月报 2017-2)

2017 年第 7 期

水利部规划计划司

2017 年 3 月 7 日

2016 年共安排中央水利建设投资 1413.4 亿元，其中中央预算内水利建设投资 815.9 亿元，中央财政水利专项资金 597.5 亿元。截至 2017 年 2 月 28 日，中央投资地方已累计分解下达 1413.1 亿元、累计拨付项目单位资金 1413.1 亿元、累计完成投资 1375.5 亿元，中央投资分解下达率、资金到位率、投资完成率分别为 99.98%、99.98%和 97.32%。分项目类型、分地区中央水利建设投资及配套投资的落实及完成情况详见附表 1、附表 2。

## 一、投资计划分解下达情况

2016 年已安排中央水利建设投资计划 2233.2 亿元，其中，中央投资 1413.4 亿元，地方配套投资 819.8 亿元。截至 2017 年 2 月 28 日，各地已分解下达到项目单位年度中央投资计划 2230.7 亿元，投资计划分解下达率 99.89%，其中中央投资下达率为

99.98%。

**1. 中央预算内投资。**2016年已安排中央预算内水利投资计划1457.2亿元（中央投资815.9亿元，地方配套投资641.3亿元），地方已分解下达1455.2亿元，分解下达率99.86%。其中，中央投资已分解下达815.9亿元，分解下达率100%；地方配套投资已分解下达639.3亿元，分解下达率99.69%。

其中，重大水利工程已安排年度中央水利投资计划1030.8亿元（中央投资600.0亿元，地方配套投资430.8亿元），地方已分解下达1029.5亿元，分解下达率99.87%。

**2. 中央财政专项资金。**2016年中央财政水利专项资金预算775.9亿元（中央资金597.5亿元，地方配套资金178.4亿元），已分解下达775.5亿元，分解下达率99.94%。其中，中央资金已分解下达597.2亿元，分解下达率99.95%；地方配套资金已分解下达178.3亿元，分解下达率99.90%。从项目类别看，江河湖库水系综合整治、小型农田水利、水土保持和山洪灾害防治项目中央资金分解下达率分别为99.98%、99.93%、100%和100%。

## **二、资金到位情况**


2016年中央水利建设年度投资计划已拨付项目单位2174.6亿元，资金到位率97.38%。其中，中央投资到位1413.1亿元，到位率99.98%；地方配套投资到位761.5亿元，到位率92.89%（分地区见图1）。



个，工程开工率 99.90%，与上月持平。其中中央预算内水利投资计划项目 2400 个，累计开工 2397 个，开工率 99.88%；中央财政水利专项资金预算项目 9089 个，累计开工 9081 个，开工率 99.91%。

#### 四、投资完成情况

已累计完成 2016 年中央水利建设投资计划 2155.8 亿元，完成率 96.54%。其中，完成中央投资 1375.5 亿元，完成率 97.32%；完成地方配套投资 780.3 亿元，完成率 95.19%。当月完成中央投资计划 16.1 亿元，较上月增加 4.8 亿元。

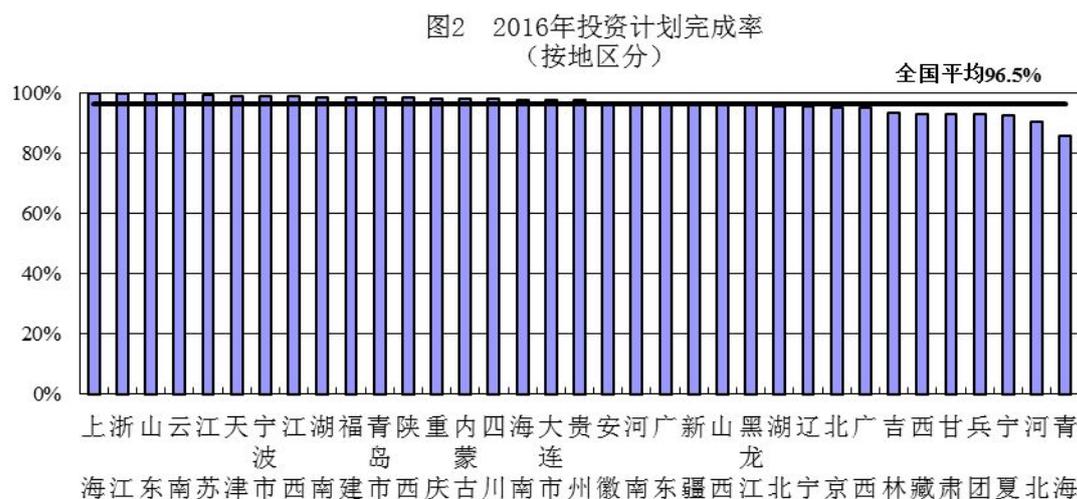

**1. 中央预算内投资。**已累计完成中央预算内水利投资计划 1412.0 亿元，完成率 96.89%。其中，完成中央投资 804.4 亿元，完成率 98.59%；完成地方配套投资 607.6 亿元，完成率 94.74%。

重大水利工程已完成年度中央水利投资计划 1004.4 亿元，投资完成率为 97.43%。其中，完成中央投资 595.0 亿元，完成率 99.16%；完成地方配套投资 409.4 亿元，完成率 95.02%。从

工程类别看，大中型灌区续建配套、重大引调水工程、重点水源工程、江河湖泊治理骨干工程、新建灌区工程及其他工程中央投资完成率分别为 98.57%、100%、96.49%、99.72%、98.89%和 99.44%。

**2. 中央财政专项资金。**已累计完成中央财政水利专项资金预算 743.9 亿元，完成率 95.87%。其中，完成中央资金 571.1 亿元，完成率 95.59%；完成地方配套资金 172.8 亿元，完成率 96.81%。从项目类别看，江河湖库水系综合整治、小型农田水利、水土保持和山洪灾害防治项目的中央资金完成率分别为 93.56%、96.41%、96.94%和 97.44%。

截至 2017 年 2 月 28 日，2017 年已安排中央水利建设投资 440.12 亿元，其中中央预算内水利建设投资 10.12 亿元，主要安排行业能力建设；中央财政水利发展资金 430.0 亿元，主要用于中小河流治理和重点县综合整治、田间高效节水灌溉、水土保持及国家水资源监控能力建设。
