

# 水利规划计划简报

(中央水利建设投资统计月报 2014-1)

2014 年 5 期

水利部规划计划司

2014 年 2 月 25 日

2013 年累计安排中央水利建设投资计划 1408.3 亿元，纳入月报统计中央投资 1340.5 亿元。在纳入统计投资中，中央预算内投资计划 739.4 亿元，主要安排农村饮水安全 225 亿元、大中型病险水库(闸)除险加固 25 亿、灌区建设与节水改造 92 亿元、重大水利工程 397.4 亿元；中央财政水利专项资金预算 601.1 亿元，主要安排中小河流治理 218 亿元、小型病险水库除险加固 110 亿元、小型农田水利建设 241.3 亿元、水土保持 13 亿元，农村水电增效扩容 18.8 亿元。

截至 2014 年 1 月 31 日，中央水利建设投资累计下达项目单位计划 1312.8 亿元，累计拨付项目单位资金 1291.3 亿元，项目单位累计完成投资 888.7 亿元，投资下达率、资金到位率、投资完成率分别为 97.9%、96.3%和 66.3%。分项目类型、分地区中央水利建设投资及配套投资的落实及完成情况详见附表 1、附表 2。

## 一、投资计划下达情况

2013 年中央预算内水利投资计划 739.4 亿元，要求地方配套投资 678.9 亿元。已下达项目单位中央投资 766.3 亿元、地方配套投资 703.2 亿元，投资计划下达率分别为 103.7%和 103.6%。在中央预算内水利投资计划中，农村饮水安全、大中型病险水库（闸）除险加固、灌区建设与节水改造和重大水利工程项目的下达率分别为 100%、100%、100.3%和 106.7%。

2013 年中央财政水利专项资金预算 601.1 亿元，已分解下达项目单位预算 546.5 亿元，预算分解下达率为 90.9%。其中，中小河流治理、小型病险水库除险加固、小型农田水利建设、水土保持和农村水电增效扩容改造项目的预算分解下达率分别为 93.9%、89.3%、88.6%、95.4%和 92.5%。

## 二、资金到位情况

2013 年中央预算内水利投资计划，已拨付项目单位中央投资 757.5 亿元、地方配套投资 561.0 亿元，到位率分别为 102.6%和 82.6%。在地方配套投资中，农村饮水安全、大中型病险水库（闸）除险加固、灌区建设与节水改造和重大水利工程项目分别拨付到位资金 108.3 亿元、10.5 亿元、34.7 亿元、407.5 亿元，到位率分别为 109.0%、75.5%、61.3%和 80.0%。中央预算内投资项目各地配套投资到位情况，见图 1。




个，累计开工 7037 个，开工率 77.5%。

#### 四、投资完成情况

2013 年中央预算内水利投资计划，已累计完成投资 1036.2 亿元。其中，中央投资 547.9 亿元，地方配套投资 488.3 亿元，完成率分别为 74.1%和 71.9%。在完成的中央投资中，农村饮水安全工程、大中型病险水库（闸）除险加固工程、灌区建设与节水改造工程、重大水利工程项目的完成率分别为 98.2%、72.6%、45.5%和 67.2%。各地中央预算内投资完成情况，见图 3。

图3 2013年中央预算内投资中央投资完成率  
(按地区分)

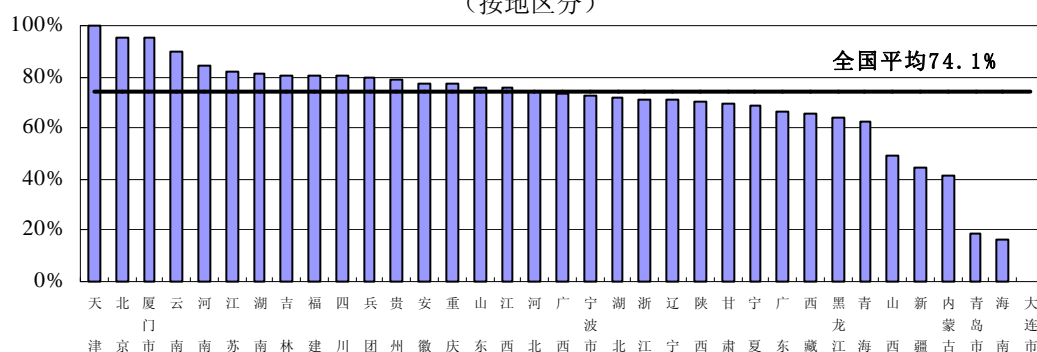

2013 年中央财政水利专项资金预算，已累计完成投资 521.6 亿元。其中，中央资金 340.9 亿元，地方配套资金 180.8 亿元，完成率分别为 56.7%和 56.4%。在完成的中央资金中，中小河流治理、小型病险水库除险加固、小型农田水利建设项目、水土保持和农村水电增效扩容项目的完成率分别为 68.7%、61.7%、45.3%、50.0%和 39.5%。各地中央财政专项资金完成情况，见图 4。



---

**发送：**部领导，总工程师、总规划师，部有关司局、直属单位；国家发展改革委投资司、农经司；财政部经建司、农业司；监察部综合室；国家审计署投资司、农林水审计局；各省（自治区、直辖市）政府主管领导、水利（水务）厅（局），各计划单列市水利（水务）局，新疆生产建设兵团水利局。

---

共印 130 份
