

水利规划计划简报

(中央水利建设投资统计月报 2015-10)

2015 年第 40 期

水利部规划计划司

2015 年 11 月 9 日

今年 1~10 月,各地累计完成中央水利建设投资计划 2667.7 亿元,较去年同期增加 1073.4 亿元,增幅 67.3%。当月完成中央投资计划 461.4 亿元,较上月增加 75.8 亿元。

一、2015 年中央水利建设投资情况

截至 2015 年 10 月 31 日,已累计下达中央水利建设投资 1683.32 亿元,地方累计分解下达 1677.69 亿元、累计拨付项目单位资金 1651.99 亿元、累计完成投资 1223.23 亿元,中央投资分解下达率、资金到位率、投资完成率分别为 99.7%、98.1%和 72.7%,项目开工率为 92.1%。中央投资完成率前 5 位的地区有:大连、浙江、黑龙江、山东和新疆;后 5 位的地区是:**河北、海南、江西、广西和上海**。其中,重大水利工程中央投资完成率前 5 位的地区有北京、天津、福建、浙江和江苏;后 5 位的地区是:**河北、江西、重庆、湖南和广西**。

分项目类型、分地区中央水利建设投资及配套投资的落实及

完成情况详见附表 1、附表 2。

(一) 投资计划分解下达情况

2015 年已安排中央水利建设投资计划 2619.4 亿元，其中，中央投资 1683.3 亿元，地方配套投资 936.1 亿元。截至 10 月 31 日，各地已分解下达到项目单位年度中央投资计划 2655.0 亿元，投资分解下达率 101.4%。中央投资未全部分解下达的地区有：黑龙江、辽宁、安徽、四川、陕西、兵团、内蒙古、西藏和新疆。

1. 中央预算内投资。2015 年已安排中央预算内水利投资计划 1353.6 亿元（中央投资 839.1 亿元，地方配套投资 514.5 亿元），地方已分解下达 1399.9 亿元，分解下达率 103.4%。其中，中央投资已分解下达 839.1 亿元，分解下达率 100%；地方配套投资已分解下达 560.8 亿元，分解下达率 109.0%。

2. 中央财政专项资金。2015 年中央财政水利专项资金预算 1265.8 亿元（中央资金 844.2 亿元，地方配套资金 421.6 亿元），已分解下达 1255.1 亿元，分解下达率 99.2%。其中，中央资金已分解下达 838.6 亿元，分解下达率 99.3%；地方配套资金已分解下达 416.5 亿元，分解下达率 98.8%。从项目类别看，中央财政专项资金未全部分解下达的有小型病险水库除险加固、小型农田水利建设、山洪灾害防治、农发资金用于水土保持和农发资金用于中型灌区，分解下达率分别为 99.8%、99.7%、98.0%、87.4% 和 78.1%。

其中，重大水利工程已安排年度中央水利投资计划 1009.8 亿元（中央投资 609.95 亿元，地方配套投资 399.85 亿元），地方已分解下达 995.8 亿元，分解下达率 98.6%。其中，中央投资已分解下达 609.95 亿元，分解下达率 100.0%；地方配套投资已分解下达 385.84 亿元，分解下达率 96.5%。

（二）资金到位情况

2015 年中央水利建设年度投资计划已拨付项目单位 2423.7 亿元，资金到位率 92.5%。其中，中央投资到位 1652.0 亿元，到位率 98.1%；地方配套投资到位 771.7 亿元，到位率 82.4%。

1. 中央预算内投资。2015 年中央预算内水利建设投资计划已拨付项目单位 1252.3 亿元，资金到位率 92.5%。其中，中央投资到位 818.9 亿元，到位率 97.6%；地方配套投资到位 433.5 亿元，到位率 84.3%。

2. 中央财政专项资金。2015 年中央财政水利专项资金预算已拨付项目单位 1171.4 亿元，资金到位率 92.5%。其中，中央资金到位 833.1 亿元，到位率为 98.7%；地方配套资金到位 338.3 亿元，到位率为 80.2%。

其中，重大水利工程投资已到位 852.1 亿元，资金到位率 84.4%。其中，中央投资到位 588.9 亿元，到位率 96.5%；地方配套投资到位 262.2 亿元，到位率 65.6%。从工程类别看，重大农业节水工程、重大引调水工程、重点水源工程、江河湖泊治理

骨干工程、新建大型灌区工程及其他工程中央投资到位率分别为 99.4%、100.0%、85.3%、95.0%、97.7%和 97.2%。


(三) 项目开工情况

2015 年中央水利投资计划已分解落实水利建设项目 15254 个，较上月增加 116 个，工程开工率 92.1%，较上月增加 7.7%。其中中央预算内水利投资计划 5069 个，累计开工 4786 个，开工率 94.4%；中央财政水利专项资金预算 10185 个，累计开工 9264 个，开工率 91.0%。项目全部开工的地区有北京、天津、上海、云南、西藏、大连、宁波、厦门和青岛，开工率较低的地区有：江西、四川、青海、河南、河北和海南。

(四) 投资完成情况


已累计完成 2015 年中央水利建设投资计划 1827.9 亿元，完成率 69.8%。其中，完成中央投资 1223.2 亿元，完成率 72.7%；完成地方配套投资 604.6 亿元，完成率 64.6%。当月完成中央投资计划 423.1 亿元，较上月增加 73.4 亿元，增幅 21.1%。其中，完成中央投资 283.6 亿元，较上月增加 59.1 亿元，增幅 26.3%；完成地方配套投资 139.4 亿元，较上月增加 14.3 亿元，增幅 11.4%。中央投资完成率较高地区有大连、浙江、黑龙江、山东、新疆和江苏，较低省份有：广西、江西、海南和河北。

图1 2015年中央投资完成率
(按地区分)

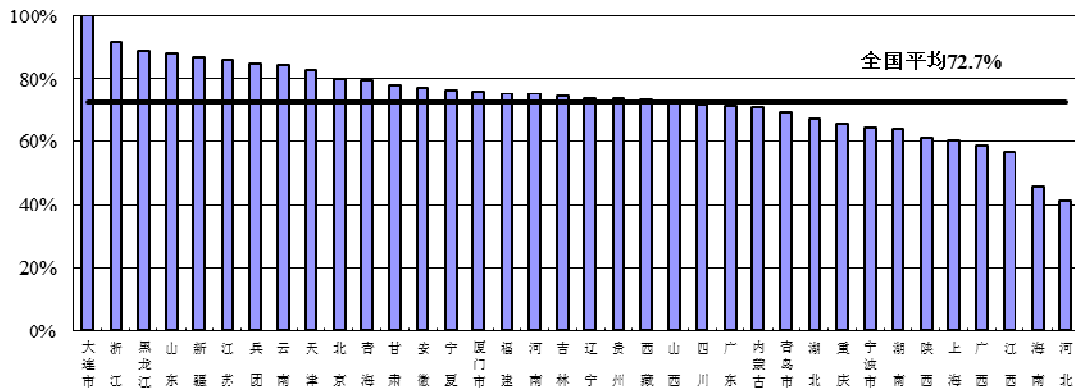


1. 中央预算内投资。已累计完成中央预算内水利投资计划1061.4亿元，完成率78.4%。其中，完成中央投资672.0亿元，完成率80.1%；完成地方配套投资389.5亿元，完成率75.7%。从项目类别看，农村饮水安全、大中型病险水库（闸）除险加固、水土保持、中型水库、主要支流治理项目的中央投资完成率分别为96.4%、72.1%、58.0%、86.1%和68.7%。分地区中央预算内投资完成情况见图2。

图2 2015年中央预算内投资完成率
(按地区分)

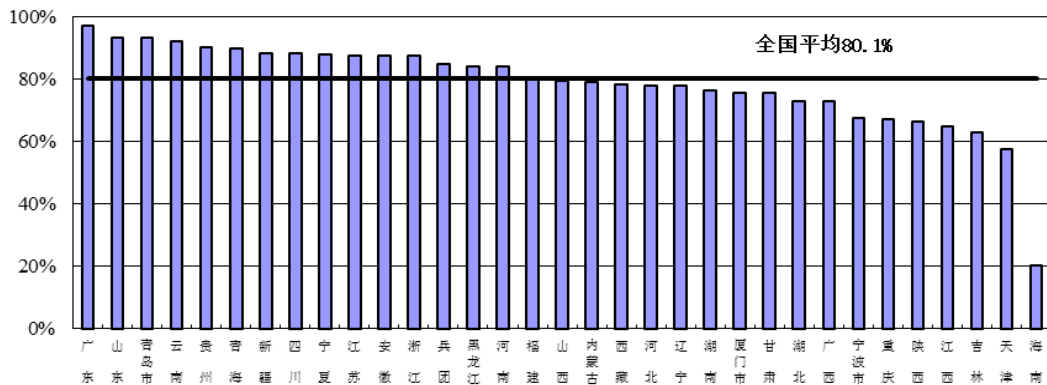

2. 中央财政专项资金。已累计完成中央财政水利专项资金预算 766.5 亿元，完成率 60.6%。其中，完成中央资金 551.3 亿元，完成率 65.3%；完成地方配套资金 215.2 亿元，完成率 51.0%。从项目类别看，江河湖库水系综合整治、山洪灾害防治项目、农田水利建设和水土保持专项的中央资金完成率分别为 70.2%、64.0%、57.2%。分地区中央财政专项资金完成情况见图 3。


图3 2015年中央财政水利专项资金完成率
(按地区分)

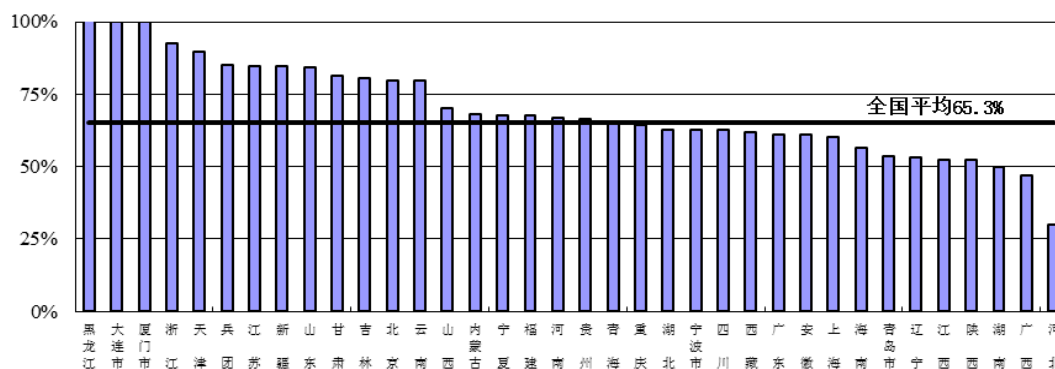

其中，重大水利工程已完成年度中央水利投资计划 661.3 亿元，投资完成率为 65.5%。其中，完成中央投资 451.1 亿元，完成率 74.0%；完成地方配套投资 210.1 亿元，完成率 52.6%。从工程类别看，重大农业节水工程、重大引调水工程、重点水源工程、江河湖泊治理骨干工程、新建大型灌区工程及其他工程中央投资完成率分别为 60.1%、65.0%、68.1%、66.3%、63.4%和 68.3%。

图4 2015年重大水利工程中央投资完成

单位：亿元

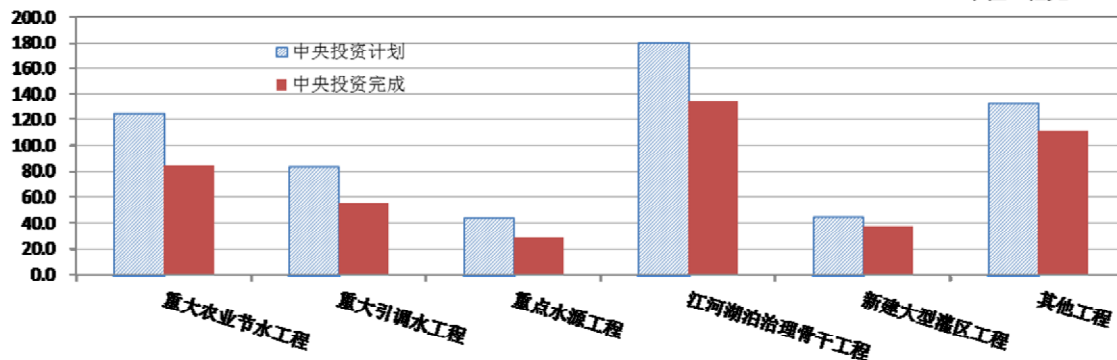

二、2014 年中央水利建设投资情况

截至 2015 年 10 月 31 日，纳入月报统计的 2014 年中央水利建设投资 1604.55 亿元，累计下达项目单位投资计划 1604.4 亿元，累计拨付项目单位资金 1598.9 亿元，项目单位累计完成投资 1537.7 亿元，投资下达率、资金到位率、投资完成率分别为 99.99%、99.6%和 95.8%。
