

# 中央水利建设投资统计 月报 (八月)

水利部规划计划司

2011年9月10日

---

2010年累计安排中央水利投资计划908.3亿元(不含南水北调65亿元),其中中央预算内投资650.3亿元(含中央水利建设基金14.2亿元),主要安排农村饮水安全工程200亿元、大中型病险水库除险加固工程26.4亿元、灌区建设与节水改造工程71.0亿元、重大水利工程352.8亿元;中央财政水利专项资金258亿元,主要安排中小河流治理80亿元、小型病险水库除险加固100亿元、小型农田水利建设78亿元。

2011年累计安排中央水利投资计划865.0亿元(不含南水北调19亿元),其中中央预算内投资466.9亿元(含中央专项建设基金28.0亿元),主要安排农村饮水安全工程200亿元、大中型病险水库除险加固工程14.8亿元、灌区建设与节水改造工程57.0亿元、重大水利工程195.1亿元;中央财政水利专项资金398.1亿元,主要安排中小河流治理100亿元、小型病险水库除险加固168亿元、小型农田水利建设124.9亿元(不含由其他部门实施的1.1亿元)、农村水电增效扩容改造5.2亿元。

## 一、投资计划下达情况

2010年中央预算内水利投资650.3亿元，要求地方配套投资487.1亿元。截至2011年8月31日，已下达到项目单位中央投资计划649.1亿元、地方配套投资计划515.2亿元，投资计划下达率分别为99.8%和100%。其中农村饮水安全工程、大中型病险水库除险加固工程、灌区建设与节水改造工程、重大水利工程分别下达中央投资计划200亿元、26.4亿元、71.0亿元、351.7亿元，投资计划下达率分别为100%、100%、100%和99.7%。


2010年中央财政水利专项资金预算共258亿元，截至2011年8月31日，共分解下达到项目单位247.8亿元，预算分解下达率为96.1%，其中中小河流治理、小型病险水库除险加固和小型农田水利建设分别下达78.9亿元、91.6亿元和77.4亿元，预算分解下达率分别为98.6%、91.6%和99.2%。当前下达地方预算160.6亿元，下达率为98.1%。

2011年中央预算内水利投资466.9亿元，要求地方配套投资398.6亿元。截至2011年8月31日，已下达到项目单位中央投资计划291.5亿元、地方配套投资计划188.5亿元，投资计划下达率分别为62.4%和47.3%。其中农村饮水安全工程、大中型病险水库除险加固、灌区建设与节水改造工程、重大水利工程分别下达中央投资计划158.9亿元、1.5亿元、37.9亿元、93.2亿元，投资计划下达率分别为79.5%、10%、66.5%和47.8%。



2)。地方配套资金中，中小河流治理、小型病险水库除险加固和小型农田水利建设分别拨付到位 33.3 亿元、10.5 亿元和 106.4 亿元，到位率分别为 80.8%、80.2%和 97.3%。

图2 2010年中央财政水利专项投资计划地方配套投资拨付率  
(按地区分)

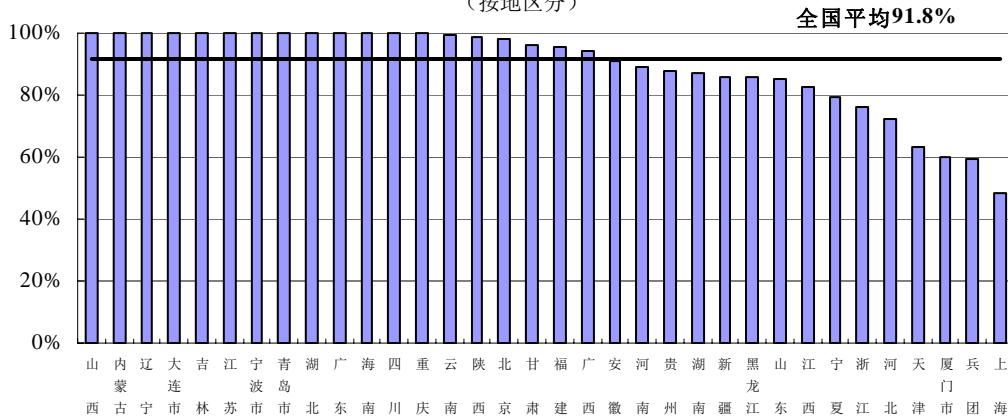

截至 2011 年 8 月 31 日，2011 年中央预算内水利投资计划已拨付项目单位中央投资 219.2 亿元、地方配套投资 61.4 亿元，到位率分别为 46.9%和 15.4%；2011 年中央财政水利专项资金已拨付项目单位 165.3 亿元、地方配套资金 30.6 亿元，到位率分别为 41.5%和 31.0%。

### 三、前期工作和开工情况

2010 年中央水利投资计划已分解落实水利建设项目 9675 个，其中中央预算内水利建设投资计划 5576 个，中央财政水利专项资金 4099 个。

2011 年中央水利投资计划已分解落实水利建设项目 6108 个，其中中央预算内水利建设投资计划 1928 个，中央财政水利专项资金 4180 个。

**1、前期工作情况。**截至 2011 年 8 月 31 日，2010 年中央预算内水利投资计划共有 4713 个项目完成初步设计或实施方案的编制或审查工作；4218 个项目完成技施设计；当前报送需开展招标的标段（标的）24696 个，已完成 20295 个，已完成招标投标投资 499.3 亿元，占需招标投标投资的 79.6%；2810 个项目完成设备采购合同。2010 年中央财政水利专项资金有 3120 个项目完成初步设计或实施方案的编制或审查工作；2683 个项目完成技施设计；当前报送需开展招标的标段（标的）5671 个，已完成 5260 个，已完成招标投标投资 178.6 亿元；1085 个项目完成设备采购合同。

截至 2011 年 8 月 31 日，2011 年中央预算内水利投资计划共有 1037 个项目完成初步设计或实施方案的编制或审查工作；895 个项目完成技施设计；当前报送需开展招标的标段（标的）8931 个，已完成 4979 个，已完成招标投标投资 79.1 亿元；320 个项目完成设备采购合同。2011 年中央财政水利专项资金有 1931 个项目完成初步设计或实施方案的编制或审查工作；1359 个项目完成技施设计；当前报送需开展招标的标段（标的）2368 个，已完成 1499 个，已完成招标投标投资 45.5 亿元；204 个项目完成设备采购合同。

**2、项目开工情况。**截至 2011 年 8 月 31 日，2010 年中央水利投资项目共有 9360 个项目开工建设，开工率为 96.7%。其中中央预算内水利投资计划开工 5353 个，中央财政水利专项资金


开工 4007 个，开工率分别为 96.0%和 97.8%。

截至 2011 年 8 月 31 日，2011 年中央水利投资项目共有 2805 个项目开工建设。其中中央预算内水利投资计划开工 1100 个，中央财政水利专项资金开工 1705 个。

#### 四、投资完成情况


截至 2011 年 8 月 31 日，2010 年中央预算内水利投资计划已累计完成投资 1007.4 亿元，其中中央投资 578.0 亿元、地方配套投资 429.4 亿元，完成率分别为 88.9%（见图 3）和 88.1%。在完成的中央投资中，农村饮水安全工程 199.95 亿元、大中型病险水库除险加固工程 25.1 亿元、灌区建设与节水改造工程 66.0 亿元、重大水利工程 286.9 亿元，完成率分别为 99.97%、95.0%、93.0%和 81.3%。

图3 2010年中央预算内投资完成率  
(按地区分)

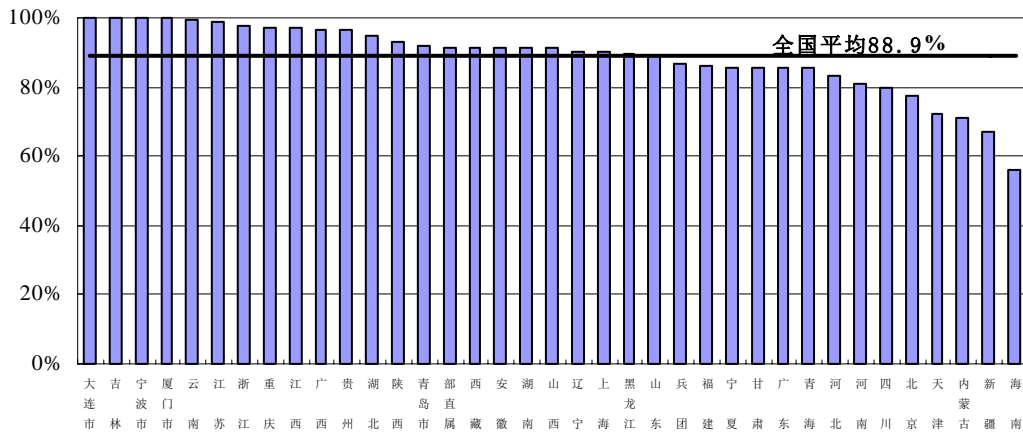

2010 年财政水利专项资金已累计完成 368.5 亿元，其中中央资金 223.8 亿元、地方配套资金 144.7 亿元，完成率分别为 86.7%（见图 4）和 88.4%。在完成的中央资金中，中小河流治

理 69.1 亿元、小型病险水库除险加固 78.6 亿元、小型农田水利建设 76.1 亿元，完成率分别为 86.4%、78.6%和 97.5%。

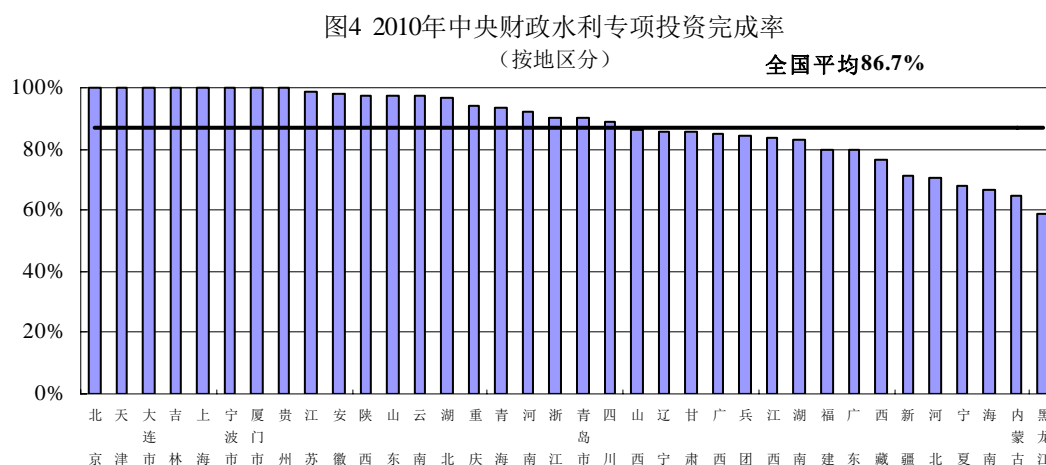

截至 2011 年 8 月 31 日，2011 年中央预算内水利投资计划已累计完成投资 110.8 亿元，其中中央投资 78.5 亿元、地方配套投资 32.2 亿元。在完成的中央投资中，农村饮水安全工程 40.9 亿元、灌区建设与节水改造工程 4.9 亿元、重大水利工程 32.7 亿元。

2011 年中央财政水利专项资金已累计完成 51.5 亿元，其中中央资金 36.5 亿元、地方配套资金 14.9 亿元。在完成的中央资金中，中小河流治理 13.7 亿元、小型病险水库除险加固 12.0 亿元、小型农田水利建设 10.9 亿元。

## 五、工程进展情况

2010 年中央水利投资计划已开工项目累计投入劳动力 30536.7 万工日，累计完成土方 145673.9 万立方米，石方 14740.9 万立方米，砼 2830.8 万立方米，金属结构 47.9 万吨。

累计解决农村饮水安全人口 6186.4 万人，累计新建及加固堤防长度 4538.2 公里，河道清淤疏浚和岸线整治 2567.6 公里，累计新增渠道整治和防渗长度 20545.9 公里，累计治理水土流失面积 5694.3 平方公里。

2011 年中央水利投资计划已开工项目累计投入劳动力 2456.6 万工日，累计完成土方 12864.2 万立方米，石方 1290.8 万立方米，砼 159.6 万立方米。

上期月报中，山东中小河流治理、陕西小型病险水库除险加固工程、宁夏小型农田水利建设、河南河道清淤疏浚和岸线整治数据报送错误，本期更正，导致相关数据变小。

大连、青岛还未上报 2011 年中央水利投资落实情况。



---

发送：部领导，总工程师、总规划师，部有关司局、直属单位；国家发展改革委投资司、农经司；财政部经建司、农业司；监察部综合室；国家审计署投资司、农林水审计局；有关省（自治区、直辖市）政府主管领导、水利（水务）厅（局），有关计划单列市水利（水务）局，新疆生产建设兵团水利局。

---

共印 130 份
