

中央水利建设投资统计 月报 (九月)

水利部规划计划司

2011年10月10日

2010年累计安排中央水利投资计划908.3亿元(不含南水北调65亿元),其中中央预算内投资650.3亿元(含中央水利建设基金14.2亿元),主要安排农村饮水安全工程200亿元、大中型病险水库除险加固工程26.4亿元、灌区建设与节水改造工程71.0亿元、重大水利工程352.8亿元;中央财政水利专项资金258亿元,主要安排中小河流治理80亿元、小型病险水库除险加固100亿元、小型农田水利建设78亿元。

2011年累计安排中央水利投资计划1044.1亿元(不含南水北调19亿元),其中中央预算内投资646.0亿元(含中央专项建设基金28.0亿元),主要安排农村饮水安全工程200亿元、大中型病险水库除险加固工程14.8亿元、灌区建设与节水改造工程60.0亿元、重大水利工程371.2亿元;中央财政水利专项资金398.1亿元,主要安排中小河流治理100亿元、小型病险水库除险加固168亿元、小型农田水利建设124.9亿元(不含由其他部门实施的1.1亿元)、农村水电增效扩容改造5.2亿元。

截至 2011 年 9 月 26 日：

一、投资计划下达情况

2010 年中央预算内水利投资 650.3 亿元，要求地方配套投资 487.1 亿元。已下达到项目单位中央投资计划 649.1 亿元、地方配套投资计划 522.7 亿元，投资计划下达率分别为 99.8% 和 100%。其中农村饮水安全工程、大中型病险水库除险加固工程、灌区建设与节水改造工程、重大水利工程分别下达中央投资计划 200 亿元、26.4 亿元、71.0 亿元、351.7 亿元，投资计划下达率分别为 100%、100%、100%和 99.7%。


2010 年中央财政水利专项资金预算共 258 亿元，已分解下达到项目单位 251.1 亿元，预算分解下达率为 97.3%，其中中小河流治理、小型病险水库除险加固和小型农田水利建设分别下达 78.9 亿元、94.8 亿元和 77.4 亿元，预算分解下达率分别为 98.6%、94.8%和 99.2%。当前下达地方预算 163.5 亿元，下达率为 99.0%。

2011 年中央预算内水利投资 646.0 亿元，要求地方配套投资 607.9 亿元。已下达到项目单位中央投资计划 382.4 亿元、地方配套投资计划 246.2 亿元，投资计划下达率分别为 59.2% 和 40.5%。其中农村饮水安全工程、大中型病险水库除险加固工程、灌区建设与节水改造工程、重大水利工程分别下达中央投资计划 191.7 亿元、8.0 亿元、48.2 亿元、134.5 亿元，投资计划下达率分别为 95.9%、53.8%、80.3%和 36.2%。

2011 年中央财政水利专项资金预算共 398.1 亿元，已分解下达项目单位 260.1 亿元，预算分解下达率为 65.3%，其中中小河流治理、小型病险水库除险加固、小型农田水利建设和农村水电增效扩容改造分别下达 74.9 亿元、125.2 亿元、59.2 亿元和 0.7 亿元，预算分解下达率分别为 74.9%、74.5%、47.4%和 13.1%。当前报送下达地方预算 81.1 亿元，下达率为 65.0%。


二、资金到位情况

2010 年中央预算内水利投资计划已拨付项目单位中央投资 637.6 亿元、地方配套投资 460.6 亿元，到位率分别为 98.1%和 94.5%（见图 1）。其中，农村饮水安全工程、大中型病险水库除险加固工程、灌区建设与节水改造工程、重大水利工程分别拨付到位地方配套投资 116.7 亿元、14.4 亿元、39.2 亿元、290.3 亿元，到位率分别为 100%、90.9%、85.4%和 91.3%。

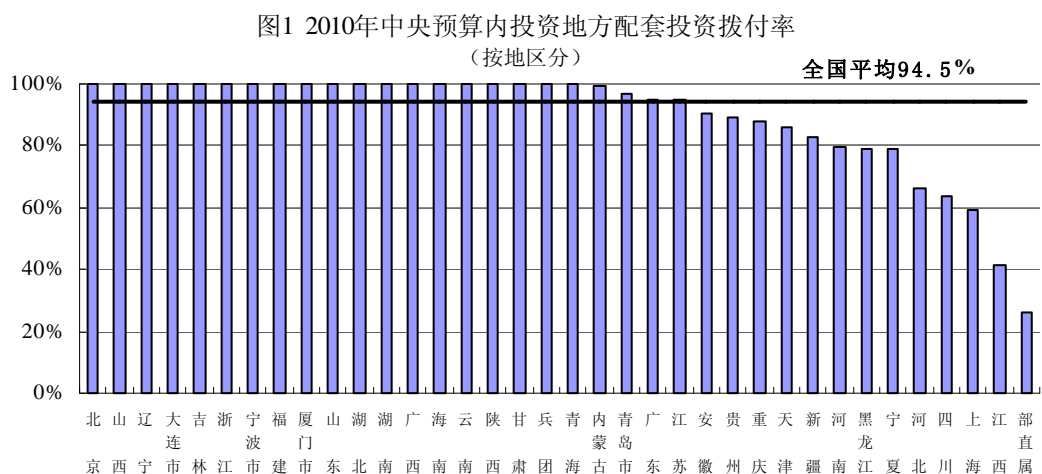

2010 年中央财政水利专项资金已拨付项目单位 249.7 亿元、地方配套资金 154.0 亿元，到位率分别为 96.8%和 93.3%（见

图 2)。地方配套资金中，中小河流治理、小型病险水库除险加固和小型农田水利建设分别拨付到位 33.3 亿元、11.8 亿元和 107.0 亿元，到位率分别为 85.0%、83.2%和 97.8%。

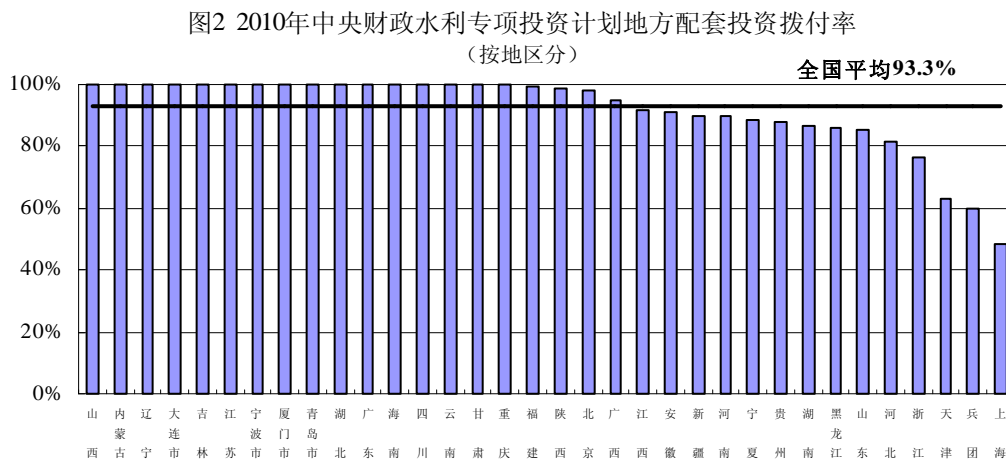

2011 年中央预算内水利投资计划已拨付项目单位中央投资 319.3 亿元、地方配套投资 106.7 亿元，到位率分别为 49.4%和 17.6%；2011 年中央财政水利专项资金已拨付项目单位 186.7 亿元、地方配套资金 38.8 亿元，到位率分别为 46.9%和 31.9%。

三、前期工作和开工情况

2010 年中央水利投资计划已分解落实水利建设项目 9699 个，其中中央预算内水利建设投资计划 5577 个，中央财政水利专项资金 4122 个。

2011 年中央水利投资计划已分解落实水利建设项目 6864 个，其中中央预算内水利建设投资计划 2452 个，中央财政水利专项资金 4412 个。

1、前期工作情况。2010 年中央预算内水利投资计划共有


4714 个项目完成初步设计或实施方案的编制或审查工作；4220 个项目完成技施设计；当前报送需开展招标的标段(标的)24902 个，已完成 20509 个，已完成招标投标投资 501.9 亿元，占需招标投标投资的 79.9%；2826 个项目完成设备采购合同。2010 年中央财政水利专项资金有 3121 个项目完成初步设计或实施方案的编制或审查工作；2684 个项目完成技施设计；当前报送需开展招标的标段(标的)5836 个，已完成 5418 个，已完成招标投标投资 183.2 亿元；1095 个项目完成设备采购合同。

2011 年中央预算内水利投资计划共有 1447 个项目完成初步设计或实施方案的编制或审查工作；1155 个项目完成技施设计；当前报送需开展招标的标段(标的)10972 个，已完成 6696 个，已完成招标投标投资 161.7 亿元；572 个项目完成设备采购合同。2011 年中央财政水利专项资金有 2117 个项目完成初步设计或实施方案的编制或审查工作；1526 个项目完成技施设计；当前报送需开展招标的标段(标的)3587 个，已完成 1777 个，已完成招标投标投资 58.1 亿元；271 个项目完成设备采购合同。

2、项目开工情况。2010 年中央水利投资项目共有 9409 个项目开工建设，开工率为 97.0%。其中中央预算内水利投资计划开工 5394 个，中央财政水利专项资金开工 4015 个，开工率分别为 96.7%和 97.4%。

2011 年中央水利投资项目共有 3766 个项目开工建设。其中中央预算内水利投资计划开工 1767 个，中央财政水利专项资金

图4 2010年中央财政水利专项投资完成率
(按地区分)

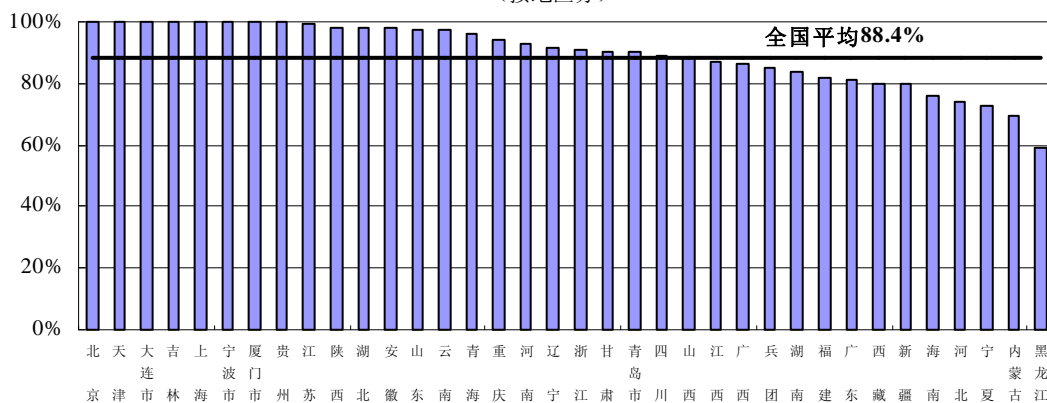

2011年中央预算内水利投资计划已累计完成投资245.4亿元，其中中央投资164.8亿元、地方配套投资80.6亿元。在完成的中央投资中，农村饮水安全工程103.0亿元、灌区建设与节水改造工程6.2亿元、重大水利工程55.5亿元。

2011年中央财政水利专项资金已累计完成67.7亿元，其中中央资金49.4亿元、地方配套资金18.3亿元。在完成的中央资金中，中小河流治理19.1亿元、小型病险水库除险加固16.1亿元、小型农田水利建设14.2亿元。

五、工程进展情况

2010年中央水利投资计划已开工项目累计投入劳动力30797.2万工日，累计完成土方146982.2万立方米，石方14963.6万立方米，砼2861.3万立方米，金属结构47.9万吨。累计解决农村饮水安全人口6186.4万人，累计新建及加固堤防长度4571.1公里，河道清淤疏浚和岸线整治3349.4公里，累计新增渠道整治和防渗长度20555.3公里，累计治理水土流失

面积 5697.5 平方公里。

2011 年中央水利投资计划已开工项目累计投入劳动力 4647.0 万工日，累计完成土方 22577.8 万立方米，石方 2072.0 万立方米，砼 224.3 万立方米。

为保证本期月报及时印发，地方报送数据截至 2011 年 9 月 26 日。

发送：部领导，总工程师、总规划师，部有关司局、直属单位；国家发展改革委投资司、农经司；财政部经建司、农业司；监察部综合室；国家审计署投资司、农林水审计局；有关省（自治区、直辖市）政府主管领导、水利（水务）厅（局），有关计划单列市水利（水务）局，新疆生产建设兵团水利局。

共印 130 份
