

# 中央水利建设投资统计 月报 (十一月)

水利部规划计划司

2011年12月15日

---

2011年累计安排中央水利投资计划1091.5亿元(不含南水北调19亿元),其中中央预算内投资663.1亿元(含中央专项建设基金28.0亿元),主要安排农村饮水安全工程202亿元、大中型病险水库(闸)除险加固工程25.0亿元、灌区建设与节水改造工程62.0亿元、重大水利工程374.1亿元;中央财政水利专项资金428.4亿元,主要安排中小河流治理130亿元、小型病险水库除险加固168亿元、小型农田水利建设125.2亿元(不含由其他部门实施的0.8亿元)、农村水电增效扩容改造5.2亿元。

2010年累计安排中央水利投资计划908.3亿元(不含南水北调65亿元),其中中央预算内投资650.3亿元(含中央水利建设基金14.2亿元),主要安排农村饮水安全工程200亿元、大中型病险水库除险加固工程26.4亿元、灌区建设与节水改造工程71.0亿元、重大水利工程352.8亿元;中央财政水利专项资金258亿元,主要安排中小河流治理80亿元、小型病险水库除险加固100亿元、小型农田水利建设78亿元。

截至 2011 年 11 月 30 日：

## 一、投资计划下达情况

2011 年中央预算内水利投资 663.1 亿元，要求地方配套投资 618.1 亿元。已下达到项目单位中央投资计划 557.1 亿元、地方配套投资计划 456.8 亿元，投资计划下达率分别为 84.0%和 73.9%。其中农村饮水安全工程、大中型病险水库除险加固工程、灌区建设与节水改造工程、重大水利工程分别下达 200.3 亿元、18.4 亿元、56.7 亿元、281.7 亿元，投资计划下达率分别为 99.1%、73.7%、91.4%和 75.3%。

2011 年中央财政水利专项资金预算共 428.4 亿元，已分解下达项目单位 357.3 亿元，预算分解下达率为 83.4%。其中中小河流治理、小型病险水库除险加固、小型农田水利建设和农村水电增效扩容改造分别下达 95.6 亿元、161.2 亿元、98.8 亿元和 1.6 亿元，预算分解下达率分别为 73.6%、96.0%、78.9%和 31.2%。当前报送下达地方预算 196.8 亿元，下达率为 105.1%。


2010 年中央水利投资计划 908.3 亿元，已下达到项目单位 901.5 亿元，投资计划下达率为 99.3%。尚未全部下达的地方有：黑龙江、青岛、湖南、广东、广西、西藏、陕西。

## 二、资金到位情况

2011 年中央预算内水利投资计划已拨付项目单位中央投资 495.2 亿元、地方配套投资 307.6 亿元，到位率分别为 74.7%和 49.8%（见图 1）。其中，农村饮水安全工程、大中型病险水库除


险加固工程、灌区建设与节水改造工程、重大水利工程分别拨付到位地方配套投资 107.4 亿元、3.1 亿元、14.0 亿元、183.3 亿元，到位率分别为 98.8%、22.9%、33.4%和 40.4%。

图1 2011年中央预算内投资地方配套投资拨付率  
(按地区分)

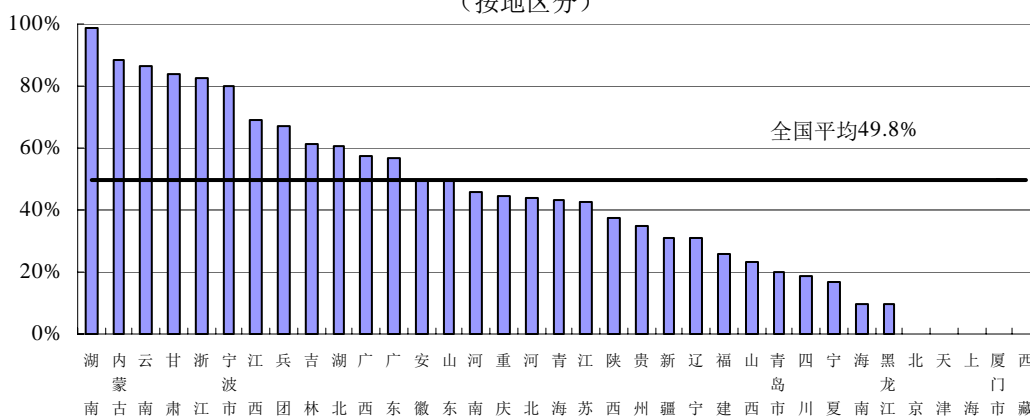

2011 年中央财政水利专项资金已拨付项目单位 319.4 亿元、地方配套资金 118.8 亿元，到位率分别为 74.5%和 63.5% (见图 2)。

图2 2011年中央财政水利专项投资计划地方配套投资拨付率  
(按地区分)

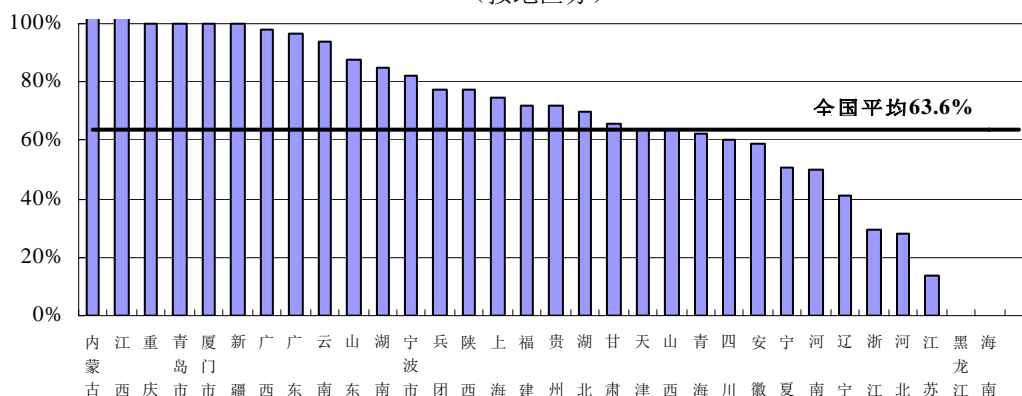

2010 年中央预算内水利投资计划已拨付项目单位中央投资 642.8 亿元、地方配套投资 485.0 亿元，到位率分别为 98.9%和 99.6%。2010 年中央财政水利专项资金已拨付项目单位 252.0 亿

元、地方配套资金 166.3 亿元，到位率分别为 97.7%和 100.4%。

### 三、前期工作和开工情况

2011 年中央水利投资计划已分解落实水利建设项目 9164 个，其中中央预算内水利建设投资计划 3696 个，中央财政水利专项资金 5468 个。共有 5710 个项目完成初步设计或实施方案的编制或审查工作，其中中央预算内水利投资计划项目 2349 个，中央财政水利专项资金项目 3361 个。共有 6592 个项目开工建设，其中中央预算内水利投资计划开工 2751 个，中央财政水利专项资金开工 3841 个，开工率分别为 74.4%和 70.7%。


2010 年中央水利投资计划已分解落实水利建设项目 9700 个，其中中央预算内水利建设投资计划 5578 个，中央财政水利专项资金 4122 个。共有 8352 个项目完成初步设计或实施方案的编制或审查工作，其中中央预算内水利投资计划项目 4893 个，中央财政水利专项资金项目 3459 个。共有 9544 个项目开工建设，开工率为 98.4%。其中中央预算内水利投资计划开工 5451 个，中央财政水利专项资金开工 4093 个，开工率分别为 97.7%和 99.3%。

### 四、投资完成情况

2011 年中央预算内水利投资计划已累计完成投资 550.2 亿元，其中中央投资 330.1 亿元、地方配套投资 220.1 亿元，完成率分别为 49.8%（见图 3）和 35.6%。在完成的中央投资中，农村饮水安全工程 190.5 亿元、大中型病险水库除险加固工程 2.4


亿元、灌区建设与节水改造工程 20.0 亿元、重大水利工程 117.2 亿元，完成率分别为 94.3%、9.4%、32.3%和 31.3%。

图3 2011年中央预算内投资完成率  
(按地区分)

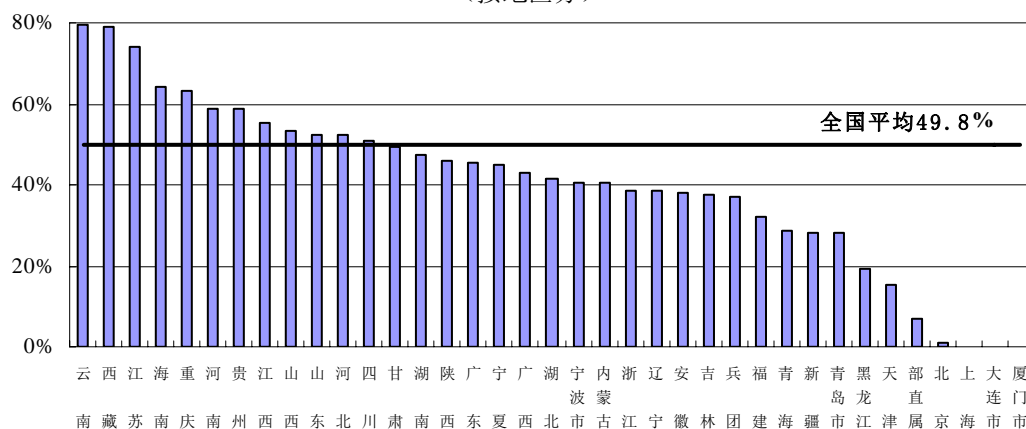

2011 年中央财政水利专项资金已累计完成 233.4 亿元，其中中央资金 164.1 亿元、地方配套资金 69.4 亿元，完成率分别为 38.3% (见图 4) 和 37.0%。在完成的中央资金中，中小河流治理 52.1 亿元、小型病险水库除险加固 68.1 亿元、小型农田水利建设 43.8 亿元，完成率分别为 40.1%、40.5%和 35.0%。

图4 2011年中央财政水利专项投资完成率  
(按地区分)

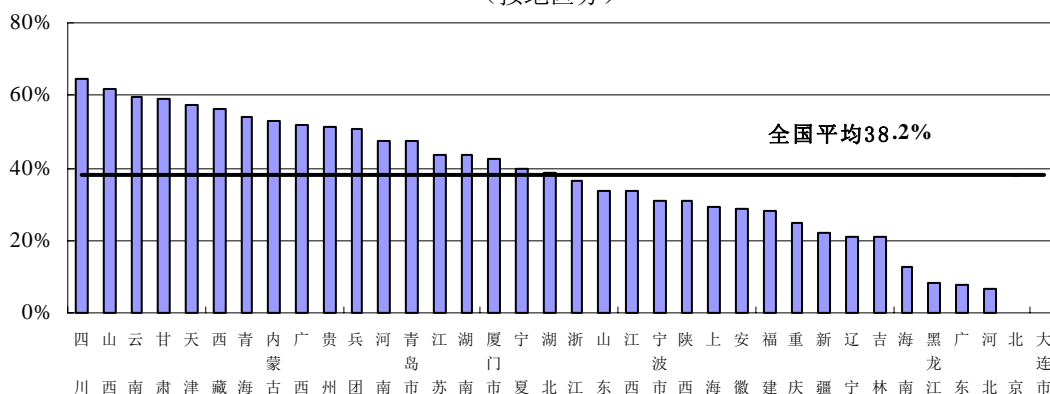

2010 年中央预算内水利投资计划已累计完成投资 1074.2 亿元，其中中央投资 606.0 亿元、地方配套投资 468.2 亿元，完成

率分别为 93.2%和 96.1%。2010 年财政水利专项资金已累计完成 403.6 亿元，其中中央资金 239.7 亿元、地方配套资金 163.9 亿元，完成率分别为 92.9%和 99.0%。

## 五、工程进展情况

2011 年中央水利投资计划已开工项目累计投入劳动力 12684.4 万工日，累计完成土方 53444.8 万立方米，石方 5676.0 万立方米，砼 657.7 万立方米。

2010 年中央水利投资计划已开工项目累计投入劳动力 56724.8 万工日，累计完成土方 156692.0 万立方米，石方 19565.6 万立方米，砼 2958.0 万立方米，金属结构 50.1 万吨。累计新建及加固堤防长度 4862.4 公里，河道清淤疏浚和岸线整治 3416.3 公里，累计新增渠道整治和防渗长度 20587.5 公里，累计治理水土流失面积 5925.9 平方公里。

---

发送：部领导，总工程师、总规划师，部有关司局、直属单位；国家发展改革委投资司、农经司；财政部经建司、农业司；监察部综合室；国家审计署投资司、农林水审计局；有关省（自治区、直辖市）政府主管领导、水利（水务）厅（局），有关计划单列市水利（水务）局，新疆生产建设兵团水利局。

---

共印 130 份
