

# 中央水利建设投资统计 月报 (十二月)

水利部规划计划司

2012年1月16日

---

2011年累计安排中央水利投资计划1093.0亿元(不含南水北调19亿元),其中中央预算内投资663.1亿元(含中央专项建设基金28.0亿元),主要安排农村饮水安全工程202亿元、大中型病险水库(闸)除险加固工程25.0亿元、灌区建设与节水改造工程62.0亿元、重大水利工程374.1亿元;中央财政水利专项资金429.9亿元,主要安排中小河流治理130亿元、小型病险水库除险加固168亿元、小型农田水利建设125.2亿元(不含由其他部门实施的0.8亿元)、农村水电增效扩容改造6.7亿元。

2010年累计安排中央水利投资计划908.3亿元(不含南水北调65亿元),其中中央预算内投资650.3亿元(含中央水利建设基金14.2亿元),主要安排农村饮水安全工程200亿元、大中型病险水库除险加固工程26.4亿元、灌区建设与节水改造工程71.0亿元、重大水利工程352.8亿元;中央财政水利专项资金258亿元,主要安排中小河流治理80亿元、小型病险水库除险加固100亿元、小型农田水利建设78亿元。

截至 2011 年 12 月 31 日：

## 一、投资计划下达情况

2011 年中央预算内水利投资 663.1 亿元，要求地方配套投资 618.1 亿元。已下达到项目单位中央投资计划 608.2 亿元、地方配套投资计划 533.8 亿元，投资计划下达率分别为 91.7%和 86.4%。其中农村饮水安全工程、大中型病险水库除险加固工程、灌区建设与节水改造工程、重大水利工程分别下达 202 亿元、20.3 亿元、58.0 亿元、328.0 亿元，投资计划下达率分别为 100%、81.0%、93.5%和 87.7%。

2011 年中央财政水利专项资金预算共 429.9 亿元，已分解下达项目单位 377.3 亿元，预算分解下达率为 87.8%。其中中小河流治理、小型病险水库除险加固、小型农田水利建设和农村水电增效扩容改造分别下达 101.3 亿元、161.2 亿元、113.6 亿元和 1.2 亿元，预算分解下达率分别为 77.9%、96.0%、90.7%和 18.0%。当前报送下达地方预算 208.9 亿元，下达率为 107.8%。


2010 年中央水利投资计划 908.3 亿元，已下达到项目单位 903.3 亿元，投资计划下达率为 99.5%。尚未全部下达的地方有：湖南、广东、广西、西藏。

## 二、资金到位情况

2011 年中央预算内水利投资计划已拨付项目单位中央投资 559.7 亿元、地方配套投资 375.1 亿元，到位率分别为 84.4%和 60.7%（见图 1）。其中，农村饮水安全工程、大中型病险水库除


险加固工程、灌区建设与节水改造工程、重大水利工程分别拨付到位地方配套投资 109.8 亿元、5.2 亿元、18.7 亿元、241.5 亿元，到位率分别为 101.0%、38.6%、44.6%和 53.2%。

图1 2011年中央预算内投资地方配套投资拨付率  
(按地区分)

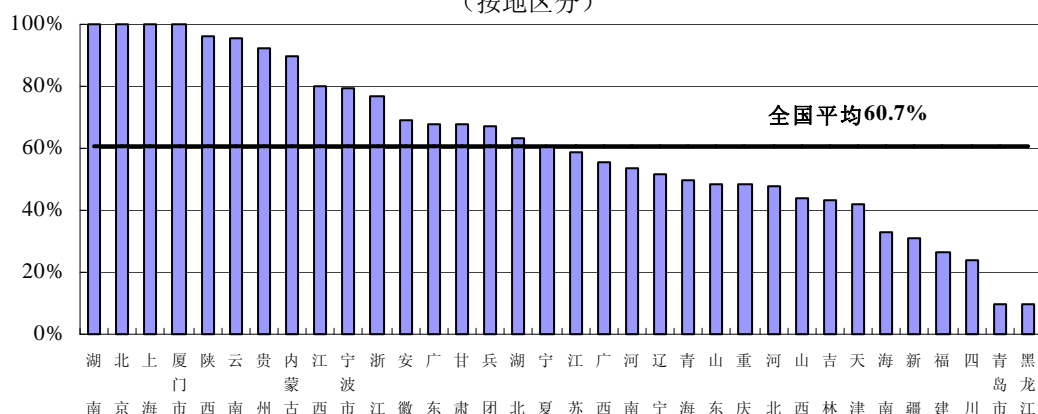

2011 年中央财政水利专项资金已拨付项目单位 354.3 亿元、地方配套资金 148.1 亿元，到位率分别为 82.4%和 76.4% (见图 2)。

图2 2011年中央财政水利专项投资计划地方配套投资拨付率  
(按地区分)

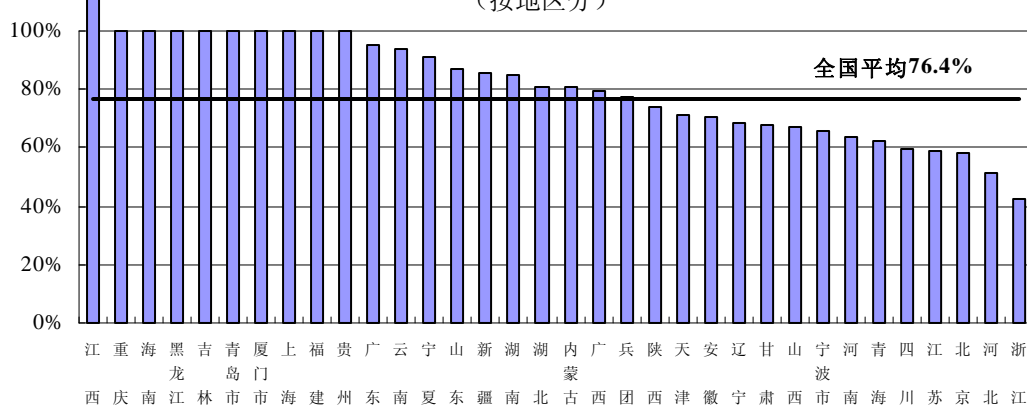

2010 年中央预算内水利投资计划已拨付项目单位中央投资 646.9 亿元、地方配套投资 492.4 亿元，到位率分别为 99.5%和 101.1%。2010 年中央财政水利专项资金已拨付项目单位 254.6

亿元、地方配套资金 170.3 亿元，到位率分别为 98.7%和 102.8%。

### 三、前期工作和开工情况

2011 年中央水利投资计划已分解落实水利建设项目 9591 个，其中中央预算内水利建设投资计划 3994 个，中央财政水利专项资金 5597 个。共有 6267 个项目完成初步设计或实施方案的编制或审查工作，其中中央预算内水利投资计划项目 2650 个，中央财政水利专项资金项目 3617 个。共有 7347 个项目开工建设，其中中央预算内水利投资计划开工 3134 个，中央财政水利专项资金开工 4213 个，开工率分别为 78.5%和 75.9%。


2010 年中央水利投资计划已分解落实水利建设项目 9700 个，其中中央预算内水利建设投资计划 5578 个，中央财政水利专项资金 4122 个。共有 8481 个项目完成初步设计或实施方案的编制或审查工作，其中中央预算内水利投资计划项目 5022 个，中央财政水利专项资金项目 3459 个。共有 9653 个项目开工建设，开工率为 99.5%。其中中央预算内水利投资计划开工 5535 个，中央财政水利专项资金开工 4118 个，开工率分别为 99.2%和 99.9%。

### 四、投资完成情况

2011 年中央预算内水利投资计划已累计完成投资 659.6 亿元，其中中央投资 390.1 亿元、地方配套投资 269.4 亿元，完成率分别为 58.8%（见图 3）和 43.6%。在完成的中央投资中，农村饮水安全工程 198.4 亿元、大中型病险水库除险加固工程 3.8


亿元、灌区建设与节水改造工程 26.3 亿元、重大水利工程 161.7 亿元，完成率分别为 98.2%、15.2%、42.4%和 43.2%。

图3 2011年中央预算内投资完成率  
(按地区分)

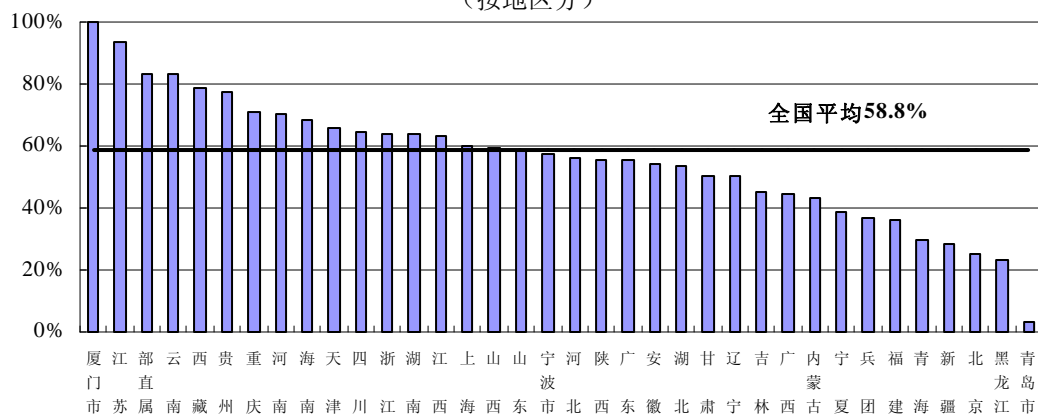

2011 年中央财政水利专项资金已累计完成 312.5 亿元，其中中央资金 218.6 亿元、地方配套资金 93.9 亿元，完成率分别为 50.8%（见图 4）和 48.8%。在完成的中央资金中，中小河流治理 69.8 亿元、小型病险水库除险加固 88.1 亿元、小型农田水利建设 60.5 亿元，完成率分别为 53.7%、52.5%和 48.3%。

图4 2011年中央财政水利专项投资完成率  
(按地区分)

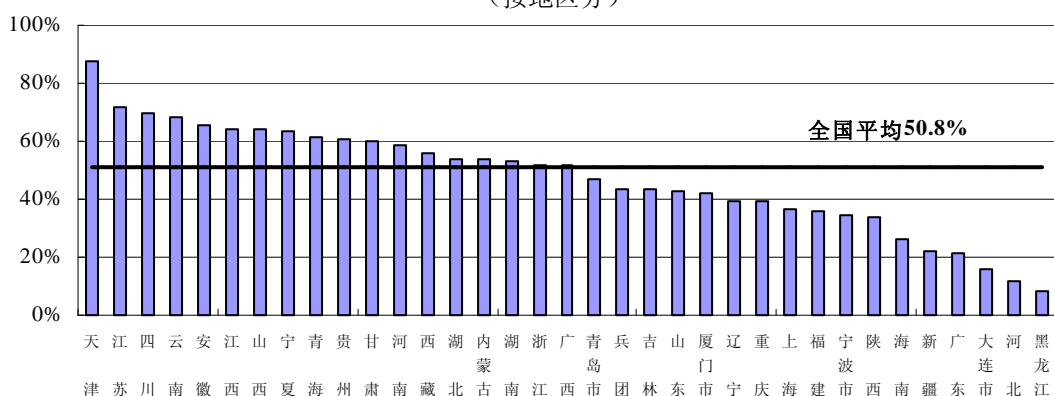

2010 年中央预算内水利投资计划已累计完成投资 1082.2 亿元，其中中央投资 608.6 亿元、地方配套投资 473.6 亿元，完成

率分别为 93.6%和 97.2%。2010 年财政水利专项资金已累计完成 417.8 亿元，其中中央资金 245.6 亿元、地方配套资金 172.3 亿元，完成率分别为 95.2%和 104.1%。

## 五、工程进展情况

2011 年中央水利投资计划已开工项目累计完成土方 73744.7 万立方米，石方 14853.5 万立方米，砼 1001.5 万立方米。

2010 年中央水利投资计划已开工项目累计完成土方 159690.8 万立方米，石方 20565.6 万立方米，砼 3014.1 万立方米，金属结构 53.3 万吨。累计新建及加固堤防长度 4909.2 公里，河道清淤疏浚和岸线整治 3581.3 公里，累计新增渠道整治和防渗长度 20587.5 公里，累计治理水土流失面积 6110.0 平方公里。

注：截至目前，2010 年水利建设投资计划下达、资金到位、投资完成等指标均已接近 100%。经研究，决定 2012 年各地要继续上报 2010 年有关数据，但月报中不再公布。

---

发送：部领导，总工程师、总规划师，部有关司局、直属单位；国家发展改革委投资司、农经司；财政部经建司、农业司；监察部综合室；国家审计署投资司、农林水审计局；有关省（自治区、直辖市）政府主管领导、水利（水务）厅（局），有关计划单列市水利（水务）局，新疆生产建设兵团水利局。

---

共印 130 份
