

# 中央水利建设投资统计 月报 (三月)

水利部规划计划司

2012年4月12日

2011年累计安排中央水利投资计划1140.8亿元，纳入月报统计的中央投资1093.0亿元（不含南水北调19亿元、山洪灾害防治县级非工程措施建设补助专项资金28亿元、由其他部门实施的小型农田水利建设专项资金0.8亿元），其中中央预算内投资663.1亿元，主要安排农村饮水安全工程202亿元、大中型病险水库（闸）除险加固工程25.0亿元、灌区建设与节水改造工程62.0亿元、重大水利工程374.1亿元；中央财政水利专项资金429.9亿元，主要安排中小河流治理130亿元、小型病险水库除险加固168亿元、小型农田水利建设125.2亿元、农村水电增效扩容改造6.7亿元。

截至2012年3月31日统计：

## 一、投资计划下达情况

2011年中央预算内水利投资663.1亿元，要求地方配套投资618.1亿元。已下达到项目单位中央投资计划642.8亿元、地方配套投资计划579.0亿元，投资计划下达率分别为96.9%和

93.7%。其中农村饮水安全工程、大中型病险水库除险加固工程、灌区建设与节水改造工程、重大水利工程中央投资分别下达 202.0 亿元、24.9 亿元、62.0 亿元、353.9 亿元，投资计划下达率分别为 100%、99.7%、100%和 94.6%。

2011 年中央财政水利专项资金预算共 429.9 亿元，已分解下达项目单位 401.8 亿元，预算分解下达率为 93.5%。其中中小河流治理、小型病险水库除险加固、小型农田水利建设和农村水电增效扩容改造中央投资分别下达 110.9 亿元、164.9 亿元、122.6 亿元和 3.6 亿元，预算分解下达率分别为 85.3%、98.1%、97.9%和 54.1%。

## 二、资金到位情况

2011 年中央预算内水利投资计划已拨付项目单位中央投资 618.7 亿元、地方配套投资 468.3 亿元，到位率分别为 93.3%和 75.8%（见图 1）。其中，农村饮水安全工程、大中型病险水库除险加固工程、灌区建设与节水改造工程、重大水利工程分别拨付到位地方配套投资 118.8 亿元、7.4 亿元、30.8 亿元、311.3 亿元，到位率分别为 109.3%、55.1%、73.5%和 68.6%。




中央财政水利专项资金项目 4485 个。共有 8935 个项目开工建设，其中中央预算内水利投资计划开工 3599 个，中央财政水利专项资金开工 5336 个，开工率分别为 85.0% 和 91.5%。

#### 四、投资完成情况


2011 年中央预算内水利投资计划已累计完成投资 828.5 亿元，其中中央投资 479.7 亿元、地方配套投资 348.8 亿元，完成率分别为 72.3%（见图 3）和 56.4%。在完成的中央投资中，农村饮水安全工程 199.9 亿元、大中型病险水库除险加固工程 9.4 亿元、灌区建设与节水改造工程 44.4 亿元、重大水利工程 226.0 亿元，完成率分别为 99.0%、37.4%、71.7% 和 60.4%。

图3 2011年中央预算内投资中央投资完成率  
(按地区分)

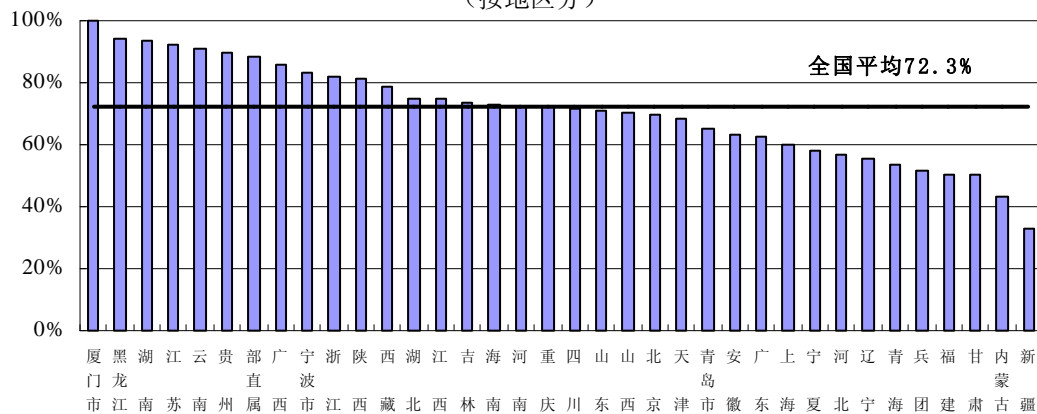

2011 年中央财政水利专项资金已累计完成 450.8 亿元，其中中央资金 300.3 亿元、地方配套资金 150.5 亿元，完成率分别为 69.9% 和 70.3%。在完成的中央资金中，中小河流治理 83.6 亿元、小型病险水库除险加固 126.5 亿元、小型农田水利建设 88.5 亿元，完成率分别为 64.3%、75.3% 和 70.6%。

图4 2011年中央财政水利专项投资完成率  
(按地区分)

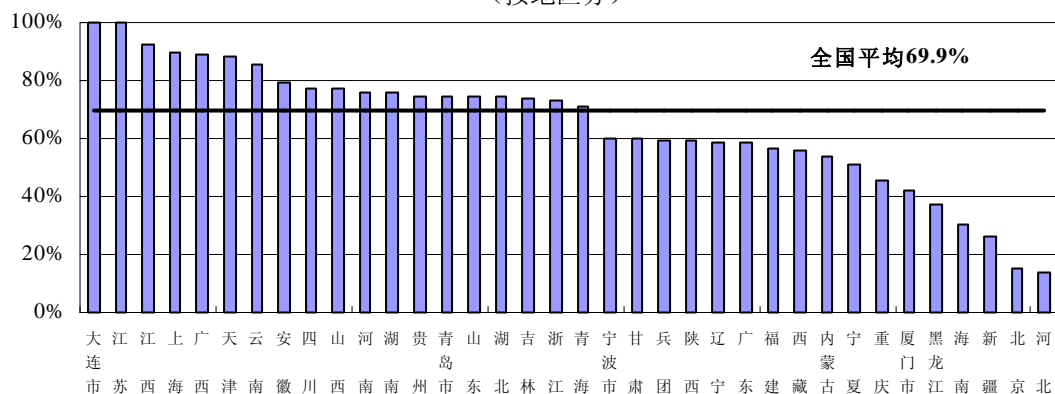

## 五、工程进展情况

2011 年中央水利投资计划已开工项目累计完成土方 125610.4 万立方米，石方 24857.4 万立方米，砼 1705.2 万立方米，金属结构 41.0 万吨。累计新建及加固堤防长度 2661.7 公里，河道清淤疏浚和岸线整治 3425.7 公里，累计新增渠道整治和防渗长度 22167.6 公里，累计治理水土流失面积 536.9 平方公里。

---

发送：部领导，总工程师、总规划师，部有关司局、直属单位；国家发展改革委投资司、农经司；财政部经建司、农业司；监察部综合室；国家审计署投资司、农林水审计局；有关省（自治区、直辖市）政府主管领导、水利（水务）厅（局），有关计划单列市水利（水务）局，新疆生产建设兵团水利局。

---

共印 130 份
