

中央水利建设投资统计 月报 (七月)

水利部规划计划司

2012年8月8日

2011年累计安排中央水利投资计划1140.8亿元,纳入月报统计的中央投资1093.0亿元(不含南水北调19亿元、山洪灾害防治县级非工程措施建设补助专项资金28亿元、由其他部门实施的小型农田水利建设专项资金0.8亿元),其中中央预算内投资663.1亿元,主要安排农村饮水安全工程202亿元、大中型病险水库(闸)除险加固工程25.0亿元、灌区建设与节水改造工程62.0亿元、重大水利工程374.1亿元;中央财政水利专项资金429.9亿元,主要安排中小河流治理130亿元、小型病险水库除险加固168亿元、小型农田水利建设125.2亿元、农村水电增效扩容改造6.7亿元。

截至2012年7月31日,2012年累计安排中央水利投资计划1205.3亿元(不包含山洪灾害41.4亿元),其中中央预算内投资713.6亿元,中央财政水利专项资金491.7亿元。累计下达到项目单位中央水利投资计划361.0亿元。已下达到项目单位中央预算内投资计划184.5亿元,其中农村饮水安全工程、大中型病险水库除险加固工程、灌区建设与节水改造工程、重大水利

工程中央投资分别下达 108.1 亿元、2.9 亿元、5.8 亿元、67.7 亿元；已下达到项目单位中央财政水利专项资金 176.5 亿元，其中中小河流治理、小型病险水库除险加固和小型农田水利建设中央投资分别下达 86.1 亿元、57.8 亿元和 32.6 亿元。

截至 2012 年 7 月 31 日统计：

一、投资计划下达情况

2011 年中央预算内水利投资 663.1 亿元，要求地方配套投资 618.1 亿元。已下达到项目单位中央投资计划 657.0 亿元、地方配套投资计划 598.0 亿元，投资计划下达率分别为 99.1% 和 96.8%。其中农村饮水安全工程、大中型病险水库除险加固工程、灌区建设与节水改造工程、重大水利工程中央投资分别下达 202.0 亿元、24.97 亿元、62.0 亿元、368.0 亿元，投资计划下达率分别为 100%、99.9%、100% 和 98.4%。


2011 年中央财政水利专项资金预算共 429.9 亿元，已分解下达项目单位 407.3 亿元，预算分解下达率为 94.7%。其中中小河流治理、小型病险水库除险加固、小型农田水利建设和农村水电增效扩容改造中央投资分别下达 113.1 亿元、163.6 亿元、124.4 亿元和 6.3 亿元，预算分解下达率分别为 87.0%、97.4%、99.4% 和 93.8%。

二、资金到位情况

2011 年中央预算内水利投资计划已拨付项目单位中央投资 649.2 亿元、地方配套投资 524.6 亿元，到位率分别为 97.9% 和


84.9%（见图 1）。其中，农村饮水安全工程、大中型病险水库除险加固工程、灌区建设与节水改造工程、重大水利工程分别拨付到位地方配套投资 118.9 亿元、8.7 亿元、32.0 亿元、365.0 亿元，到位率分别为 109.4%、65.1%、76.4%和 80.4%。

图1 2011年中央预算内投资地方配套投资拨付率
(按地区分)

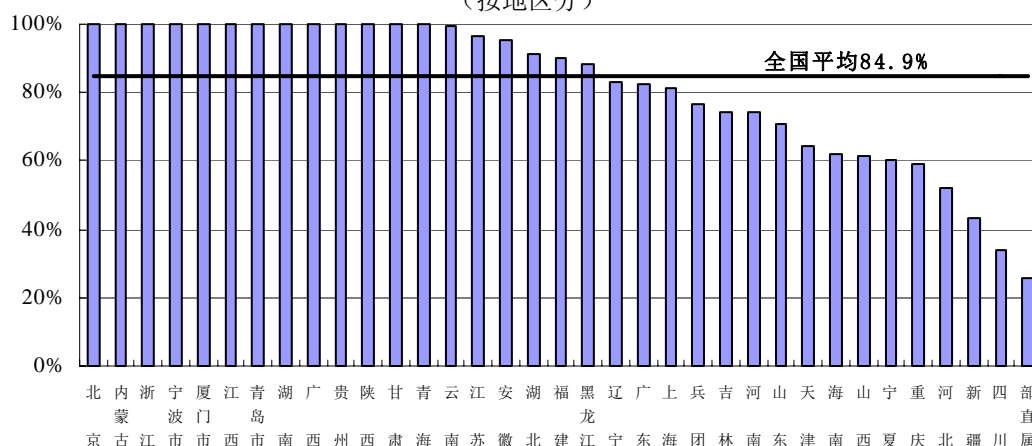

2011 年中央财政水利专项资金已拨付项目单位中央资金 402.2 亿元、地方配套资金 242.0 亿元，到位率分别为 93.6%和 100%（见图 2）。

图2 2011年中央财政水利专项投资计划地方配套投资拨付率
(按地区分)

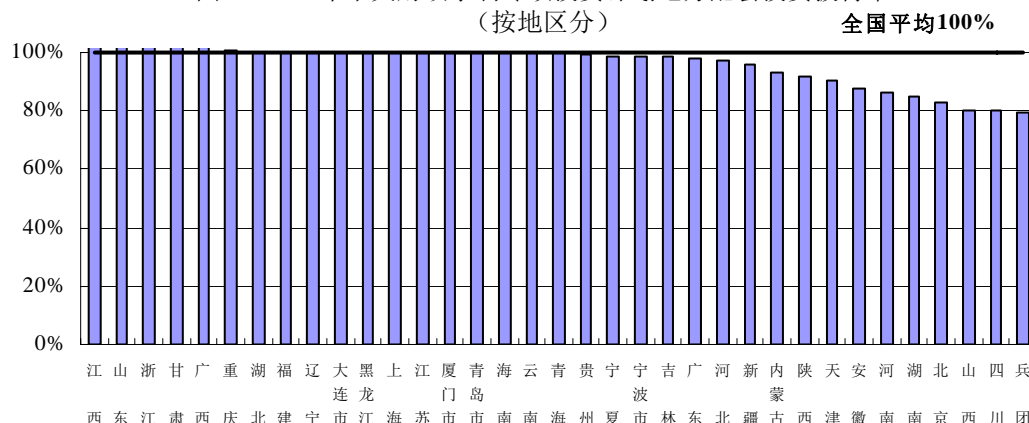

三、前期工作和开工情况

发送：部领导，总工程师、总规划师，部有关司局、直属单位；国家发展改革委投资司、农经司；财政部经建司、农业司；监察部综合室；国家审计署投资司、农林水审计局；有关省（自治区、直辖市）政府主管领导、水利（水务）厅（局），有关计划单列市水利（水务）局，新疆生产建设兵团水利局。

共印 130 份
