

中央水利建设投资统计 月报 (八月)

水利部规划计划司

2012年9月10日

2011年累计安排中央水利投资计划1140.8亿元，纳入月报统计的中央投资1093.0亿元（不含南水北调19亿元、山洪灾害防治县级非工程措施建设补助专项资金28亿元、由其他部门实施的小型农田水利建设专项资金0.8亿元），其中中央预算内投资663.1亿元，主要安排农村饮水安全工程202亿元、大中型病险水库（闸）除险加固工程25.0亿元、灌区建设与节水改造工程62.0亿元、重大水利工程374.1亿元；中央财政水利专项资金429.9亿元，主要安排中小河流治理130亿元、小型病险水库除险加固168亿元、小型农田水利建设125.2亿元、农村水电增效扩容改造6.7亿元。

2012年累计安排中央水利投资计划1187.1亿元（不包含山洪灾害38.0亿元），其中中央预算内投资696.2亿元，主要安排农村饮水安全工程220亿元、大中型病险水库（闸）除险加固25亿、灌区建设与节水改造工程70亿元、重大水利工程381.2亿元；中央财政水利专项资金490.9亿元，主要安排中小河流治理150亿元、小型病险水库除险加固178亿元、小型农田水利

建设 158.1 亿元、农村水电增效扩容改造 4.8 亿元。

截至 2012 年 8 月 31 日统计：

一、投资计划下达情况

2011 年中央预算内水利投资 663.1 亿元，要求地方配套投资 618.1 亿元。已下达到项目单位中央投资计划 659.5 亿元、地方配套投资计划 655.7 亿元，投资计划下达率分别为 99.5% 和 106.1%。其中农村饮水安全工程、大中型病险水库除险加固工程、灌区建设与节水改造工程、重大水利工程中央投资分别下达 202.0 亿元、24.99 亿元、62.0 亿元、370.5 亿元，投资计划下达率分别为 100%、99.9%、100% 和 99.1%。

2011 年中央财政水利专项资金预算共 429.9 亿元，已分解下达项目单位 408.6 亿元，预算分解下达率为 95.1%。其中中小河流治理、小型病险水库除险加固、小型农田水利建设和农村水电增效扩容改造中央投资分别下达 114.4 亿元、163.6 亿元、124.4 亿元和 6.3 亿元，预算分解下达率分别为 88.0%、97.4%、99.4% 和 93.8%。

2012 年中央预算内水利投资 696.2 亿元，要求地方配套投资 587.7 亿元。已下达到项目单位中央投资计划 400.3 亿元、地方配套投资计划 317.8 亿元，投资计划下达率分别为 57.5% 和 54.1%。其中农村饮水安全工程、大中型病险水库除险加固工程、灌区建设与节水改造工程、重大水利工程中央投资分别下达 194.9 亿元、8.7 亿元、30.1 亿元、166.7 亿元，投资计划下达率


分别为 88.6%、34.7%、43.0% 和 43.7%。

2012 年中央财政水利专项资金预算共 490.9 亿元，已分解下达项目单位 303.1 亿元，预算分解下达率为 61.7%。其中中小河流治理、小型病险水库除险加固、小型农田水利建设和农村水电增效扩容改造中央投资分别下达 128.5 亿元、114.8 亿元、57.1 亿元和 2.7 亿元，预算分解下达率分别为 85.6%、64.5%、36.1% 和 54.8%。

二、资金到位情况

2011 年中央预算内水利投资计划已拨付项目单位中央投资 653.3 亿元、地方配套投资 567.9 亿元，到位率分别为 98.5% 和 91.9%（见图 1）。其中，农村饮水安全工程、大中型病险水库除险加固工程、灌区建设与节水改造工程、重大水利工程分别拨付到位地方配套投资 118.9 亿元、11.2 亿元、35.3 亿元、402.6 亿元，到位率分别为 109.4%、83.5%、84.2% 和 88.7%。

图1 2011年中央预算内投资地方配套投资拨付率
(按地区分)

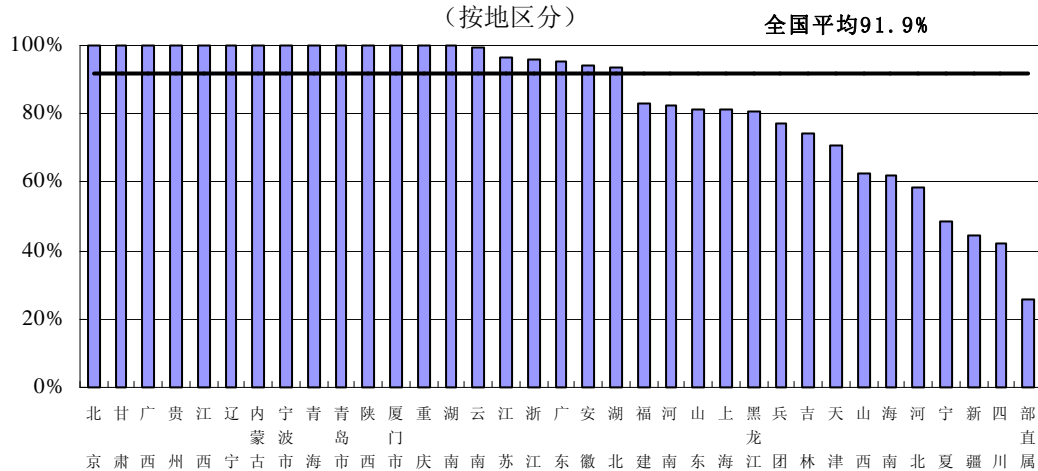


专项资金开工 5950 个，开工率分别为 94.5%和 93.3%。

2012 年中央水利投资计划已分解落实水利建设项目 8830 个，其中中央预算内水利建设投资计划 3027 个，中央财政水利专项资金 5803 个。共有 6837 个项目完成初步设计或实施方案的编制或审查工作。共有 4969 个项目开工建设，开工率为 56.3%。

四、投资完成情况

2011 年中央预算内水利投资计划已累计完成投资 1133.4 亿元，其中中央投资 587.3 亿元、地方配套投资 546.1 亿元，完成率分别为 88.6%（见图 3）和 88.3%。在完成的中央投资中，农村饮水安全工程 201.7 亿元、大中型病险水库除险加固工程 16.2 亿元、灌区建设与节水改造工程 54.7 亿元、重大水利工程 314.8 亿元，完成率分别为 99.8%、64.7%、88.2%和 84.2%。


图3 2011年中央预算内投资中央投资完成率
(按地区分)

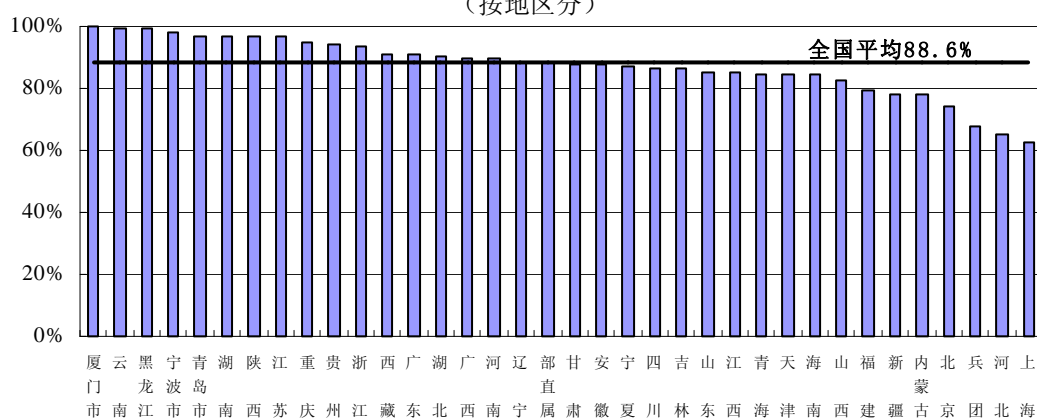

2011 年中央财政水利专项资金已累计完成 624.3 亿元，其中中央资金 382.0 亿元、地方配套资金 242.2 亿元，完成率分别

为 88.9%（见图 4）和 96.2%。在完成的中央资金中，中小河流治理 104.4 亿元、小型病险水库除险加固 151.7 亿元、小型农田水利建设 120.3 亿元，完成率分别为 80.3%、90.3%和 96.1%。

图4 2011年中央财政水利专项投资完成率
(按地区分)

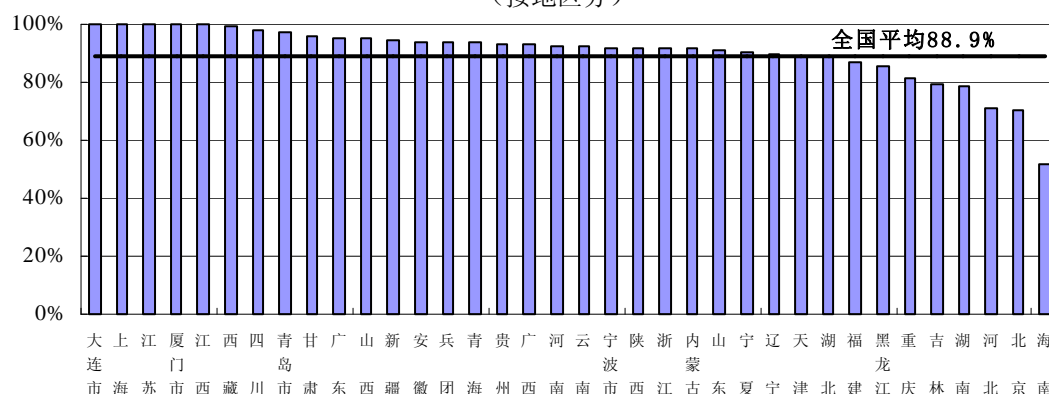

2012 年中央预算内水利投资计划已累计完成投资 209.1 亿元，其中中央投资 114.6 亿元、地方配套投资 94.4 亿元，计划完成率分别为 16.5%和 16.1%。在完成的中央投资中，农村饮水安全工程 56.6 亿元、大中型病险水库除险加固 1.0 亿元、灌区建设与节水改造工程 0.9 亿元、重大水利工程 56.2 亿元。

2012 年中央财政水利专项资金已累计完成 124.0 亿元，其中中央资金 93.5 亿元、地方配套资金 30.6 亿元。在完成的中央资金中，中小河流治理 54.3 亿元、小型病险水库除险加固 31.9 亿元、小型农田水利建设 5.6 亿元。

五、工程进展情况

2011 年中央水利投资计划已开工项目累计完成土方 161624.1 万立方米，石方 19450.14 万立方米，砼 3587.38 万立

方米，金属结构 68.69 万吨。累计新建及加固堤防长度 5226.0 公里，河道清淤疏浚和岸线整治 4949.1 公里，累计新增渠道整治和防渗长度 32074.6 公里，累计治理水土流失面积 974.6 平方公里。

六、数据报送情况

本期月报第一次采用水利建设投资项目管理和信息直报系统上报数据；2012 年累计安排中央水利投资计划数据有所调整。

发送：部领导，总工程师、总规划师，部有关司局、直属单位；国家发展改革委投资司、农经司；财政部经建司、农业司；监察部综合室；国家审计署投资司、农林水审计局；有关省（自治区、直辖市）政府主管领导、水利（水务）厅（局），有关计划单列市水利（水务）局，新疆生产建设兵团水利局。

共印 130 份
