

# 中央水利建设投资统计 月报 (十月)

水利部规划计划司

2012年11月7日

---

2011年累计安排中央水利投资计划1140.8亿元，纳入月报统计的中央投资1093.0亿元（不含南水北调19亿元、山洪灾害防治县级非工程措施建设补助专项资金28亿元、由其他部门实施的小型农田水利建设专项资金0.8亿元），其中中央预算内投资663.1亿元，中央财政水利专项资金429.9亿元。

2012年累计安排中央水利投资计划1602.7亿元，纳入月报统计的中央投资1561.3亿元（不包含山洪灾害41.4亿元），其中中央预算内投资914.6亿元，主要安排农村饮水安全工程280亿元、大中型病险水库（闸）除险加固25亿、灌区建设与节水改造工程110亿元、重大水利工程499.6亿元；中央财政水利专项资金646.7亿元，主要安排中小河流治理210亿元、小型病险水库除险加固208亿元、小型农田水利建设203.1亿元、水土保持20亿元、农村水电增效扩容改造5.65亿元。

截至2012年10月31日统计：

## 一、投资计划下达情况

2011 年中央水利建设投资计划 1093.0 亿元，已下达到项目单位 1079.3 亿元，投资计划下达率为 98.7%。其中，下达率低于 95% 的地方有吉林、黑龙江、海南、重庆。

2012 年中央预算内水利投资 914.6 亿元，要求地方配套投资 841.7 亿元。已下达到项目单位中央投资计划 784.8 亿元、地方配套投资计划 717.7 亿元，投资计划下达率分别为 85.8% 和 85.3%。其中农村饮水安全工程、大中型病险水库除险加固工程、灌区建设与节水改造工程、重大水利工程中央投资分别下达 247.5 亿元、21.3 亿元、92.0 亿元、423.9 亿元，投资计划下达率分别为 88.4%、85.2%、83.7% 和 84.9%。

2012 年中央财政水利专项资金预算共 646.7 亿元，已分解下达项目单位 444.1 亿元，预算分解下达率为 68.7%。其中中小河流治理、小型病险水库除险加固、小型农田水利建设、水土保持和农村水电增效扩容改造中央投资分别下达 165.7 亿元、164.5 亿元、104.9 亿元、4.6 亿元和 4.3 亿元，预算分解下达率分别为 78.9%、79.1%、51.7%、23.2% 和 75.4%。


## 二、资金到位情况

2011 年已拨付项目单位中央投资 1066.1 亿元、地方配套投资 832.6 亿元，到位率分别为 97.6% 和 95.5%。其中，中央投资到位率低于 90% 的地方有：吉林、海南。

2012 年中央预算内水利投资计划已拨付项目单位中央投资


648.0 亿元、地方配套投资 365.3 亿元，到位率分别为 70.8%和 43.4%（见图 1）。其中，农村饮水安全工程、大中型病险水库除险加固工程、灌区建设与节水改造工程、重大水利工程分别拨付到位地方配套投资 115.0 亿元、3.5 亿元、21.4 亿元、225.3 亿元，到位率分别为 75.9%、27.3%、32.8%和 36.8%。

图1 2012年中央预算内投资地方配套投资拨付率  
(按地区分)

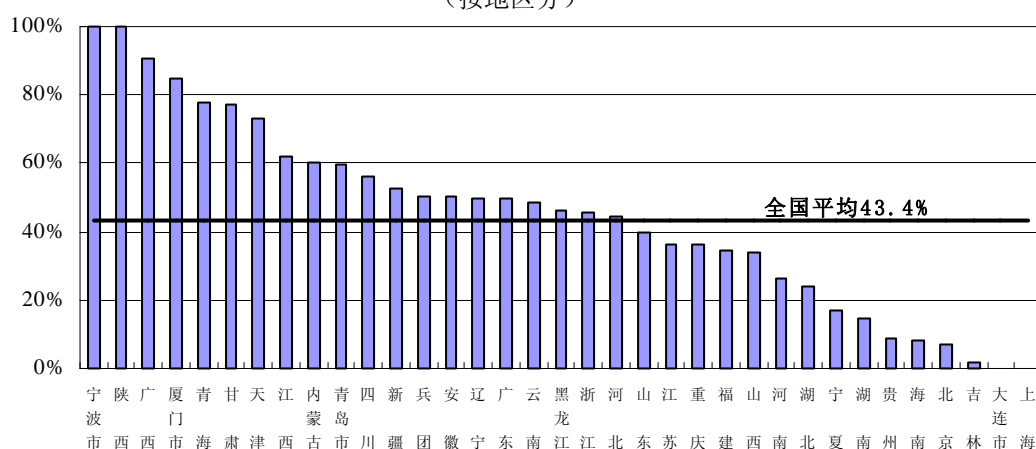

2012 年中央财政水利专项资金已拨付项目单位中央资金 392.6 亿元、地方配套资金 132.1 亿元，到位率分别为 60.7%和 57.4%（见图 2）。

图2 2012年中央财政水利专项投资计划地方配套投资拨付率  
(按地区分)

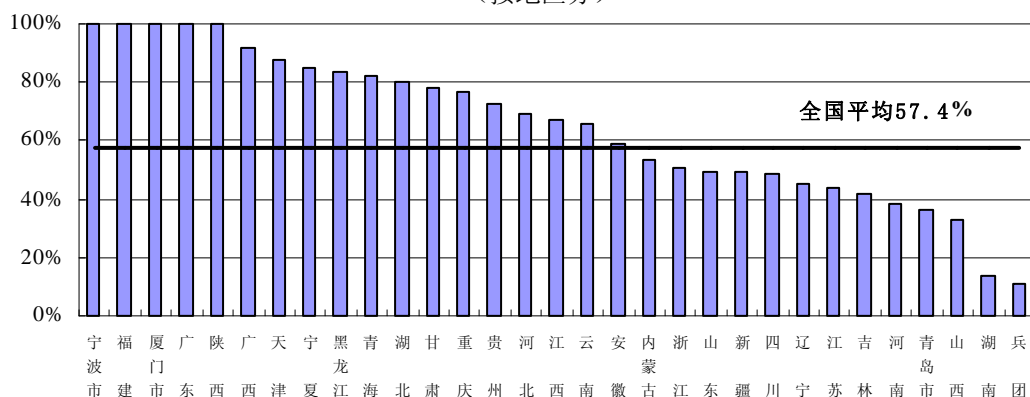

### 三、项目开工情况

2011 年中央水利投资计划已分解落实水利建设项目 11650 个，共有 11362 个项目开工建设，项目开工率为 97.5%。其中，开工率低于 90%的地方有北京、河北、上海、兵团。

2012 年中央水利投资计划已分解落实水利建设项目 13615 个，其中中央预算内水利建设投资计划 5201 个，中央财政水利专项资金 8414 个。共有 8882 个项目开工建设，其中中央预算内水利投资计划开工 3206 个，中央财政水利专项资金开工 5676 个，开工率分别为 61.6%和 67.5%。

### 四、投资完成情况

2011 年已累计完成中央水利投资 1013.7 亿元，地方配套投资 815.1 亿元，投资完成率分别为 92.7%和 93.5%。其中，中央投资完成率低于 80%的地方有河北、海南、兵团。

2012 年中央预算内水利投资安排的项目已累计完成投资 608.8 亿元，其中中央投资 377.4 亿元、地方配套投资 231.4 亿元，完成率分别为 41.3%（见图 3）和 27.5%。在完成的中央投资中，农村饮水安全工程 176.9 亿元、大中型病险水库除险加固工程 2.7 亿元、灌区建设与节水改造工程 15.4 亿元、重大水利工程 182.4 亿元，完成率分别为 63.2%、10.8%、14.0%和 36.5%。



河道清淤疏浚和岸线整治 6958 公里，累计新增渠道整治和防渗长度 35090 公里，累计治理水土流失面积 1934 平方公里。

2012 年中央水利投资计划已开工项目累计完成土方 69132.1 万立方米，石方 10559.4 万立方米，砼 1144.9 万立方米，金属结构 23.6 万吨。累计新建及加固堤防长度 3608 公里，河道清淤疏浚和岸线整治 2667 公里，累计新增渠道整治和防渗长度 2698 公里，累计治理水土流失面积 1214 平方公里。

## 六、数据报送情况

本期数据报送过程中，**重庆市**数据变动较大。

---

发送：部领导，总工程师、总规划师，部有关司局、直属单位；国家发展改革委投资司、农经司；财政部经建司、农业司；监察部综合室；国家审计署投资司、农林水审计局；有关省（自治区、直辖市）政府主管领导、水利（水务）厅（局），有关计划单列市水利（水务）局，新疆生产建设兵团水利局。

---

共印 130 份
