

# 中央水利建设投资统计 月报 (十一月)

水利部规划计划司

2012年12月10日

---

2011年累计安排中央水利投资计划1140.8亿元，纳入月报统计的中央投资1093.0亿元（不含南水北调19亿元、山洪灾害防治县级非工程措施建设补助专项资金28亿元、由其他部门实施的小型农田水利建设专项资金0.8亿元），其中中央预算内投资663.1亿元，中央财政水利专项资金429.9亿元。

2012年累计安排中央水利投资计划1605.9亿元，纳入月报统计的中央投资1564.5亿元（不包含山洪灾害41.4亿元），其中中央预算内投资918.6亿元，主要安排农村饮水安全工程280亿元、大中型病险水库（闸）除险加固25亿、灌区建设与节水改造工程110亿元、重大水利工程503.6亿元；中央财政水利专项资金645.9亿元，主要安排中小河流治理210亿元、小型病险水库除险加固208亿元、小型农田水利建设203.1亿元、水土保持20亿元、农村水电增效扩容改造4.8亿元。

截至2012年11月30日统计：

## 一、投资计划下达情况

2011 年中央水利建设投资计划 1093.0 亿元，已下达到项目单位 1081.5 亿元，投资计划下达率为 99.0%。其中，未完全下达的有北京、辽宁、黑龙江、福建、山东、湖北、湖南、陕西。

2012 年中央预算内水利投资 918.6 亿元，要求地方配套投资 845.9 亿元。已下达到项目单位中央投资计划 863.3 亿元、地方配套投资计划 822.0 亿元，投资计划下达率分别为 94.0%和 97.2%。其中农村饮水安全工程、大中型病险水库除险加固工程、灌区建设与节水改造工程、重大水利工程中央投资分别下达 269.97 亿元、24.3 亿元、103.7 亿元、465.4 亿元，投资计划下达率分别为 96.4%、97.3%、94.2%和 92.4%。

2012 年中央财政水利专项资金预算共 645.9 亿元，已分解下达项目单位 536.3 亿元，预算分解下达率为 83.0%。其中中小河流治理、小型病险水库除险加固、小型农田水利建设、水土保持和农村水电增效扩容改造中央投资分别下达 188.5 亿元、188.8 亿元、141.6 亿元、12.5 亿元和 4.8 亿元，预算分解下达率分别为 89.8%、90.8%、69.7%、62.7%和 100.0%。


## 二、资金到位情况

2011 年已拨付项目单位中央投资 1072.4 亿元、地方配套投资 849.6 亿元，到位率分别为 98.1%和 97.0%。其中，中央投资到位率低于 95%的地方有：北京、河北、湖南、海南、兵团。

2012 年中央预算内水利投资计划已拨付项目单位中央投资


759.0 亿元、地方配套投资 467.0 亿元，到位率分别为 82.6%和 55.2%（见图 1）。其中，农村饮水安全工程、大中型病险水库除险加固工程、灌区建设与节水改造工程、重大水利工程分别拨付到位地方配套投资 132.3 亿元、4.6 亿元、26.8 亿元、303.2 亿元，到位率分别为 87.3%、35.8%、41.1%和 49.2%。

图1 2012年中央预算内投资地方配套投资拨付率  
(按地区分)

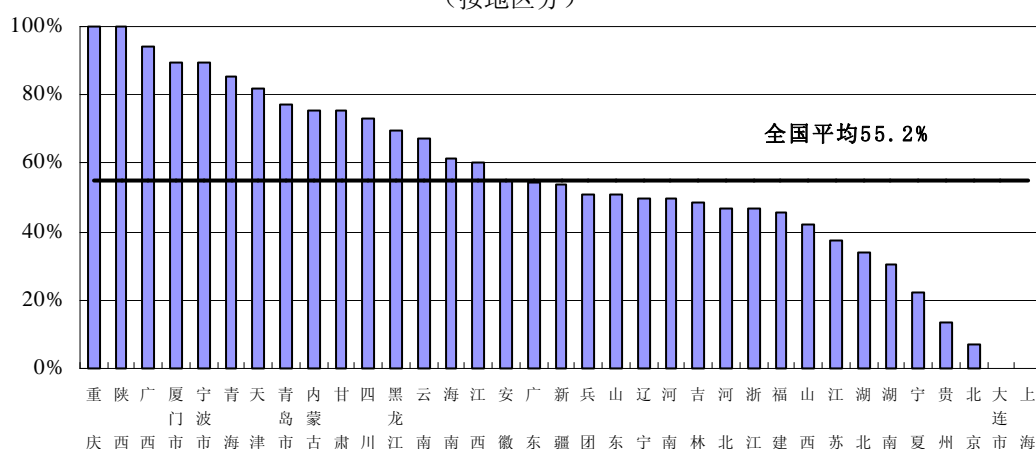

2012 年中央财政水利专项资金已拨付项目单位中央资金 483.7 亿元、地方配套资金 180.4 亿元，到位率分别为 74.8%和 64.2%（见图 2）。

图2 2012年中央财政水利专项投资计划地方配套投资拨付率  
(按地区分)

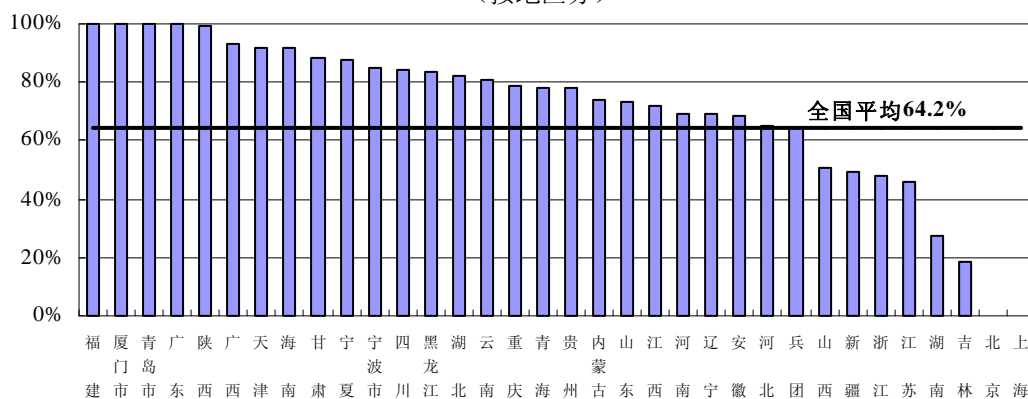

### 三、项目开工情况

2011 年中央水利投资计划已分解落实水利建设项目 11732 个，共有 11521 个项目开工建设，项目开工率为 98.2%。其中，开工率低于 90%的地方有北京、河北、上海、兵团。


2012 年中央水利投资计划已分解落实水利建设项目 16278 个，其中中央预算内水利建设投资计划 6038 个，中央财政水利专项资金 10240 个。共有 12859 个项目开工建设，其中中央预算内水利投资计划开工 4602 个，中央财政水利专项资金开工 8257 个，开工率分别为 76.2%和 80.6%。

### 四、投资完成情况

2011 年已累计完成中央水利投资 1034.7 亿元，地方配套投资 859.3 亿元，投资完成率分别为 94.7%和 98.1%。其中，中央投资完成率低于 90%的地方有北京、河北、内蒙古、海南、兵团。


2012 年中央预算内水利投资安排的项目已累计完成投资 889.8 亿元，其中中央投资 524.4 亿元、地方配套投资 365.4 亿元，完成率分别为 57.1%（见图 3）和 43.2%。在完成的中央投资中，农村饮水安全工程 227.7 亿元、大中型病险水库除险加固工程 7.0 亿元、灌区建设与节水改造工程 29.0 亿元、重大水利工程 260.7 亿元，完成率分别为 81.3%、27.9%、26.4%和 51.8%。

图3 2012年中央预算内投资中央投资完成率  
(按地区分)

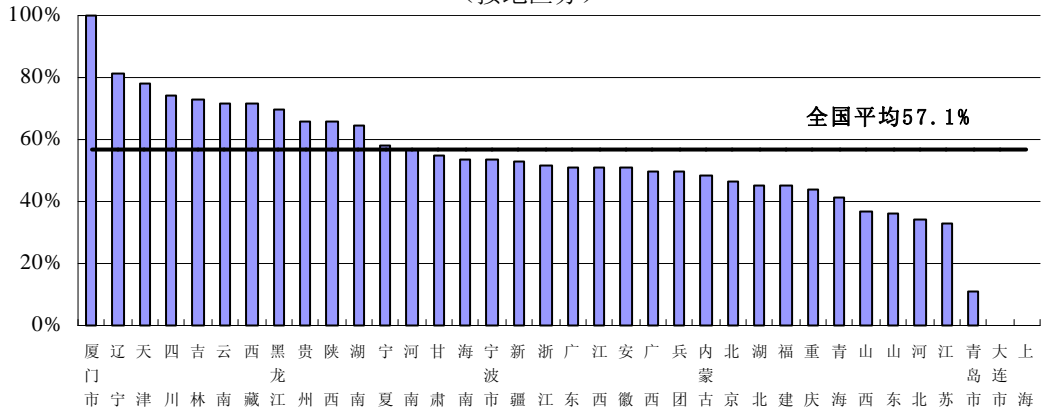

2012年中央财政水利专项资金安排的项目已累计完成投资369.9亿元，其中中央资金267.2亿元、地方配套资金102.7亿元，完成率分别为41.4%（见图4）和36.5%。在完成的中央资金中，中小河流治理114.2亿元、小型病险水库除险加固98.3亿元、小型农田水利建设46.2亿元，完成率分别为54.4%、47.2%和22.8%。

图4 2012年中央财政水利专项投资完成率  
(按地区分)

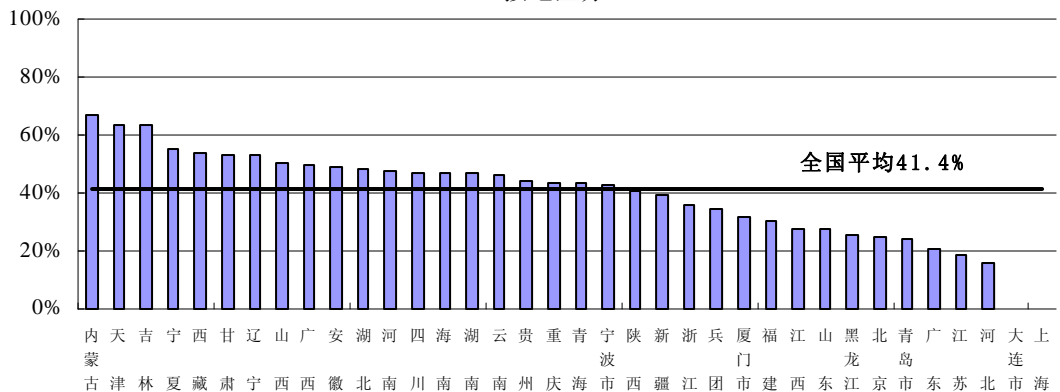

## 五、工程进展情况

2011年中央水利投资计划已开工项目累计完成土方

229444.6 万立方米，石方 23269.4 万立方米，砼 3830.1 万立方米，金属结构 71.4 万吨。累计新建及加固堤防长度 7133 公里，河道清淤疏浚和岸线整治 7036 公里，累计新增渠道整治和防渗长度 35523 公里，累计治理水土流失面积 2206 平方公里。

2012 年中央水利投资计划已开工项目累计完成土方 99565.0 万立方米，石方 24506.9 万立方米，砼 1639.5 万立方米，金属结构 30.4 万吨。累计新建及加固堤防长度 4286 公里，河道清淤疏浚和岸线整治 3459 公里，累计新增渠道整治和防渗长度 6285 公里，累计治理水土流失面积 1862 平方公里。

## 六、数据报送情况

本期数据报送过程中，湖南、宁波数据变动较大。

---

发送：部领导，总工程师、总规划师，部有关司局、直属单位；国家发展改革委投资司、农经司；财政部经建司、农业司；监察部综合室；国家审计署投资司、农林水审计局；有关省（自治区、直辖市）政府主管领导、水利（水务）厅（局），有关计划单列市水利（水务）局，新疆生产建设兵团水利局。

---

共印 130 份
