

# 中央水利建设投资统计 月报 (二月)

水利部规划计划司

2013年3月5日

---

2012年累计安排中央水利投资计划1623亿元,纳入月报统计的中央投资1564.5亿元,其中中央预算内投资918.6亿元,主要安排农村饮水安全工程280亿元、大中型病险水库(闸)除险加固25亿、灌区建设与节水改造工程110亿元、重大水利工程503.6亿元;中央财政水利专项资金645.9亿元,主要安排中小河流治理210亿元、小型病险水库除险加固208亿元、小型农田水利建设203.1亿元、水土保持20亿元、农村水电增效扩容改造4.8亿元。

截至2013年2月28日统计:2012年中央投资计划完成率75.5%,与上期相比提高5.5%;与去年同期相比提高9.4%。

## 一、投资计划下达情况

2012年中央水利建设投资计划已下达到项目单位1534.5亿元,投资计划下达率为98.1%。投资计划尚未全部下达的地区有北京、内蒙古、辽宁、大连、黑龙江、福建、厦门、江西、山东、青岛、广东、重庆、西藏、宁夏、兵团;下达率低于90%

的地区有大连、黑龙江、厦门。

2012 年中央预算内水利投资 918.6 亿元，要求地方配套投资 845.9 亿元。已下达到项目单位中央投资计划 911.5 亿元、地方配套投资计划 911.8 亿元，投资计划下达率分别为 99.2% 和 107.8%。其中农村饮水安全工程、大中型病险水库除险加固工程、灌区建设与节水改造工程、重大水利工程中央投资分别下达 279.5 亿元、25.0 亿元、110.0 亿元、497.0 亿元，投资计划下达率分别为 99.8%、100.0%、100.0% 和 98.7%。

2012 年中央财政水利专项资金预算共 645.9 亿元，已分解下达项目单位 623.1 亿元，预算分解下达率为 96.5%。其中中小河流治理、小型病险水库除险加固、小型农田水利建设、水土保持和农村水电增效扩容改造中央投资分别下达 207.7 亿元、207.6 亿元、184.8 亿元、18.2 亿元和 4.8 亿元，预算分解下达率分别为 98.9%、99.8%、91.0%、90.9% 和 100.0%。


## 二、资金到位情况

2012 年中央预算内水利投资计划已拨付项目单位中央投资 860.8 亿元、地方配套投资 710.8 亿元，到位率分别为 93.7% 和 84.0%（见图 1）。其中，农村饮水安全工程、大中型病险水库除险加固工程、灌区建设与节水改造工程、重大水利工程分别拨付到位地方配套投资 162.3 亿元、7.2 亿元、46.1 亿元、495.2 亿元，到位率分别为 107.1%、55.4%、70.6% 和 80.4%。





图4 2012年中央财政水利专项投资完成率  
(按地区分)

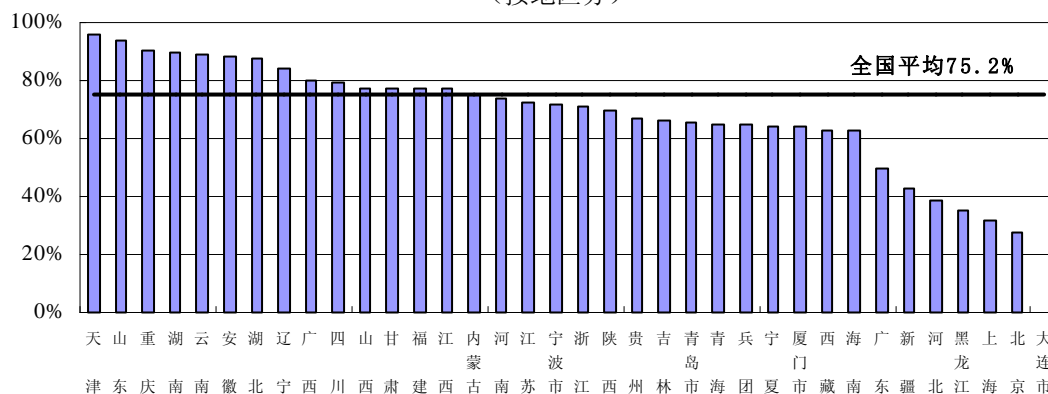

## 五、工程进展情况

2012年中央水利投资计划已开工项目累计完成土方 16.8 亿立方米，石方 3.2 亿立方米，砼 2718.9 万立方米，金属结构 42.7 万吨。累计新建及加固堤防长度 5344 公里，河道清淤疏浚和岸线整治 5548 公里，累计新增渠道整治和防渗长度 12489 公里，累计治理水土流失面积 4194 平方公里。

---

发送：部领导，总工程师、总规划师，部有关司局、直属单位；国家发展改革委投资司、农经司；财政部经建司、农业司；监察部综合室；国家审计署投资司、农林水审计局；有关省（自治区、直辖市）政府主管领导、水利（水务）厅（局），有关计划单列市水利（水务）局，新疆生产建设兵团水利局。

---

共印 130 份
