

# 中央水利建设投资统计 月报 (四月)

水利部规划计划司

2013年5月6日

---

2012年累计安排中央水利投资计划1623亿元,纳入月报统计的中央投资1564.5亿元,其中中央预算内投资918.6亿元,主要安排农村饮水安全工程280亿元、大中型病险水库(闸)除险加固25亿、灌区建设与节水改造工程110亿元、重大水利工程503.6亿元;中央财政水利专项资金645.9亿元,主要安排中小河流治理210亿元、小型病险水库除险加固208亿元、小型农田水利建设203.1亿元、水土保持20亿元、农村水电增效扩容改造4.8亿元。

截至2013年4月30日统计:2012年中央投资计划完成率85.9%,与上期相比提高3.6%;与去年同期相比提高10.6%。

## 一、投资计划下达情况

2012年中央预算内水利投资918.6亿元,要求地方配套投资845.9亿元。已下达到项目单位中央投资计划918.3亿元、地方配套投资计划924.9亿元,投资计划下达率分别为99.97%和109.3%。其中农村饮水安全工程、大中型病险水库(闸)除险


加固工程、灌区建设与节水改造工程中央投资已全部下达，投资计划下达率为 100.0%；重大水利工程中央投资下达 503.3 亿元，投资计划下达率为 99.9%。

2012 年中央财政水利专项资金预算共 645.9 亿元，已分解下达项目单位 644.2 亿元，预算分解下达率为 99.7%。其中中小河流治理、小型病险水库除险加固、小型农田水利建设、水土保持和农村水电增效扩容改造中央投资分别下达 209.2 亿元、207.4 亿元、202.8 亿元、20.0 亿元和 4.8 亿元，预算分解下达率分别为 99.6%、99.7%、99.9%、100.0% 和 100.0%。

## 二、资金到位情况


2012 年中央预算内水利投资计划已拨付项目单位中央投资 881.9 亿元、地方配套投资 764.3 亿元，到位率分别为 96.0% 和 90.3%（见图 1）。其中，农村饮水安全工程、大中型病险水库（闸）除险加固工程、灌区建设与节水改造工程、重大水利工

图1 2012年中央预算内投资地方配套投资拨付率  
(按地区分)

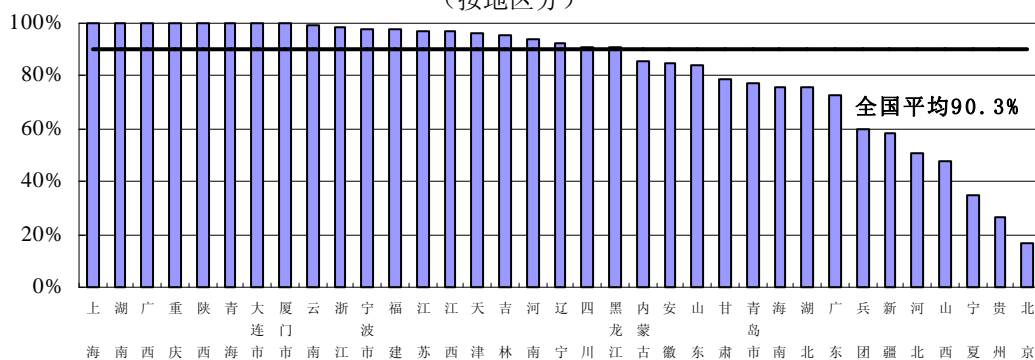

程分别拨付到位地方配套投资 168.1 亿元、9.2 亿元、48.7 亿元、538.3 亿元，到位率分别为 110.9%、71.2%、74.6%和 87.4%。

2012 年中央财政水利专项资金已拨付项目单位中央资金 636.9 亿元、地方配套资金 345.0 亿元，到位率分别为 98.6%和 94.8%（见图 2）。

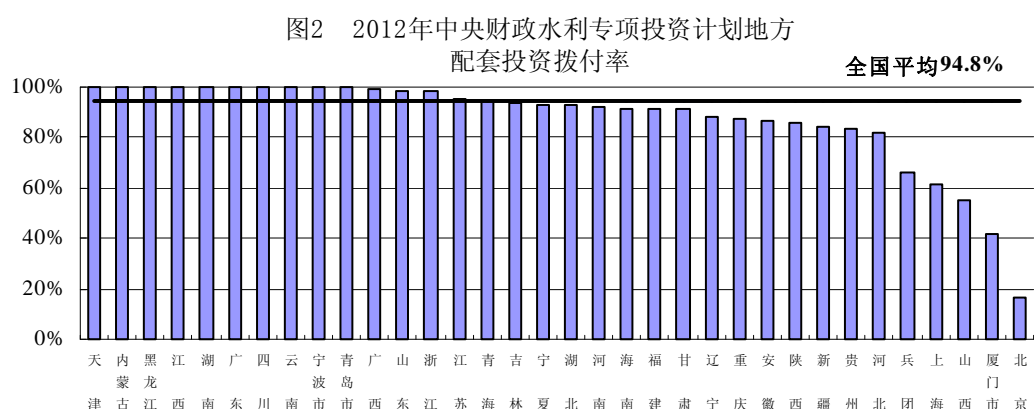

### 三、项目开工情况

2012 年中央水利投资计划已分解落实水利建设项目 17174 个，其中中央预算内水利建设投资计划 6166 个，中央财政水利专项资金 11008 个。共有 16340 个项目开工建设，其中中央预算内水利投资计划开工 5765 个，中央财政水利专项资金开工 10575 个，开工率分别为 93.5%和 96.1%。

### 四、投资完成情况

2012 年中央预算内水利投资安排的项目已累计完成投资 1436.1 亿元，其中中央投资 768.2 亿元、地方配套投资 667.9 亿元，完成率分别为 83.6%（见图 3）和 79.0%。在完成的中央投资中，农村饮水安全工程 271.8 亿元、大中型病险水库（闸）除



## 五、工程进展情况

2012年中央水利投资计划已开工项目累计完成土方 22.3 亿立方米，石方 4.4 亿立方米，砼 3601.6 万立方米，金属结构 65.6 万吨。累计新建及加固堤防长度 7057 公里，河道清淤疏浚和岸线整治 8296 公里，累计新增渠道整治和防渗长度 16137 公里，累计治理水土流失面积 6886 平方公里。

---

发送：部领导，总工程师、总规划师，部有关司局、直属单位；国家发展改革委投资司、农经司；财政部经建司、农业司；监察部综合室；国家审计署投资司、农林水审计局；有关省（自治区、直辖市）政府主管领导、水利（水务）厅（局），有关计划单列市水利（水务）局，新疆生产建设兵团水利局。

---

共印 130 份
