

# 中央水利建设投资统计 月报 (五月)

水利部规划计划司

2013年6月5日

---

2012年累计安排中央水利投资计划1623亿元,纳入月报统计的中央投资1564.5亿元,其中中央预算内投资918.6亿元,主要安排农村饮水安全工程280亿元、大中型病险水库(闸)除险加固25亿、灌区建设与节水改造工程110亿元、重大水利工程503.6亿元;中央财政水利专项资金645.9亿元,主要安排中小河流治理210亿元、小型病险水库除险加固208亿元、小型农田水利建设203.1亿元、水土保持20亿元、农村水电增效扩容改造4.8亿元。

截至2013年5月31日,2013年累计安排中央水利投资计划401.1亿元,其中中央预算内投资281.1亿元,中央财政水利专项资金120.0亿元。将在今后月报中逐步详细反映中央水利投资计划落实情况。

截至2013年5月31日统计:2012年中央投资计划完成率88.3%,与上期相比提高2.4%;与去年同期相比提高10.3%。

## 一、投资计划下达情况

2012 年中央预算内水利投资 918.6 亿元，要求地方配套投资 845.9 亿元。已下达到项目单位中央投资计划 918.3 亿元、地方配套投资计划 916.6 亿元，投资计划下达率分别为 99.97% 和 108.4%。其中农村饮水安全工程、大中型病险水库（闸）除险加固工程、灌区建设与节水改造工程中央投资已全部下达，投资计划下达率为 100.0%；重大水利工程中央投资下达 503.3 亿元，投资计划下达率为 99.9%。

2012 年中央财政水利专项资金预算共 645.9 亿元，已分解下达项目单位 644.4 亿元，预算分解下达率为 99.8%。其中中小河流治理、小型病险水库除险加固、小型农田水利建设、水土保持和农村水电增效扩容改造中央投资分别下达 209.2 亿元、207.6 亿元、202.8 亿元、20.0 亿元和 4.8 亿元，预算分解下达率分别为 99.6%、99.8%、99.9%、100.0% 和 100.0%。

2013 年中央水利建设投资累计已下达到项目单位中央投资计划 154.1 亿元、地方配套投资计划 56.9 亿元，投资计划下达率分别为 38.4% 和 41.5%。


## 二、资金到位情况

2012 年中央预算内水利投资计划已拨付项目单位中央投资 896.3 亿元、地方配套投资 782.7 亿元，到位率分别为 97.6% 和 92.5%（见图 1）。其中，农村饮水安全工程、大中型病险水库（闸）除险加固工程、灌区建设与节水改造工程、重大水利工





元，完成率分别为 91.6%（见图 4）和 87.0%。在完成的中央资金中，中小河流治理 193.1 亿元、小型病险水库除险加固 191.9 亿元、小型农田水利建设 181.8 亿元，完成率分别为 91.9%、92.3% 和 89.8%。

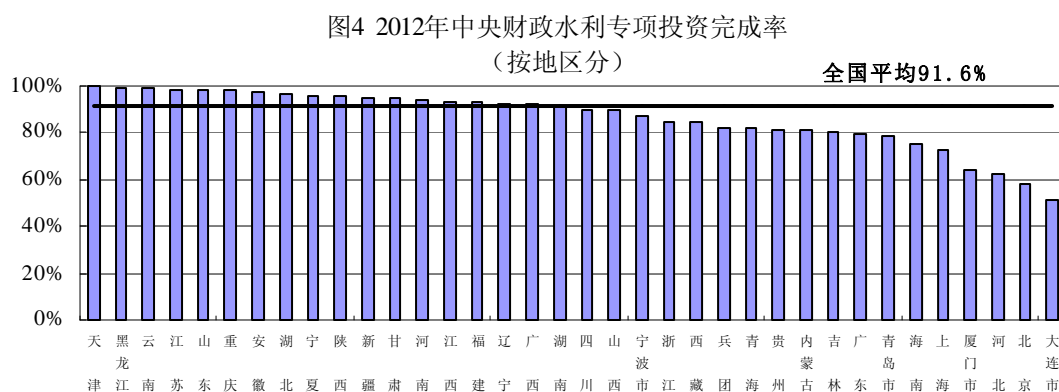

2013 年中央水利建设投资累计完成 32.7 亿元，其中中央资金 24.9 亿元、地方配套资金 7.8 亿元，投资完成率分别为 6.2% 和 5.7%。

## 五、工程进展情况

2012 年中央水利投资计划已开工项目累计完成土方 24.2 亿立方米，石方 4.9 亿立方米，砼 4039.7 万立方米，金属结构 69.2 万吨。累计新建及加固堤防长度 7707 公里，河道清淤疏浚和岸线整治 8490 公里，累计新增渠道整治和防渗长度 17019 公里，累计治理水土流失面积 7943 平方公里。

---

发送：部领导，总工程师、总规划师，部有关司局、直属单位；国家发展改革委投资司、农经司；财政部经建司、农业司；监察部综合室；国家审计署投资司、农林水审计局；有关省（自治区、直辖市）政府主管领导、水利（水务）厅（局），有关计划单列市水利（水务）局，新疆生产建设兵团水利局。

---

共印 130 份
