

# 中央水利建设投资统计 月报 (九月)

水利部规划计划司

2013年10月11日

---

截至2013年9月30日，2013年累计安排中央水利投资计划1173.6亿元，其中中央预算内投资727.2亿元，主要安排农村饮水安全工程225亿元、大中型病险水库（闸）除险加固25亿元、灌区建设与节水改造工程92亿元、重大水利工程385.2亿元；中央财政水利专项资金446.4亿元，主要安排中小河流治理208亿元、小型病险水库除险加固29.98亿元、小型农田水利建设178.1亿元、水土保持13亿元，农村水电增效扩容17.4亿元。

2012年累计安排中央水利投资计划1623亿元，纳入月报统计的中央投资1564.5亿元，其中中央预算内投资918.6亿元，中央财政水利专项资金645.9亿元。

## 一、投资计划下达情况

2013年中央预算内水利投资727.2亿元，要求地方配套投资676.9亿元。已下达到项目单位中央投资计划667.9亿元、地方配套投资计划594.6亿元，投资计划下达率分别为91.9%和87.8%。其中农村饮水安全工程、大中型病险水库（闸）除险加

固工程、灌区建设与节水改造工程和重大水利工程分别下达中央投资 216.1 亿元、24.3 亿元、82.3 亿元和 345.2 亿元，投资计划下达率分别为 96.0%、97.3%、89.5%和 89.6%。


2013 年中央财政水利专项资金预算共 446.4 亿元，已分解下达项目单位 327.6 亿元，预算分解下达率为 73.4%。其中中小河流治理、小型病险水库除险加固、小型农田水利建设、水土保持和农村水电增效扩容改造中央投资分别下达 170.2 亿元、28 亿元、106.8 亿元、9.8 亿元和 12.8 亿元，预算分解下达率分别为 81.8%、93.4%、60%、75.2%和 73.8%。

2012 年中央水利建设投资累计已下达到项目单位中央投资计划 1563.5 亿元、地方配套投资计划 1297.2 亿元，投资计划下达率分别为 99.9%和 106.5%。其中，水毁工程、小型病险水库除险加固、小型农田水利建设项目中央投资计划尚未完全下达，中央投资计划下达率分别为 98.2%、99.8%和 99.9%。

## 二、资金到位情况

2013 年中央预算内水利投资计划已拨付项目单位中央投资 603.6 亿元、地方配套投资 296.9 亿元，到位率分别为 83.0%和 43.9%（见图 1）。其中，农村饮水安全工程、大中型病险水库（闸）除险加固工程、灌区建设与节水改造工程、重大水利工


图1 2013年中央预算内投资地方配套投资拨付率  
(按地区分)

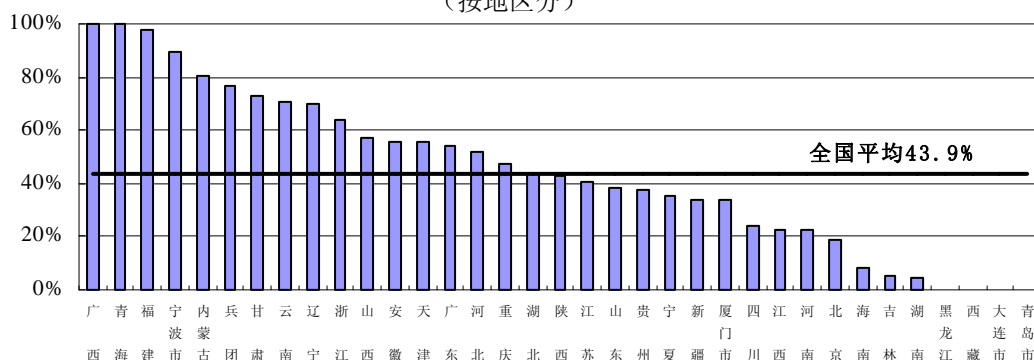

程分别拨付到位地方配套投资 66.0 亿元、6.1 亿元、19.1 亿元、205.7 亿元，到位率分别为 66.4%、43.9%、33.8%和 40.6%。

2013 年中央财政水利专项资金已拨付项目单位中央资金 303.7 亿元、地方配套资金 116.5 亿元，到位率分别为 68.0%和 56.7%（见图 2）。

图2 2013年中央财政水利专项投资计划地方  
配套投资拨付率

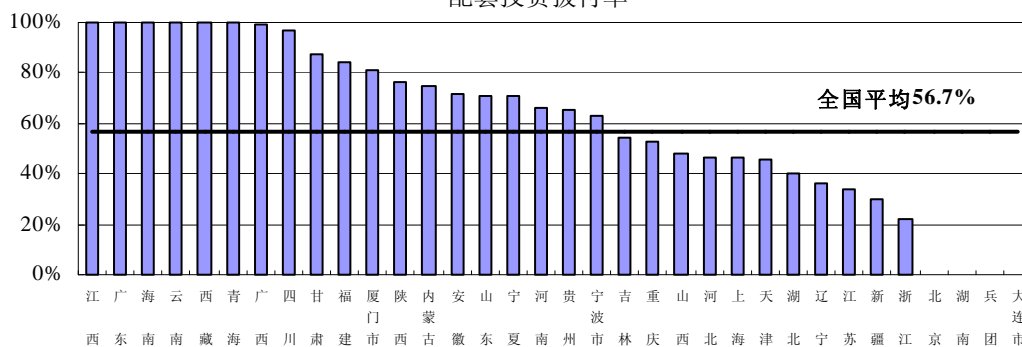

2012 年中央水利建设投资累计拨付到项目单位 2751.3 亿元，其中拨付中央投资 1555.5 亿元，到位率 99.4%；拨付地方配套投资 1195.8 亿元，到位率 98.2%。

### 三、项目开工情况

2013 年中央水利投资计划已分解落实水利建设项目 8147


个，其中中央预算内水利建设投资计划 4679 个，中央财政水利专项资金 3468 个。共有 4124 个项目开工建设，其中中央预算内水利投资计划开工 2427 个，中央财政水利专项资金开工 1697 个，开工率分别为 51.9% 和 48.9%。

2012 年中央水利投资计划已分解落实水利建设项目 17082 个，共有 16767 个项目开工建设，开工率为 98.2%。

#### 四、投资完成情况

2013 年中央预算内水利投资安排的项目已累计完成投资 305.7 亿元，其中中央投资 186.7 亿元、地方配套投资 119.0 亿元，完成率分别为 25.7%（见图 3）和 17.6%。在完成的中央投资中，农村饮水安全工程 89.7 亿元、大中型病险水库（闸）除险加固工程 3.9 亿元、灌区建设与节水改造工程 8.0 亿元、重大水利工程 85.1 亿元，完成率分别为 39.9%、15.7%、8.6% 和 22.1%。


图3 2013年中央预算内投资中央投资完成率  
(按地区分)

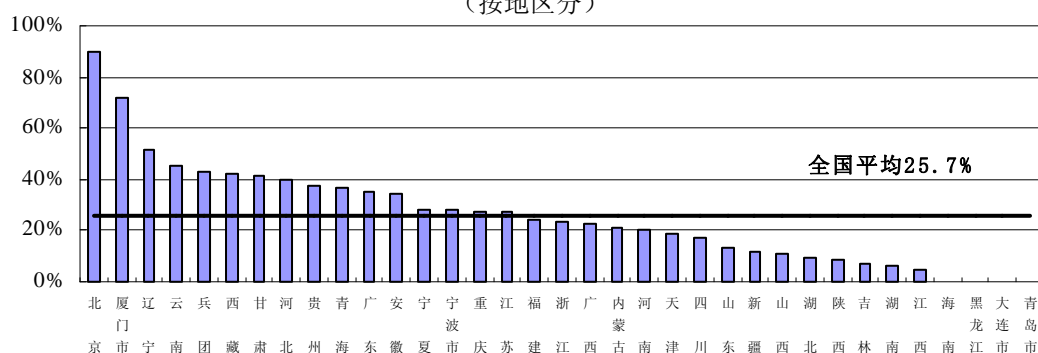

2013 年中央财政水利专项资金安排的项目已累计完成投资 108.4 亿元，其中中央资金 77.4 亿元、地方配套资金 31.0 亿元，完成率分别为 17.3%（见图 4）和 15.1%。在完成的中央资金中，

中小河流治理 59.4 亿元、小型病险水库除险加固 6.0 亿元、小型农田水利建设 11.5 亿元，完成率分别为 28.6%、20.1%和 6.5%。

图4 2013年中央财政水利专项投资完成率  
(按地区分)

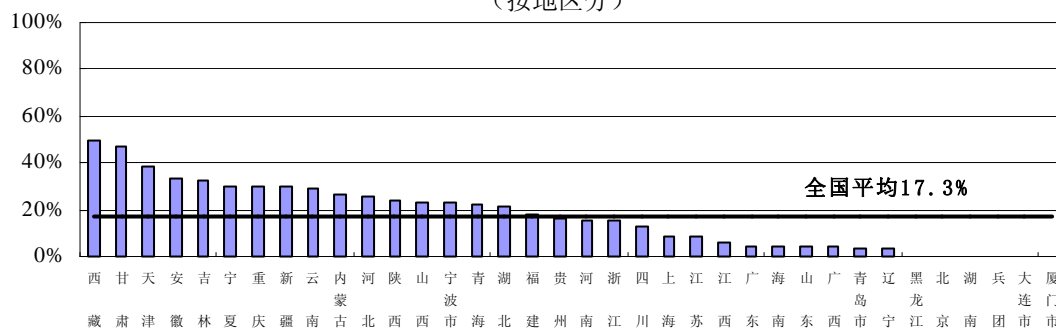

2012 年中央水利建设投资累计完成 2579.9 亿元，其中中央资金 1466.3 亿元、地方配套资金 1113.5 亿元，投资完成率分别为 93.7%和 91.5%。

### 五、工程进展情况

2013 年中央水利投资计划已开工项目累计完成土方 3.8 亿立方米，石方 1.3 亿立方米，砼 609.1 万立方米，金属结构 11.8 万吨。累计新建及加固堤防长度 2027 公里，河道清淤疏浚和岸线整治 1305 公里，累计新增渠道整治和防渗长度 1717 公里，累计治理水土流失面积 936 平方公里。

---

发送：部领导，总工程师、总规划师，部有关司局、直属单位；国家发展改革委投资司、农经司；财政部经建司、农业司；监察部综合室；国家审计署投资司、农林水审计局；有关省（自治区、直辖市）政府主管领导、水利（水务）厅（局），有关计划单列市水利（水务）局，新疆生产建设兵团水利局。

---

共印 130 份
