

中央水利建设投资统计 月报 (十一月)

水利部规划计划司

2013年12月4日

截至2013年11月30日,2013年累计安排中央水利建设投资计划1407.4亿元,纳入月报统计的中央投资1339.6亿元。其中,中央预算内投资计划739.4亿元,主要安排农村饮水安全225亿元、大中型病险水库(闸)除险加固25亿、灌区建设与节水改造92亿元、重大水利工程397.4亿元;中央财政水利专项资金预算600.2亿元,主要安排中小河流治理218亿元、小型病险水库除险加固110亿元、小型农田水利建设241.3亿元、水土保持13亿元,农村水电增效扩容17.9亿元。

2012年累计安排中央水利建设投资计划1623亿元,纳入月报统计的中央投资1564.5亿元,其中中央预算内投资计划918.6亿元、中央财政水利专项资金预算645.9亿元。

一、投资计划下达情况

2013年中央预算内水利投资计划739.4亿元,要求地方配套投资678.9亿元。已下达项目单位中央投资687.4亿元、地方配套投资667.5亿元,投资计划下达率分别为93.0%和98.3%。

在中央预算内水利投资计划中，农村饮水安全、大中型病险水库（闸）除险加固、灌区建设与节水改造和重大水利工程项目下达率分别为 97.5%、100%、88.9%和 90.9%。


2013 年中央财政水利专项资金预算 600.2 亿元，已分解下达项目单位预算 408.1 亿元，预算分解下达率为 68.0%。其中，中小河流治理、小型病险水库除险加固、小型农田水利建设、水土保持和农村水电增效扩容改造项目的预算分解下达率分别为 88.4%、48.1%、56.2%、84.4%和 89.3%。

2012 年中央水利建设计划，已累计下达到项目单位中央投资 1563.8 亿元，地方配套投资 1300.9 亿元，投资计划下达率分别为 99.9%和 106.7%。在中央投资中，水毁工程、小型病险水库除险加固、小型农田水利建设项目的中央投资计划尚未完全下达，计划下达率分别为 98.2%，99.9%和 99.9%。

二、资金到位情况

2013 年中央预算内水利投资计划，已拨付项目单位中央投资 657.8 亿元、地方配套投资 467.4 亿元，到位率分别为 89.0%和 68.8%（见图 1）。在地方配套投资中，农村饮水安全、大中型病险水库（闸）除险加固、灌区建设与节水改造和重大水利工程项目分别拨付到位资金 96.4 亿元、7.9 亿元、23.8 亿元、339.3


图1 2013年中央预算内投资地方配套投资拨付率
(按地区分)

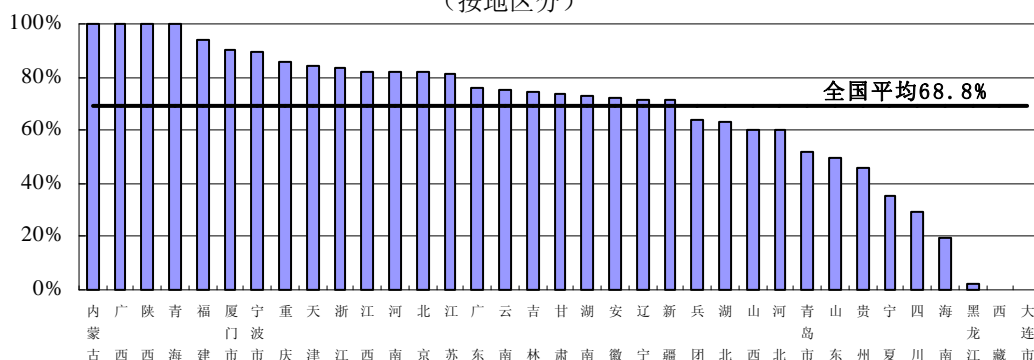

亿元，到位率分别为 97.0%、56.6%、42.0%和 66.7%。

2013 年中央财政水利专项资金预算，已拨付项目单位中央资金 397.1 亿元，地方配套资金 199.7 亿元，到位率分别为 66.2% 和 78.6%（见图 2）。

图2 2013年中央财政水利专项投资计划地方
配套投资拨付率

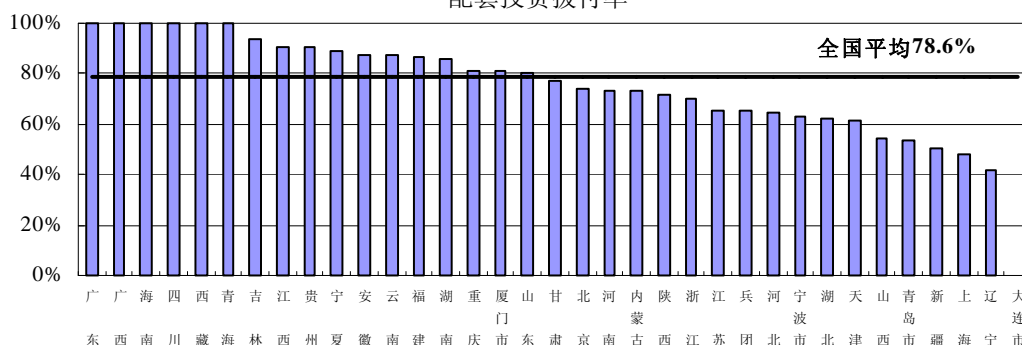

2012 年中央水利建设投资计划，累计拨付到项目单位 2764.5 亿元。其中，拨付中央投资 1560.1 亿元，到位率 99.7%；拨付地方配套投资 1204.4 亿元，到位率 98.8%。

三、项目开工情况

2013 年中央预算内水利投资计划，已分解落实项目 4812 个，累计开工 3631 个，开工率 68.1%。


2013 年中央财政水利专项资金预算，已分解落实项目 6297 个，累计开工 4286 个，开工率 75.5%。

2012 年中央水利建设投资计划，已分解落实项目 17084 个，累计开工 16834 个，开工率 98.5%。

四、投资完成情况


2013 年中央预算内水利投资计划，已累计完成投资 741.0 亿元。其中，中央投资 397.5 亿元，地方配套投资 343.5 亿元，完成率分别为 53.8%（见图 3）和 50.6%。在完成的中央投资中，农村饮水安全工程、大中型病险水库（闸）除险加固工程、灌区建设与节水改造工程、重大水利工程项目的完成率分别为 87.0%、43.0%、22.0%和 43.0%。

图3 2013年中央预算内投资中央投资完成率
(按地区分)

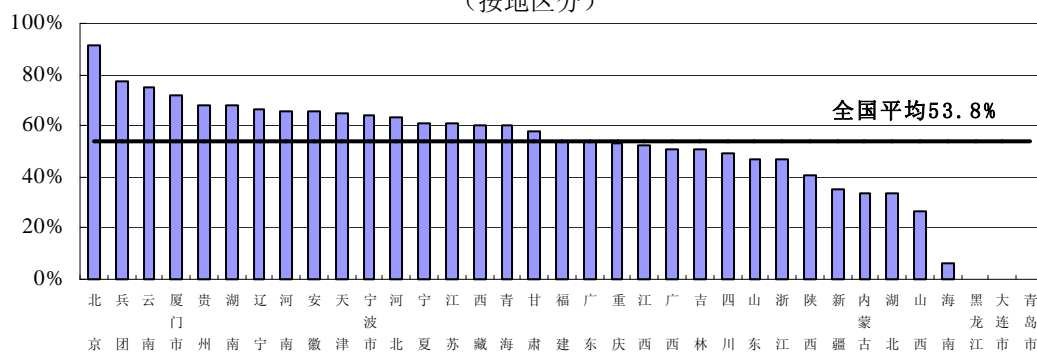

2013 年中央财政水利专项资金预算，已累计完成投资 272.0 亿元。其中，中央资金 188.9 亿元，地方配套资金 83.1 亿元，完成率分别为 31.5%（见图 4）和 32.7%。在完成的中央资金中，中小河流治理、小型病险水库除险加固、小型农田水利建设项目的完成率分别为 48.0%、26.9%和 20.3%。

图4 2013年中央财政水利专项投资完成率
(按地区分)

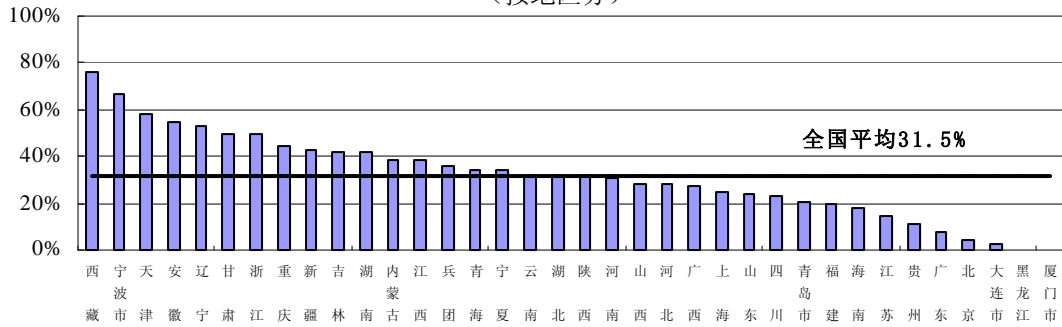

2012年中央水利建设投资计划，已累计完成2661.1亿元。其中，中央资金1496.6亿元，地方配套资金1164.5亿元，投资完成率分别为95.7%和95.5%。

五、工程进展情况

2013年中央水利投资计划，已开工项目累计完成土方8.4亿立方米，石方1.8亿立方米，砼1428.1万立方米，金属结构31.8万吨。累计新建及加固堤防长度3347公里、河道清淤疏浚和岸线整治2816公里、新增渠道整治和防渗长度3514公里、治理水土流失面积2205平方公里。

发送：部领导，总工程师、总规划师，部有关司局、直属单位；国家发展改革委投资司、农经司；财政部经建司、农业司；监察部综合室；国家审计署投资司、农林水审计局；有关省（自治区、直辖市）政府主管领导、水利（水务）厅（局），有关计划单列市水利（水务）局，新疆生产建设兵团水利局。

共印 130 份
