

水利规划计划简报

(水利建设投资统计月报 2013-12)

2014 年第 2 期

水利部规划计划司

2014 年 1 月 6 日

2013 年累计安排中央水利建设投资计划 1408.3 亿元，纳入月报统计中央投资 1340.5 亿元。在纳入统计投资中，中央预算内投资计划 739.4 亿元，主要安排农村饮水安全 225 亿元、大中型病险水库(闸)除险加固 25 亿、灌区建设与节水改造 92 亿元、重大水利工程 397.4 亿元；中央财政水利专项资金预算 601.1 亿元，主要安排中小河流治理 218 亿元、小型病险水库除险加固 110 亿元、小型农田水利建设 241.3 亿元、水土保持 13 亿元，农村水电增效扩容 18.8 亿元。

截至 2013 年 12 月 31 日，中央水利建设投资累计下达项目单位计划 1258.2 亿元，累计拨付项目单位资金 1228.3 亿元，项目单位累计完成投资 824.9 亿元，投资下达率、资金到位率、投资完成率分别为 93.9%、91.6%和 61.5%。分项目类型、分地区中央水利建设投资及配套投资的落实及完成情况详见附表 1、附表 2。

一、投资计划下达情况

2013 年中央预算内水利投资计划 739.4 亿元，要求地方配套投资 678.9 亿元。已下达项目单位中央投资 723.3 亿元、地方配套投资 699.9 亿元，投资计划下达率分别为 97.8%和 103.1%。在中央预算内水利投资计划中，农村饮水安全、大中型病险水库（闸）除险加固、灌区建设与节水改造和重大水利工程项目的下达率分别为 99.9%、100%、98.7%和 96.3%。

2013 年中央财政水利专项资金预算 601.1 亿元，已分解下达项目单位预算 534.9 亿元，预算分解下达率为 89.0%。其中，中小河流治理、小型病险水库除险加固、小型农田水利建设、水土保持和农村水电增效扩容改造项目的预算分解下达率分别为 92.8%、87.5%、85.7%、94.0%和 92.6%。

二、资金到位情况


2013 年中央预算内水利投资计划，已拨付项目单位中央投资 710.3 亿元、地方配套投资 557.1 亿元，到位率分别为 96.1%和 82.1%。在地方配套投资中，农村饮水安全、大中型病险水库（闸）除险加固、灌区建设与节水改造和重大水利工程项目分别拨付到位资金 107.7 亿元、10.4 亿元、33.1 亿元、405.9 亿元，到位率分别为 108.4%、74.7%、58.5%和 79.7%。中央预算内投资项目各地配套投资到位情况，见图 1。

个，累计开工 6662 个，开工率 76.5%。

四、投资完成情况


2013 年中央预算内水利投资计划，已累计完成投资 983.7 亿元。其中，中央投资 515.2 亿元，地方配套投资 463.5 亿元，完成率分别为 69.7%和 68.3%。在完成的中央投资中，农村饮水安全工程、大中型病险水库（闸）除险加固工程、灌区建设与节水改造工程、重大水利工程项目的完成率分别为 97.3%、63.4%、40.4%和 61.2%。各地中央预算内投资完成情况，见图 3。

图3 2013年中央预算内投资中央投资完成率
(按地区分)

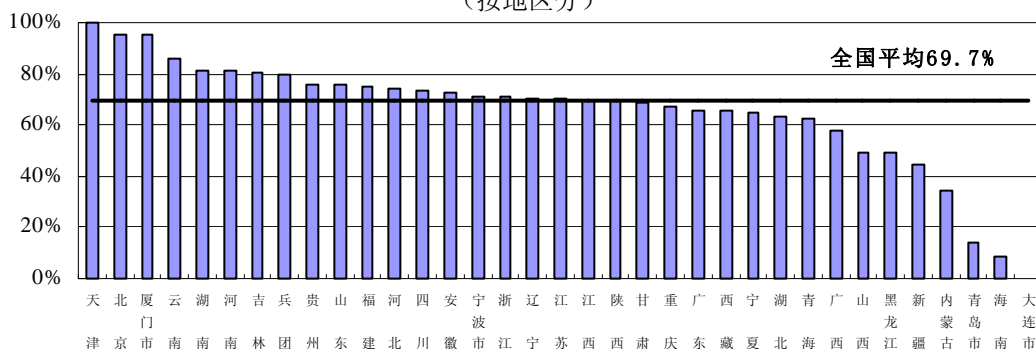

2013 年中央财政水利专项资金预算，已累计完成投资 466.5 亿元。其中，中央资金 309.6 亿元，地方配套资金 156.9 亿元，完成率分别为 51.5%和 49.6%。在完成的中央资金中，中小河流治理、小型病险水库除险加固、小型农田水利建设项目、水土保持和农村水电增效扩容项目的完成率分别为 64.0%、57.7%、39.0%、44.3%和 34.9%。各地中央财政专项资金完成情况，见图 4。

图4 2013年中央财政水利专项投资完成率
(按地区分)

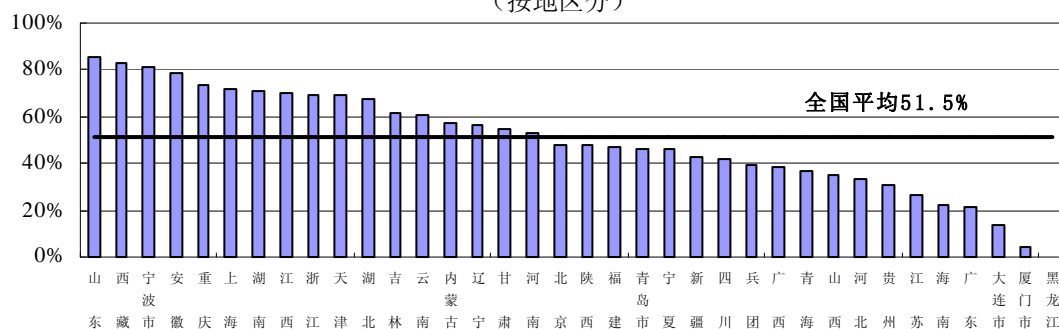

五、工程进展情况

2013年中央水利建设投资累计完成土方 12.4 亿立方米，石方 2.1 亿立方米，砼 2211.8 万立方米，金属结构 41.9 万吨。累计新建及加固堤防长度 4772 公里，清淤疏浚和岸线整治河道 4577 公里，治理水土流失面积 3066 平方公里。

发送：部领导，总工程师、总规划师，部有关司局、直属单位，国家发展改革委投资司、农经司，财政部经建司、农业司，监察部综合室，审计署投资司、农林水审计局，各省（区、市）、各计划单列市政府主管领导、水利（水务）厅（局），新疆兵团水利局。

共印 130 份
