

# 水利规划计划简报

(中央水利建设投资统计月报 2014-4)

2014 年第 13 期

水利部规划计划司

2014 年 5 月 6 日

2013 年累计安排中央水利建设投资计划 1408.3 亿元，纳入月报统计中央投资 1366.9 亿元（含黑龙江省涉农资金整合新增 26.4 亿元）。在纳入统计投资中，中央预算内投资计划 791.5 亿元，主要安排农村饮水安全 225.0 亿元、大中型病险水库（闸）除险加固 26.0 亿、灌区建设与节水改造 99.6 亿元、重大水利工程 441.0 亿元；中央财政水利专项资金预算 575.4 亿元，主要安排中小河流治理 206.7 亿元、小型病险水库除险加固 110.6 亿元、小型农田水利建设 226.8 亿元、水土保持 13.0 亿元，农村水电增效扩容 18.4 亿元。

截至 2014 年 4 月 30 日，中央水利建设投资累计下达项目单位计划 1348.1 亿元，累计拨付项目单位资金 1335.6 亿元，项目单位累计完成投资 1047.5 亿元，投资下达率、资金到位率、投资完成率分别为 98.6%、97.7%和 76.6%。分项目类型、分地区中央水利建设投资及配套投资的落实及完成情况详见附表 1、附表 2。

## 一、投资计划下达情况

2013 年中央预算内水利投资计划 791.5 亿元，要求地方配套投资 678.9 亿元。已下达项目单位中央投资 788.8 亿元、地方配套投资 706.2 亿元，投资计划下达率分别为 99.7%和 104.0%。在中央预算内水利投资计划中，农村饮水安全、大中型病险水库（闸）除险加固、灌区建设与节水改造和重大水利工程项目的下达率分别为 100%、100.0%、100.0%和 99.4%。

2013 年中央财政水利专项资金预算 575.4 亿元，已分解下达项目单位预算 559.3 亿元，预算分解下达率为 97.2%。其中，中小河流治理、小型病险水库除险加固、小型农田水利建设、水土保持和农村水电增效扩容改造项目的预算分解下达率分别为 99.7%、91.1%、98.0%、95.8%和 97.3%。

## 二、资金到位情况

2013 年中央预算内水利投资计划，已拨付项目单位中央投资 784.0 亿元、地方配套投资 580.0 亿元，到位率分别为 99.0%和 85.4%。在地方配套投资中，农村饮水安全、大中型病险水库（闸）除险加固、灌区建设与节水改造和重大水利工程项目分别拨付到位资金 110.0 亿元、11.9 亿元、37.1 亿元、421.0 亿元，到位率分别为 110.7%、85.3%、65.6%和 82.7%。中央预算内投资项目各地配套投资到位情况，见图 1。




个，累计开工 8218 个，开工率 85.2%。

#### 四、投资完成情况


2013 年中央预算内水利投资计划，已累计完成投资 1184.9 亿元。其中，中央投资 624.9 亿元，地方配套投资 559.9 亿元，完成率分别为 79.0%和 82.5%。在完成的中央投资中，农村饮水安全工程、大中型病险水库（闸）除险加固工程、灌区建设与节水改造工程、重大水利工程项目的完成率分别为 99.1%、85.0%、65.2%和 71.4%。各地中央预算内投资完成情况，见图 3。

图3 2013年中央预算内投资中央投资完成率  
(按地区分)

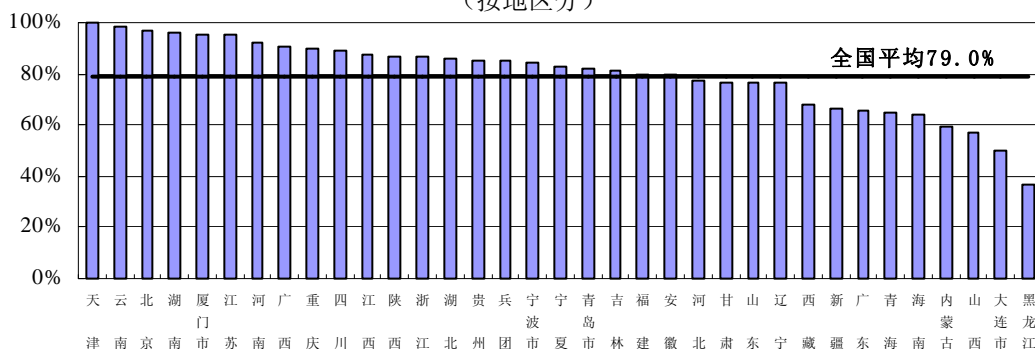

2013 年中央财政水利专项资金预算，已累计完成投资 675.8 亿元。其中，中央资金 422.6 亿元，地方配套资金 253.2 亿元，完成率分别为 73.4%和 76.2%。在完成的中央资金中，中小河流治理、小型病险水库除险加固、小型农田水利建设项目、水土保持和农村水电增效扩容项目的完成率分别为 84.0%、63.8%、68.4%、75.9%和 74.0%。各地中央财政专项资金完成情况，见图 4。

图4 2013年中央财政水利专项投资完成率  
(按地区分)

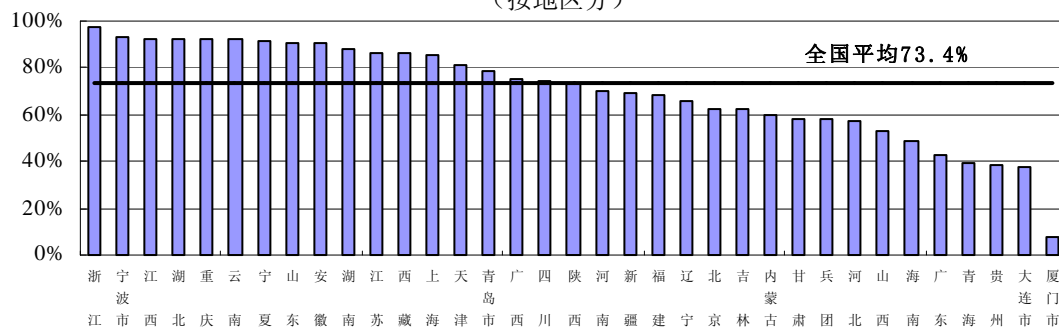

## 五、工程进展情况

2013年中央水利建设投资累计完成土方 15.7 亿立方米，石方 2.6 亿立方米，砼 3392.0 万立方米，金属结构 52.6 万吨。累计新建及加固堤防长度 6292 公里，清淤疏浚和岸线整治河道 6695 公里，治理水土流失面积 4547 平方公里。

---

**发送：**部领导，总工程师、总规划师，部有关司局、直属单位；国家发展改革委投资司、农经司；财政部经建司、农业司；监察部综合室；国家审计署投资司、农林水审计局；各省（自治区、直辖市）政府主管领导、水利（水务）厅（局），各计划单列市水利（水务）局，新疆生产建设兵团水利局。

---

共印 130 份
