

水利规划计划简报

(中央水利建设投资统计月报 2015-2)

2015 年第 9 期

水利部规划计划司

2015 年 3 月 5 日

截至 2015 年 1 月 31 日，2014 年已累计安排中央水利建设投资计划 1627.15 亿元，其中中央预算内水利建设投资计划 789.61 亿元，主要安排农村饮水安全工程 240.5 亿元、大中型病险水库（闸）除险加固 25 亿元、灌区建设与节水改造 100 亿元和重大水利工程 424.11 亿元；中央财政水利专项资金预算 837.53 亿元，主要安排中小河流治理 215 亿元、小型病险水库除险加固 113.0 亿元、小型农田水利建设 378.09 亿元、水土保持 18 亿元、农村水电增效扩容 50.06 亿元、山洪灾害防治 43 亿元、农业综合开发水土保持 6.36 亿元、中型灌区节水配套改造 14.02 亿元。

纳入月报统计的 2014 年中央水利建设投资 1603.76 亿元，不包括农业综合开发水土保持、中型灌区节水配套改造和下达农垦的小型农田水利建设等项目投资 23.39 亿元。截至 2015 年 2 月 28 日，累计下达项目单位投资计划 1586.1 亿元，累计拨付项目单位资金 1554.9 亿元，项目单位累计完成投资 1156.7 亿元，

投资下达率、资金到位率、投资完成率分别为 98.9%、97.0%和 72.1%。北京、内蒙古、黑龙江、海南、青海、宁夏、大连、厦门等地投资完成率低于 60%。分项目类型、分地区中央水利建设投资及配套投资的落实及完成情况详见附表 1、附表 2。

一、投资计划下达情况

2014 年中央预算内水利投资计划 789.6 亿元，要求地方配套投资 799.7 亿元。已下达项目单位中央投资 789.1 亿元、地方配套投资 853.2 亿元，投资计划下达率分别为 99.9%和 106.7%。在中央预算内水利投资计划中，农村饮水安全、大中型病险水库（闸）除险加固、灌区建设与节水改造和重大水利工程项目的下达率分别为 100%、100.7%、99.6%和 99.9%。

2014 年中央财政水利专项资金预算 814.2 亿元，要求地方配套投资 364.3 亿元。已分解下达项目单位中央财政水利专项资金预算 796.9 亿元，预算分解下达率为 97.9%。其中，中小河流治理、小型病险水库除险加固、小型农田水利建设、水土保持、农村水电增效扩容改造和山洪灾害防治项目的预算分解下达率分别为 100.0%、94.0%、98.0%、99.1%、97.3%和 91.3%。

二、资金到位情况

2014 年中央预算内水利建设投资计划，已拨付项目单位中央投资 778.5 亿元、地方配套投资 658.9 亿元，到位率分别为 98.6%和 82.4%。

在地方配套投资中，农村饮水安全、大中型病险水库（闸）


三、项目开工情况

2014 年中央水利投资计划已分解落实水利建设项目 15489 个，其中中央预算内水利投资计划 5038 个，累计开工 4486 个，开工率 89.0%；中央财政水利专项资金预算 10451 个，累计开工 8865 个，开工率 84.8%。

四、投资完成情况

2014 年中央预算内水利投资计划，已累计完成投资 1215.0 亿元。其中，中央投资 628.7 亿元，地方配套投资 586.3 亿元，完成率分别为 79.6%和 73.3%。在完成的中央投资中，农村饮水安全工程、大中型病险水库（闸）除险加固工程、灌区建设与节水改造工程、重大水利工程项目的完成率分别为 97.7%、75.7%、54.1%和 75.6%。各地中央预算内投资完成情况，见图 3。

图3 2014年中央预算内投资中央投资完成率
(按地区分)

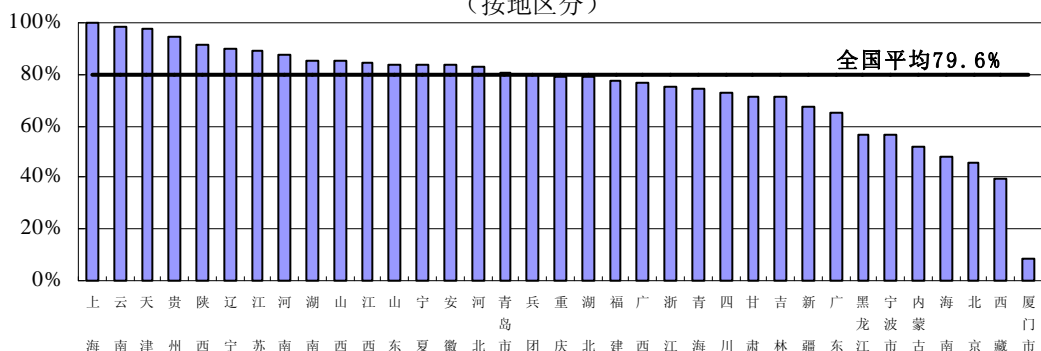

2014 年中央财政水利专项资金预算，已累计完成投资 778.3 亿元。其中，中央资金 527.9 亿元，地方配套资金 250.4 亿元，完成率分别为 64.8%和 68.7%。在完成的中央资金中，中小河流治理、小型病险水库除险加固、小型农田水利建设项目、水土保

发送：部领导，总工程师、总规划师，部有关司局、直属单位，国家发展改革委投资司、农经司，财政部经建司、农业司，监察部综合室，审计署投资司、农林水审计局，各省（区、市）、各计划单列市政府主管领导、水利（水务）厅（局），新疆兵团水利局。

共印 130 份
