

# 水利规划计划简报

(中央水利建设投资统计月报 2015-4)

2015 年第 18 期

水利部规划计划司

2015 年 5 月 11 日

## 一、2014 年中央水利建设投资情况

2014 年共安排中央水利建设投资计划 1627.15 亿元，纳入月报统计的 2014 年中央水利建设投资 1604.55 亿元（不包括农业综合开发水土保持、中型灌区节水配套改造和下达农垦的小型农田水利建设等项目投资 23.39 亿元，黑龙江投资经整合进行了调整）。截至 2015 年 4 月 30 日，累计下达项目单位投资计划 1600.7 亿元，累计拨付项目单位资金 1577.8 亿元，项目单位累计完成投资 1347.9 亿元，投资下达率、资金到位率、投资完成率分别为 99.8%、98.3%和 84.0%。分项目类型、分地区中央水利建设投资及配套投资的落实及完成情况详见附表 1、附表 2。

### (一) 投资计划下达情况

2014 年中央预算内水利投资计划 792.1 亿元，要求地方配套投资 799.7 亿元。已下达项目单位中央投资 791.7 亿元、地方配套投资 857.0 亿元，投资计划下达率分别为 99.95%和 107.2%。

在中央预算内水利投资计划中，农村饮水安全、大中型病险水库（闸）除险加固、灌区建设与节水改造和重大水利工程项目的下达率分别为 100%、100%、100%和 99.9%。

2014 年中央财政水利专项资金预算 812.5 亿元，要求地方配套投资 375.7 亿元。已分解下达项目单位中央财政水利专项资金预算 809.0 亿元，预算分解下达率为 99.6%。其中，中小河流治理、小型病险水库除险加固、小型农田水利建设、水土保持、农村水电增效扩容改造和山洪灾害防治项目的预算分解下达率分别为 100%、98.2%、99.9%、100%、99.6%和 98.5%。

## （二）资金到位情况


2014 年中央预算内水利建设投资计划，已拨付项目单位中央投资 783.0 亿元、地方配套投资 683.1 亿元，到位率分别为 98.9%和 85.4%。

在地方配套投资中，农村饮水安全、大中型病险水库（闸）除险加固、灌区建设与节水改造和重大水利工程项目分别拨付到位资金 116.1 亿元、15.3 亿元、49.5 亿元和 502.3 亿元，到位率分别为 117.0%、90.0%、73.3%和 81.5%。中央预算内投资项目各地配套投资到位情况，见图 1。





图4 2014年中央财政水利专项投资完成率  
(按地区分)

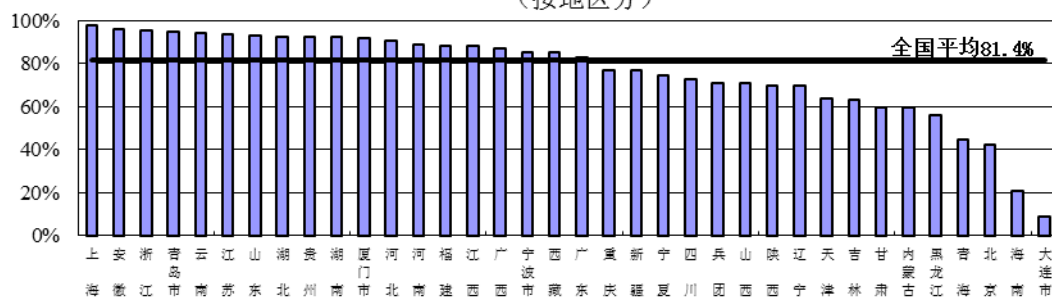

### (五) 工程进展情况

2014年中央水利建设投资累计完成土方19.1亿立方米，石方5.7亿立方米，砼4573.1万立方米，金属结构62.2万吨。累计新建及加固堤防长度5403公里，清淤疏浚和岸线整治河道7398公里，治理水土流失面积4924平方公里。

## 二、2015年中央水利建设投资情况

截至2015年4月30日，2015年已累计安排中央水利建设投资计划1123.54亿元，各地已纳入月报统计的647.4亿元，其中中央预算内水利建设投资计划311.11亿元，主要安排农村饮水安全工程267.50亿元，大中型病险水库（闸）除险加固工程0.5亿元，江河治理8.4亿元，枢纽水源28.7亿元，水土保持及生态0.4亿元，行业能力建设5.5亿元；中央财政水利专项资金预算336.33亿元，主要安排江河湖库水系综合整治146.67亿元（其中抗旱规划小水库建设50亿元、新出险小水库除险加固45.99亿元、中小河流治理50.68亿元），小型农田水利131.57亿元，水土保持18亿元，山洪灾害40.09亿元。

根据全国上报数据，2015 年累计分解下达中央投资计划和地方配套投资计划分别为 474.1 亿元和 195.2 亿元，中央投资计划分解下达率为 73.2%；中央投资计划已完成 75.6 亿元，完成率为 11.7%。分项目类型、分地区中央水利建设投资及配套投资的落实及完成情况详见附表 3、附表 4。
