

# 水利规划计划简报

(中央水利建设投资统计月报 2016-7)

2016 年第 29 期

水利部规划计划司

2016 年 8 月 10 日


截至 2016 年 7 月 31 日，2016 年已累计安排中央水利建设投资 1374.4 亿元，其中中央预算内水利建设投资 776.9 亿元，主要安排重大水利工程 561.0 亿元，农村饮水安全 30.0 亿元，大中型病险水库（闸）除险加固 25.0 亿元，水土保持和生态建设 17.8 亿元，中型水库等 62.0 亿元，主要支流治理 55.0 亿元，大型灌排泵站更新改造 7.0 亿元，农村小水电 3.0 亿元，行业能力建设 16.1 亿元；中央财政水利专项资金 597.5 亿元，主要安排江河湖库水系综合整治 185.0 亿元、小型农田水利 364.5 亿元、水土保持 33.0 亿元和山洪灾害防治 15.0 亿元。

中央投资地方已累计分解下达 1345.1 亿元、累计拨付项目单位资金 1124.6 亿元、累计完成投资 616.5 亿元，中央投资分解下达率、资金到位率、投资完成率分别为 97.9%、81.8%和 44.9%。分项目类型、分地区中央水利建设投资及配套投资的落实及完成情况详见附表 1、附表 2。

## 一、投资计划分解下达情况

2016年已安排中央水利建设投资计划2158.6亿元，其中，中央投资1374.4亿元，地方配套投资784.2亿元。截至2016年7月31日，各地已分解下达到项目单位年度中央投资计划2120.5亿元，投资计划分解下达率98.2%，其中中央投资下达率为97.9%（分地区见图1）。

图1 2016年中央投资下达率  
(按地区分)

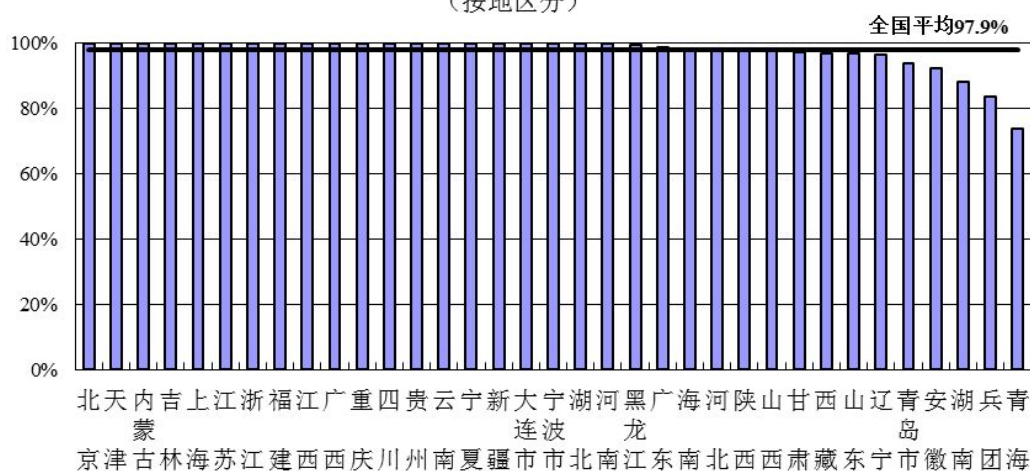

1. 中央预算内投资。2016年已安排中央预算内水利投资计划1400.6亿元（中央投资776.9亿元，地方配套投资623.7亿元），地方已分解下达1380.4亿元，分解下达率98.6%。其中，中央投资已分解下达765.3亿元，分解下达率98.5%；地方配套投资已分解下达615.1亿元，分解下达率98.6%。

其中，重大水利工程已安排年度中央水利投资计划991.9亿元（中央投资561.0亿元，地方配套投资430.9亿元），地方已分解下达990.0亿元，分解下达率99.8%。

2. 中央财政专项资金。2016年中央财政水利专项资金预算

758.0 亿元（中央资金 597.5 亿元，地方配套资金 160.5 亿元），已分解下达 740.2 亿元，分解下达率 97.6%。其中，中央资金已分解下达 579.9 亿元，分解下达率 97.0%；地方配套资金已分解下达 160.3 亿元，分解下达率 99.9%。从项目类别看，江河湖库水系综合整治、小型农田水利、水土保持和山洪灾害防治项目中央资金分解下达率分别为 95.9%、97.5%、97.7%和 99.1%。

## **二、资金到位情况**

2016 年中央水利建设年度投资计划已拨付项目单位 1664.3 亿元，资金到位率 77.1%。其中，中央投资到位 1124.6 亿元，到位率 81.8%；地方配套投资到位 539.7 亿元，到位率 68.8%。

**1. 中央预算内投资。**2016 年中央预算内水利投资计划已拨付项目单位 984.2 亿元，资金到位率 70.3%。其中中央投资到位 580.9 亿元，到位率 74.8%；地方配套投资到位 403.3 亿元，到位率 64.7%。

重大水利工程投资已到位 723.8 亿元，资金到位率 73.0%。其中，中央投资到位 425.4 亿元，到位率 75.8%；地方配套投资到位 298.5 亿元，到位率 69.3%。

**2. 中央财政专项资金。**2016 年中央财政水利专项资金预算已拨付项目单位 680.1 亿元，资金到位率 89.7%。其中，中央资金到位 543.7 亿元，到位率 91.0%；地方配套资金到位 136.4 亿元，到位率 85.0%。从项目类别看，江河湖库水系综合整治、小型农田水利、水土保持和山洪灾害防治项目中央资金到位率分别

为 88.9%、92.8%、81.4%和 95.1%。


### 三、项目开工情况

2016 年中央水利投资计划已分解落实水利建设项目 10674 个，较上月增加 1296 个，工程开工率 79.4%，较上月增加 4.7 个百分点。其中中央预算内水利投资计划项目 1950 个，累计开工 1059 个，开工率 54.3%；中央财政水利专项资金预算项目 8724 个，累计开工 7417 个，开工率 85.0%。

### 四、投资完成情况

已累计完成 2016 年中央水利建设投资计划 904.0 亿元，完成率 41.9%。其中，完成中央投资 616.5 亿元，完成率 44.9%；完成地方配套投资 287.5 亿元，完成率 36.7%。当月完成中央投资计划 246.8 亿元，较上月减少 40.1 亿元。

图2 2016年中央投资完成率  
(按地区分)

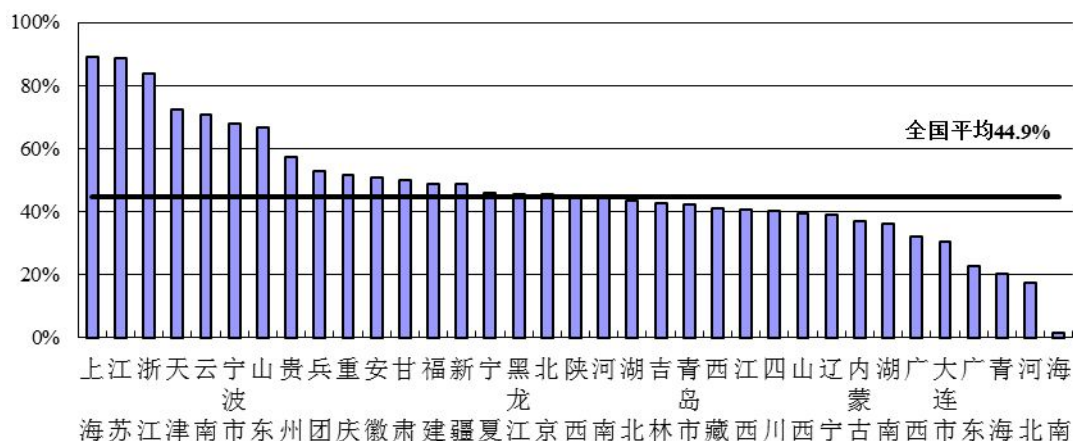

重大水利工程已完成年度中央水利投资计划 413.1 亿元，投资完成率为 41.7%。其中，完成中央投资 270.3 亿元，完成率 48.2%；完成地方配套投资 142.9 亿元，完成率 33.2%。从工程类别看，大中型灌区续建配套、重大引调水工程、重点水源工程、江河湖泊治理骨干工程、新建灌区工程及其他工程中央投资完成率分别为 24.3%、59.9%、49.1%、54.6%、49.8%和 44.7%。

**2. 中央财政专项资金。**已累计完成中央财政水利专项资金预算 341.6 亿元，完成率 45.1%。其中，完成中央资金 274.9 亿元，完成率 46.0%；完成地方配套资金 66.7 亿元，完成率 41.6%。从项目类别看，江河湖库水系综合整治、小型农田水利、水土保持和山洪灾害防治项目的中央资金完成率分别为 48.8%、45.9%、29.8%和 50.9%。
