

# 2009 年中央水利投资计划落实情况

# 旬报

第 16 期

水利部规划计划司

2009 年 10 月 13 日

## 一、投资计划下达情况

2009 年已累计安排中央水利建设投资计划共计 435.03 亿元（不含南水北调 45 亿元），其中包括 2009 年新增中央水利预算内投资计划（以下简称第二批投资）140 亿元，扩大内需第三批中央水利建设投资计划（以下简称第三批投资）180 亿元以及扩大内需第四批中央预算内投资计划（以下简称第四批投资）115.03 亿元，分别累计投入农村饮水安全工程、大中型病险水库除险加固工程、大型灌区续建配套与节水改造工程和重大水利项目 152 亿元、88 亿元、32 亿元和 163.03 亿元。截至 2009 年 9 月 30 日，各省（区、市）已下达到项目单位的中央投资计划 428.7 亿元：其中第二、三批中央投资计划 320 亿元已全部下达；第四批投资计划已下达 108.7 亿元，占投资计划的 94.5%。

按工程类型分，农村饮水安全、大中型病险水库除险加固工程、大型灌区续建配套与节水改造工程和重大水利项目分别有 152.00 亿元、88.00 亿元、27.14 亿元和 161.56 亿元的投资下

达到项目单位，下达率分别为 100%、100%、84.8%和 99.1%（见表 1）。

表 1 2009 年新增中央水利投资计划下达情况  
(分批次分工程类型)

| 工程类型          | 09 年累计安排中央水利投资计划 (亿元) | 投资计划下达比例 |       |       |       |
|---------------|-----------------------|----------|-------|-------|-------|
|               |                       | 累计       | 其中    |       |       |
|               |                       |          | 第二批计划 | 第三批计划 | 第四批计划 |
| 合计            | 435.03                | 98.5%    | 100%  | 100%  | 94.5% |
| 农村饮水安全        | 152                   | 100%     | 100%  | 100%  | —     |
| 大中型病险水库除险加固   | 88                    | 100%     | —     | 100%  | —     |
| 大型灌区续建配套与节水改造 | 32                    | 84.8%    | —     | —     | 84.8% |
| 重大水利项目        | 163.03                | 99.1%    | 100%  | —     | 98.2% |

第二、第三批中央水利建设投资要求地方配套共计 223.4 亿元（包括银行贷款）。截至 9 月 30 日，各省（区、市）已下达地方配套投资计划 220.2 亿元，占要求配套的 98.6%。计划未全部下达的有湖北、山东、山西、青海和新疆。截至 9 月 30 日，各直属单位、省（区、市）已下达第四批中央水利建设投资地方配套投资计划 81.98 亿元，占要求配套的 75.3%。

## 二、资金到位情况

截至 9 月 30 日，第二、第三批投资已拨付项目单位中央投资 317.1 亿元，拨付率为 99.1%（见图 1）。中央投资未全部拨付的有四川、甘肃、陕西、青海、河南和兵团。




### 三、前期工作和开工情况

2009 年中央水利投资计划各地已分解落实水利建设项目 4478 个，其中第二、第三批投资项目 3322 个，第四批 1156 个。

1、项目开工情况。截至 9 月 30 日，第二、第三批水利投资计划项目中，全国已有 2924 个项目开工建设，开工率为 88.0%，涉及计划总投资 485.1 亿元，其中中央投资 286.2 亿元，占计划的 89.4%。开工率低于 80% 的有河北、广东、四川、湖北、吉林、广西和海南等省区（见图 3）。全国已有 276 个项目完工，涉及的中央投资计划为 17.0 亿元。第四批投资全国已有 238 个项目开工建设，开工率为 20.6%；已有 27 个项目完工。

2、前期工作情况。根据已报送的数据，第二、第三批投资已有 2813 个项目完成初步设计或实施方案的编写或审查工作；2239 个项目完成技施设计；当前报送需开展招标的标段（标的）11160 个，已完成 8503 个，已完成招标投资 199.3 亿元，占需招标投资的 69.0%；1430 个项目完成设备采购合同。第四批投资已有 658 个项目完成初步设计或实施方案的编制或审查工作；370 个项目完成技施设计；156 个项目完成设备采购合同；已完成招标投资 19.1 亿元。


图3 2009年第二、三批新增水利投资开工率  
(按地区分)

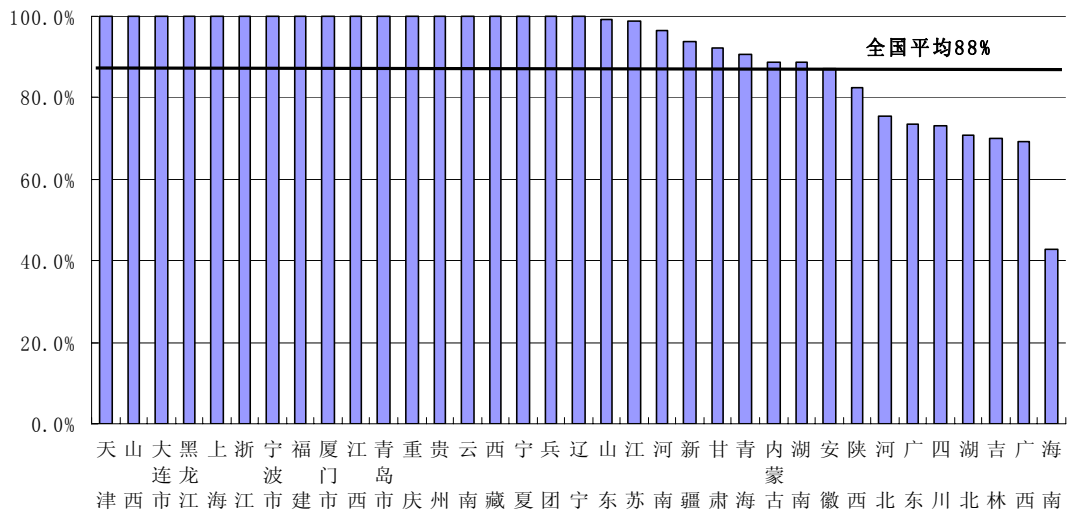

### 四、投资完成情况

截至9月30日，第二、第三批投资已累计完成184.3亿元，其中中央投资122.7亿元，地方配套投资61.6亿元，完成率分别为38.3%（见图4）和27.6%。

图4 第二、三批新增中央水利投资完成率  
(按地区分)

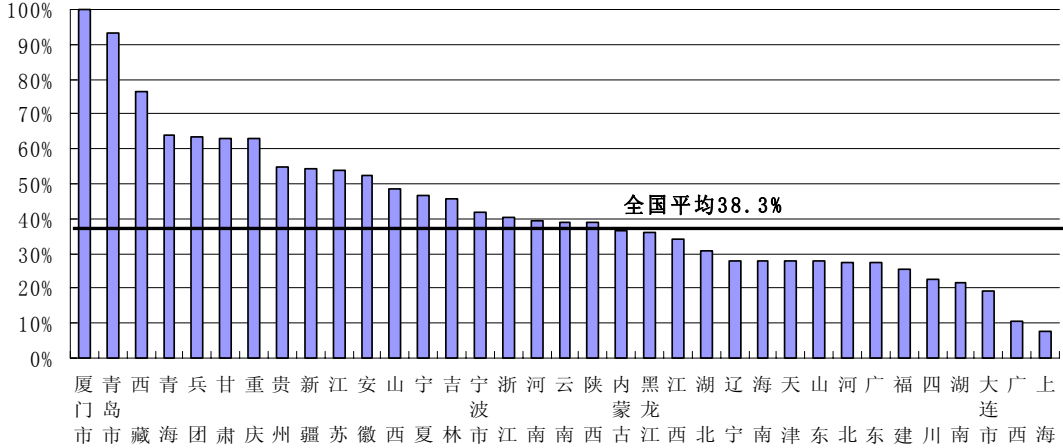

在完成的中央投资中，农村饮水安全项目76.2亿元，占计划的50.1%；重大水利项目31.7亿元，占计划的39.6%；大中型病险水库除险加固工程14.8亿元，占计划的16.8%。第四批投

资计划已累计完成中央投资 4.88 亿元，占计划的 4.2%；完成地方配套 6.85 亿元，占计划的 6.3%。

## 五、工程进展情况

第二、第三批投资已开工项目累计投入劳动力 5765.7 万工日，累计完成土方 28238.7 万方，石方 2315.0 万方，砼 395.8 万方，金属结构 14.4 万吨。已解决农村饮水安全人口 1865.1 万人，累计新建及加固堤防长度 339.9 公里，河道清淤疏浚和岸线整治 25.5 公里，累计治理水土流失面积 1318.8 平方公里。第四批投资已开工项目累计投入劳动力 220.5 万工日，累计完成土方 614.3 万方，石方 258.8 万方，砼 23.6 万方，金属结构 1.6 万吨。

## 六、有关要求

根据《国家发展改革委扩大内需中央投资项目情况通报》第 9 号有关要求，请部直属有关单位和有关省（区、市）、计划单列市和兵团水利部门，进一步加大协调力度，切实解决影响项目开工的关键性问题，多渠道筹集水利建设资金，尽快全部开工建设扩大内需第二、三批水利投资建设项目并将地方配套资金全部落实到位，同时确保扩大内需第四批水利投资建设项目在 10 月底前 100%开工、地方配套资金 100%到位、查出问题 100%整改到位。

---

发送：部领导，总工程师、总规划师、副总工程师，部有关司局、直属单位；国家发展改革委投资司、农经司；监察部综合室；国家审计署投资司、农林水审计局；有关省（自治区、直辖市）政府主管领导、水利（水务）厅（局），有关计划单列市水利（水务）局，新疆生产建设兵团水利局。

---

共印 150 份
