

2009 年中央水利投资计划落实情况

旬报

第 17 期

水利部规划计划司

2009 年 10 月 27 日

一、投资计划下达情况

2009 年已累计安排中央水利建设投资计划共计 435.03 亿元（不含南水北调 45 亿元），其中包括 2009 年新增中央水利预算内投资计划（以下简称第二批投资）140 亿元，扩大内需第三批中央水利建设投资计划（以下简称第三批投资）180 亿元以及扩大内需第四批中央预算内投资计划（以下简称第四批投资）115.03 亿元，分别累计投入农村饮水安全工程、大中型病险水库除险加固工程、大型灌区续建配套与节水改造工程和重大水利项目 152 亿元、88 亿元、32 亿元和 163.03 亿元。截至 2009 年 10 月 20 日，各省（区、市）已下达到项目单位的中央投资计划 432.2 亿元：其中第二、三批中央投资计划 320 亿元已全部下达；第四批投资计划已下达 112.2 亿元，占投资计划的 97.5%。

第四批投资计划按工程类型分，大型灌区续建配套与节水改造工程和重大水利项目分别有 31.8 亿元和 80.4 亿元的投资下达到项目单位，下达率分别为 99.4%和 96.8%（见表 1）。

表 1 第四批新增中央水利投资计划下达情况

(分批次分工程类型)


工程类型	09年累计安排中央水利投资计划(亿元)	累计下达投资	投资计划下达比例
合计	115.03	112.15	97.5%
大型灌区续建配套与节水改造	32	31.80	99.4%
重大水利工程	83.03	80.35	96.8%
农村小水电	6	5.99	99.8%
血防	2	1.93	96.3%
石羊河治理	8	8	100.0%
首都水资源	1	1	100.0%
丹江口水土保持	6	6	100.0%
其他重大水利项目	60.03	57.44	95.7%

第二、第三批中央水利建设投资要求地方配套共计 223.4 亿元(包括银行贷款)。截至 10 月 20 日,各省(区、市)已下达地方配套投资计划 221.9 亿元,占要求配套的 99.3%。计划未全部下达的有山东、青海、山西和新疆。截至 10 月 20 日,各直属单位、省(区、市)已下达第四批中央水利建设投资地方配套投资计划 89.10 亿元,占要求配套的 81.8%。计划下达率低于 80% 的有新疆、青海、云南、江苏、贵州、山西、河南和湖北。

二、资金到位情况


截至 10 月 20 日,第二、第三批投资已拨付项目单位中央投资 319.94 亿元,拨付率为 99.98%,甘肃省中央投资尚未全部拨付。第二、第三批地方配套投资已拨付项目单位 186.9 亿元,拨付率为 83.7%(见图 1),其中省级配套投资 87.7 亿元,地县级配套投资 73.7 亿元,其他配套投资 25.5 亿元。

图1 第二、三批新增水利投资地方配套投资拨付率
(按地区分)

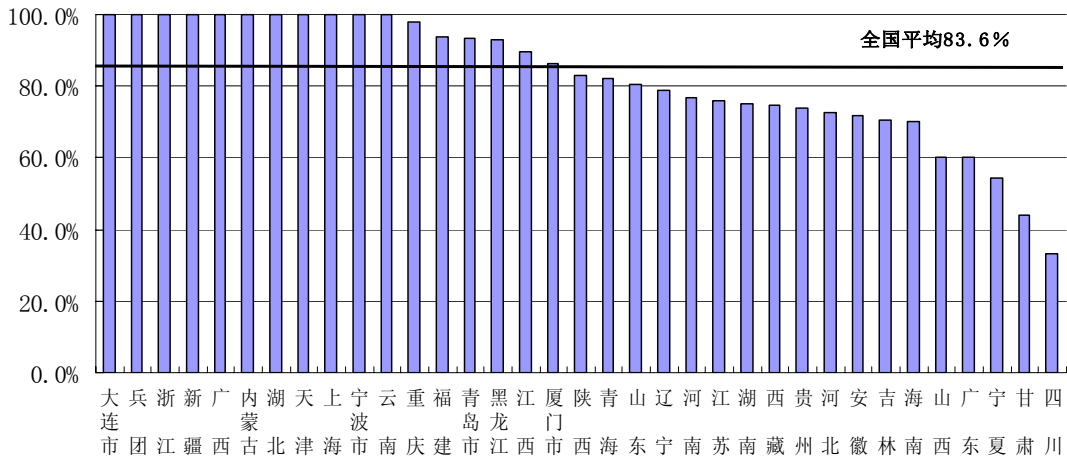

第四批投资，各直属单位、省（区、市）已拨付项目单位中央投资 79.3 亿元，拨付率为 68.9%；已拨付地方配套投资 42.3 亿元，拨付率为 38.9%（见图 2）。

图2 第四批新增水利投资拨付情况
(分地区)

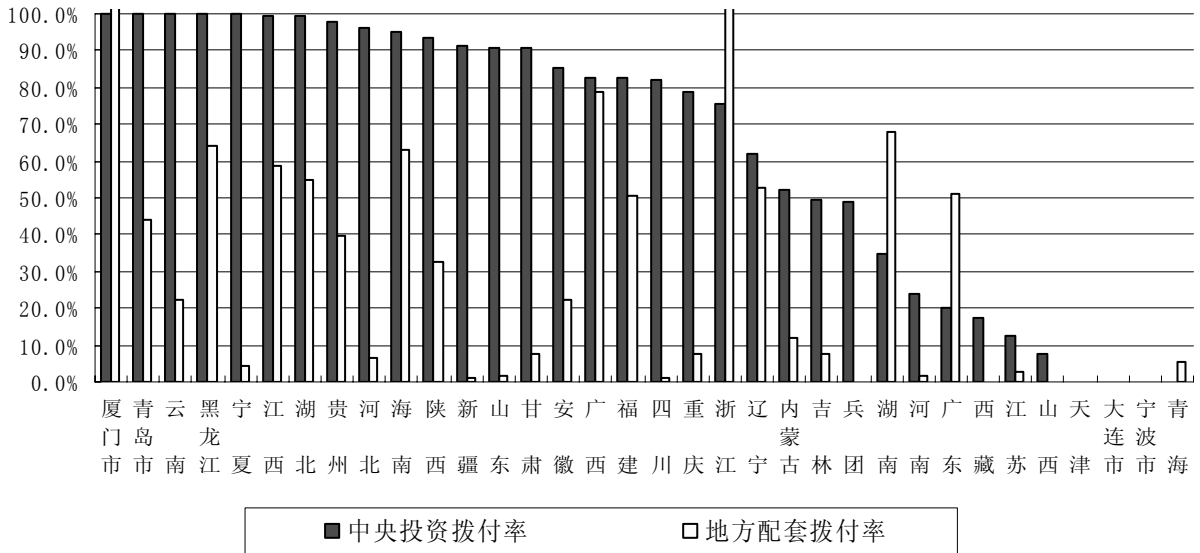


三、前期工作和开工情况

2009 年中央新增水利投资计划各地已分解落实水利建设项目 4685 个，其中第二、第三批水利投资计划项目 3326 个，第四批 1359 个。

1、项目开工情况。截至10月20日，第二、第三批水利投资计划项目中，全国已有3114个项目开工建设，开工率为93.6%，涉及计划总投资513.2亿元，其中中央投资304.32亿元，占计划的95.1%。开工率低于90%的有广西、内蒙古、吉林、陕西、四川、兵团、广东和海南等省区(见图3)。全国已有343个项目完工，涉及的中央投资计划为21.5亿元。第四批水利投资计划项目中，全国已有446个项目开工建设，开工率为32.8%；已有39个项目完工。

图3 2009年第二、三批新增水利投资开工率
(按地区分)

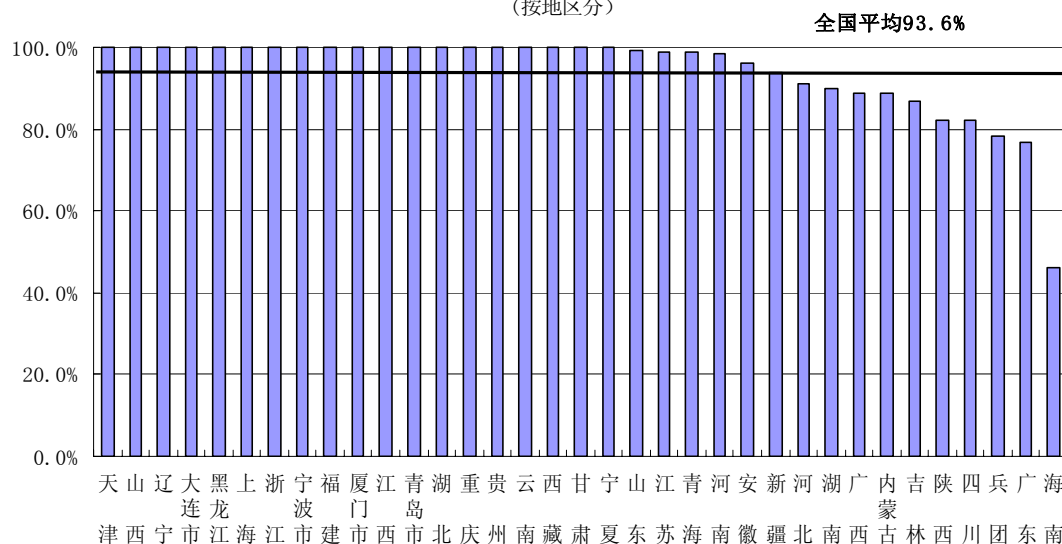


2、前期工作情况。根据已报送的数据，第二、第三批投资已有2874个项目完成初步设计或实施方案的编写或审查工作；2299个项目完成技施设计；当前报送需开展招标的标段（标的）11160个，已完成9117个，已完成招标投资213.2亿元，占需招标投资的74.8%；1659个项目完成设备采购合同。第四批投资已有817个项目完成初步设计或实施方案的编制或审查工作；

515 个项目完成技施设计；187 个项目完成设备采购合同；已完成招标投标投资 37.1 亿元。

四、投资完成情况

截至 10 月 20 日，第二、第三批投资已累计完成 222.6 亿元，其中，中央投资 147.3 亿元，地方配套投资 75.3 亿元，投资计划完成率分别为 46.0%（见图 4）和 33.7%。在完成的中央投资中，农村饮水安全项目 89.1 亿元，占计划的 58.6%；重大水利项目 37.0 亿元，占计划的 46.3%；大中型病险水库除险加固工程 21.1 亿元，占计划的 24.0%。

图4 第二、三批新增中央水利投资完成率
(按地区分)

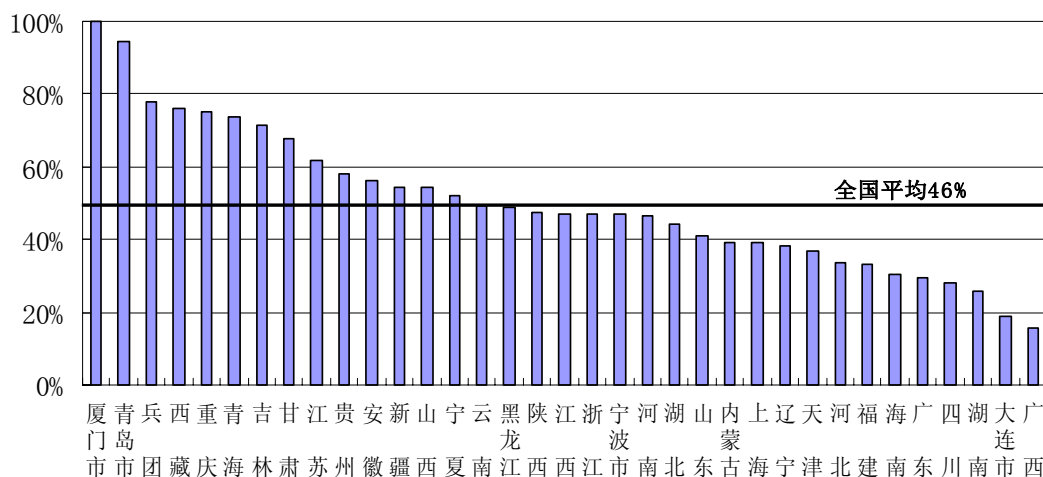

第四批水利投资计划已累计完成 29.6 亿元，其中，中央投资 15.4 亿元，地方配套投资 14.2 亿元，投资计划完成率分别为 13.4%和 13.0%。

五、工程进展情况

第二、第三批水利投资计划已开工项目累计投入劳动力 7640 万工日,累计完成土方 33955.9 万方,石方 3549.0 万方,砼 451.7 万方,金属结构 16.5 万吨。已解决农村饮水安全人口 2068.5 万人,累计新建及加固堤防长度 356.6 公里,河道清淤疏浚和岸线整治 32.7 公里,累计治理水土流失面积 1513.9 平方公里。第四批水利投资计划已开工项目累计投入劳动力 477.9 万工日,累计完成土方 1718.0 万方,石方 294.9 万方,砼 58.6 万方,金属结构 2.1 万吨。

发送：部领导，总工程师、总规划师、副总工程师，部有关司局、直属单位；国家发展改革委投资司、农经司；监察部综合室；国家审计署投资司、农林水审计局；有关省（自治区、直辖市）政府主管领导、水利（水务）厅（局），有关计划单列市水利（水务）局，新疆生产建设兵团水利局。

共印 150 份
