

2009 年中央水利投资计划落实情况

旬报

第 19 期

水利部规划计划司

2009 年 11 月 18 日

一、投资计划下达情况

2009 年已累计安排中央水利建设投资计划共计 435.03 亿元（不含南水北调 45 亿元），其中包括 2009 年新增中央水利预算内投资计划（以下简称第二批投资）140 亿元，扩大内需第三批中央水利建设投资计划（以下简称第三批投资）180 亿元以及扩大内需第四批中央预算内投资计划（以下简称第四批投资）115.03 亿元，分别累计投入农村饮水安全工程、大中型病险水库除险加固工程、大型灌区续建配套与节水改造工程和重大水利项目 152 亿元、88 亿元、32 亿元和 163.03 亿元。截至 2009 年 11 月 10 日，各省（区、市）已下达到项目单位的中央投资计划 434.06 亿元：其中第二、三批中央投资计划 320 亿元已全部下达；第四批投资计划已下达 114.06 亿元，占投资计划的 99.6%（不含西藏一江两河专项非水利部门实施项目投资 0.5 亿元）。

第四批投资计划按工程类型分，大型灌区续建配套与节水改造工程和重大水利项目分别有 32.0 亿元和 82.1 亿元的投资下达

到项目单位，下达率分别为 100%和 99.4%。（见表 1）

表 1 第四批新增中央水利投资计划下达情况

（分批次分工程类型）


工程类型	09 年累计安排中央水利投资计划（亿元）	累计下达投资	投资计划下达比例
合计	115.03	114.06	99.6%
大型灌区续建配套与节水改造	32.00	32.00	100.0%
重大水利工程	83.03	82.06	99.4%
农村小水电	6.00	5.99	99.8%
血防	2.00	1.93	96.5%
石羊河治理	8.00	8.00	100.0%
首都水资源	1.00	1.00	100.0%
丹江口水土保持	6.00	6.00	100.0%
其他重大水利项目	60.03	59.15	99.4%

第二、第三批中央水利建设投资要求地方配套共计 225.0 亿元（包括银行贷款）。截至 11 月 10 日，各省（区、市）已下达地方配套投资计划 224.6 亿元，占要求配套的 99.8%。计划未全部下达的有山东、青海、和新疆。截至 11 月 10 日，各直属单位、省（区、市）已下达第四批中央水利建设投资地方配套投资计划 104.3 亿元，占要求配套的 96.2%。计划下达率低于 90%的有河南、西藏、贵州、新疆和青海。

二、资金到位情况


截至 11 月 10 日，第二、第三批中央投资 320 亿元已全部拨付项目单位。第二、第三批地方配套投资已拨付项目单位 194.4 亿元，拨付率为 86.4%（见图 1），其中省级配套投资 90.6 亿元，地县级配套投资 76.9 亿元，其他配套投资 26.9 亿元。

图1 第二、三批新增水利投资地方配套投资拨付率

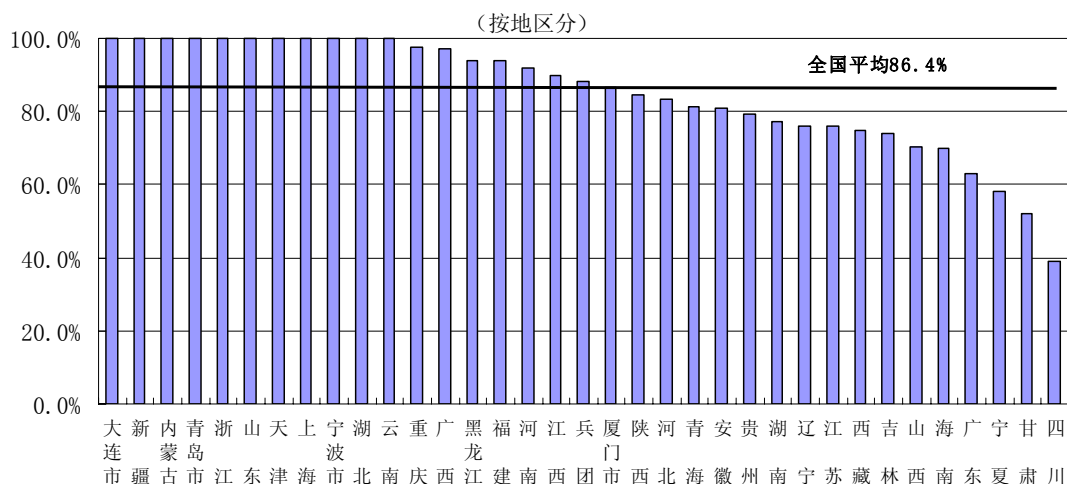

第四批投资，各直属单位、省（区、市）已拨付项目单位中央投资 91.6 亿元，拨付率为 80.0%（见图 2）。已拨付地方配套投资 47.0 亿元，拨付率为 43.4%。

图2 第四批新增水利投资拨付情况

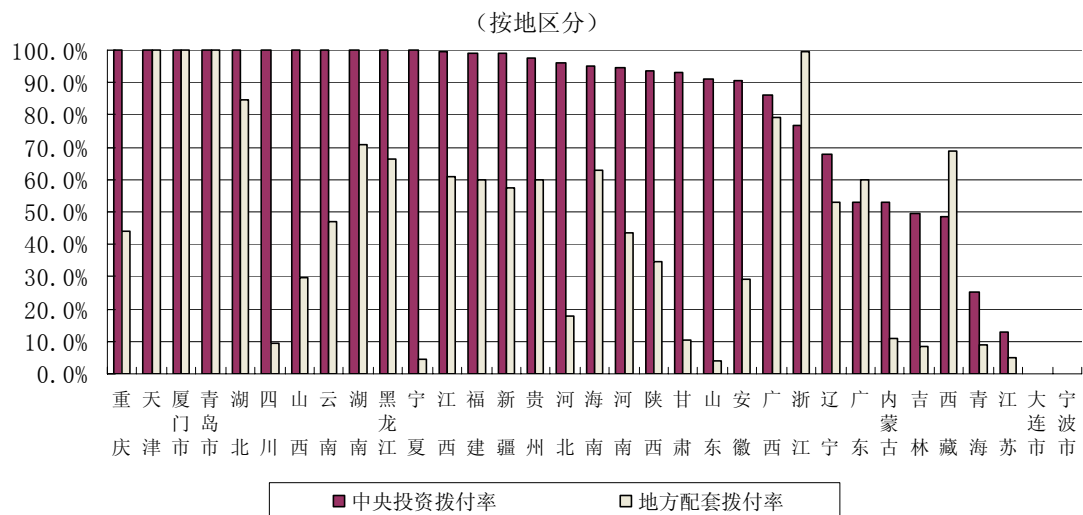


三、前期工作和开工情况

2009 年中央新增水利投资计划各地已分解落实水利建设项目 4823 个，其中第二、第三批水利投资计划项目 3322 个，第四批 1501 个。

1、项目开工情况。截至11月10日，第二、第三批水利投资计划项目中，全国已有3203个项目开工建设，开工率为96.4%（见图3），涉及计划总投资523.6亿元，其中中央投资310.4亿元，占计划的97.0%。全国已有534个项目完工，涉及的中央投资计划为33.3亿元。第四批水利投资计划项目中，全国已有812个项目开工建设，开工率为54.1%；已有86个项目完工。

图3 2009年第二、三批新增水利投资开工率
（按地区分）

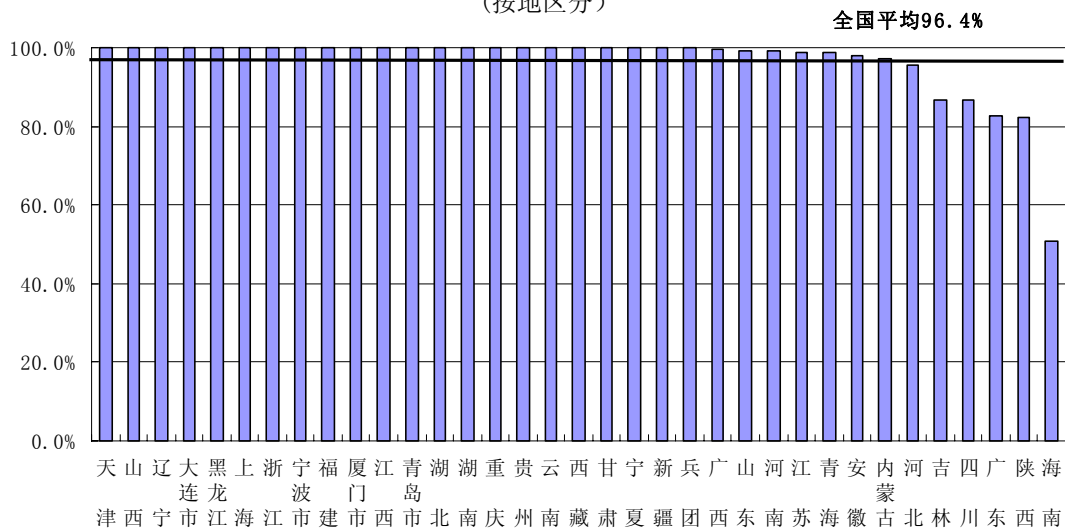


2、前期工作情况。根据已报送的数据，第二、第三批投资已有2891个项目完成初步设计或实施方案的编写或审查工作；2321个项目完成技施设计；当前报送需开展招标的标段（标的）12041个，已完成9571个，已完成招标投资218.4亿元，占需招标投资的74.5%；1740个项目完成设备采购合同。第四批投资已有884个项目完成初步设计或实施方案的编制或审查工作；564个项目已完成技施设计；223个项目完成设备采购合同；已完成招标投资35.3亿元。

四、投资完成情况

截至11月10日，第二、第三批投资已累计完成277.3亿元，其中，中央投资184.7亿元，地方配套投资92.6亿元，投资计划完成率分别为57.7%（见图4）和41.2%。在完成的中央投资中，农村饮水安全项目完成投资108.0亿元，占计划的71.0%；重大水利项目完成投资43.4亿元，占计划的54.3%；大中型病险水库除险加固工程完成投资33.3亿元，占计划的37.8%。

第四批水利投资计划已累计完成51.9亿元，其中，中央投资29.0亿元，地方配套投资22.9亿元，投资计划完成率分别为25.3%和21.1%。在完成的中央投资中，大型灌区续建配套与节水改造5.8亿元，占计划的18.0%；重大水利工程23.2亿元，占计划的28.2%。

图4 第二、三批新增中央水利投资完成率
(按地区分)

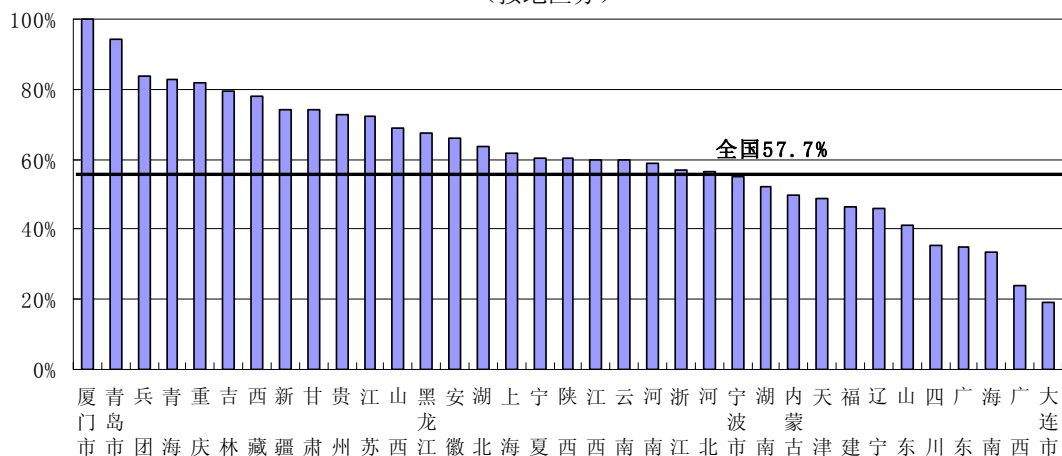

五、工程进展情况

第二、第三批水利投资计划已开工项目累计投入劳动力9589.6万工日，累计完成土方43992.1万方，石方4984.0万方，

砼 548.4 万方，金属结构 21.7 万吨。已累计新建及加固堤防长度 356.6 公里，河道清淤疏浚和岸线整治 36.5 公里，累计治理水土流失面积 1968.6 平方公里。第四批水利投资计划已开工项目累计投入劳动力 1422.1 万工日，累计完成土方 3769.3 万方，石方 482.6 万方，砼 76.9 万方，金属结构 2.7 万吨。

发送：部领导，总工程师、总规划师、副总工程师，部有关司局、直属单位；国家发展改革委投资司、农经司；监察部综合室；国家审计署投资司、农林水审计局；有关省（自治区、直辖市）政府主管领导、水利（水务）厅（局），有关计划单列市水利（水务）局，新疆生产建设兵团水利局。

共印 150 份
