

# 2009 年中央水利投资计划落实情况

# 旬报

第 20 期

水利部规划计划司

2009 年 11 月 20 日

---

## 一、投资计划下达情况

2009 年已累计安排中央水利建设投资计划共计 435.03 亿元（不含南水北调 45 亿元），其中包括 2009 年新增中央水利预算内投资计划（以下简称第二批投资）140 亿元，扩大内需第三批中央水利建设投资计划（以下简称第三批投资）180 亿元以及扩大内需第四批中央预算内投资计划（以下简称第四批投资）115.03 亿元，分别累计投入农村饮水安全工程、大中型病险水库除险加固工程、大型灌区续建配套与节水改造工程和重大水利项目 152 亿元、88 亿元、32 亿元和 163.03 亿元。截至 2009 年 11 月 20 日，各省（区、市）已下达到项目单位的中央投资计划 434.18 亿元：其中第二、三批中央投资计划 320 亿元已全部下达；第四批投资计划已下达 114.18 亿元，占投资计划的 99.7%（不含西藏一江两河专项非水利部门实施项目投资 0.5 亿元）。

第四批投资计划按工程类型分，大型灌区续建配套与节水改造工程和重大水利项目分别有 32.0 亿元和 82.2 亿元的投资下达

到项目单位，下达率分别为 100%和 99.6%（见表 1）。

表 1 第四批新增中央水利投资计划下达情况

| 工程类型          | 09 年累计安排中央水利投资计划（亿元） | 累计下达投资 | 投资计划下达比例 |
|---------------|----------------------|--------|----------|
| 合计            | 115.03               | 114.18 | 99.7%    |
| 大型灌区续建配套与节水改造 | 32.00                | 32.00  | 100.0%   |
| 重大水利工程        | 83.03                | 82.18  | 99.6%    |
| 枢纽水源          | 18.58                | 18.58  | 100.0%   |
| 江河治理          | 13.12                | 12.87  | 98.1%    |
| 小水电           | 6.00                 | 5.99   | 99.8%    |
| 血防            | 2.00                 | 2.00   | 100.0%   |
| 海堤            | 0.94                 | 0.94   | 100.0%   |
| 界河            | 2.00                 | 2.00   | 100.0%   |
| 机构能力          | 10.03                | 10.03  | 100.0%   |
| 水土保持及生态       | 30.36                | 29.77  | 98.1%    |

第二、第三批中央水利建设投资要求地方配套共计 225.0 亿元（包括银行贷款）。截至 11 月 20 日，各省（区、市）已下达地方配套投资计划 224.6 亿元，占要求配套的 99.8%。计划未全部下达的有山东、青海和新疆。截至 11 月 20 日，各直属单位、省（区、市）已下达第四批中央水利建设投资地方配套投资计划 104.2 亿元，占要求配套的 96.2%。计划下达率低于 90%的有西藏、贵州、新疆和青海。


## 二、资金到位情况

截至 11 月 20 日，第二、第三批中央投资 320 亿元已全部拨付项目单位。第二、第三批地方配套投资已拨付项目单位 198.9 亿元，拨付率为 88.4%（见图 1），其中省级配套投资 92.4 亿元，地县级配套投资 77.6 亿元，其他配套投资 28.8 亿元。



1、项目开工情况。截至 11 月 20 日，第二、第三批水利投资计划项目中，全国已有 3267 个项目开工建设，开工率为 98.3% (见图 3)，涉及计划总投资为 528.5 亿元，其中中央投资 314.6 亿元，占计划的 98.3%。全国已有 713 个项目完工，涉及的中央投资计划为 43.7 亿元。第四批水利投资计划项目中，全国已有 951 个项目开工建设，开工率为 63.3%；已有 111 个项目完工。

图3 2009年第二、三批新增水利投资开工率  
(按地区分)

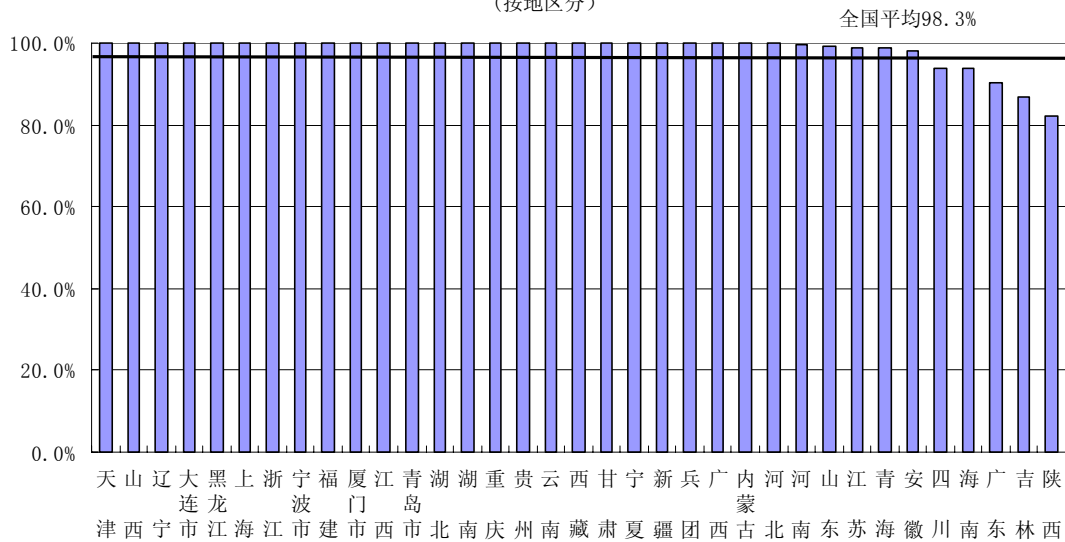

2、前期工作情况。根据已报送的数据，第二、第三批投资已有 2901 个项目完成初步设计或实施方案的编写或审查工作；2334 个项目完成技施设计；当前报送需开展招标的标段（标的）12607 个，已完成 10799 个，已完成招标投资 218.4 亿元，占需招标投资的 76.6%；1785 个项目完成设备采购合同。第四批投资已有 952 个项目完成初步设计或实施方案的编制或审查工作；628 个项目已完成技施设计；237 个项目完成设备采购合同；已


完成招标投资 42.1 亿元。

#### 四、投资完成情况

截至 11 月 20 日，第二、第三批投资已累计完成 322.0 亿元，其中，中央投资 214.8 亿元，地方配套投资 107.2 亿元，投资计划完成率分别为 67.1%（见图 4）和 47.6%。在完成的中央投资中，农村饮水安全项目 127.5 亿元，占计划的 83.9%；重大水利项目 47.2 亿元，占计划的 59.0%；大中型病险水库除险加固工程 40.1 亿元，占计划的 45.6%。

第四批投资已累计完成 60.2 亿元，其中，中央投资 34.0 亿元，地方配套投资 26.2 亿元，投资计划完成率分别为 29.7%和 24.2%。在完成的中央投资中，大型灌区续建配套与节水改造 8.0 亿元，占计划的 25%；重大水利工程完成投资 26.0 亿元，占计划的 31.5%。

图4 第二、三批新增中央水利投资完成率  
(按地区分)

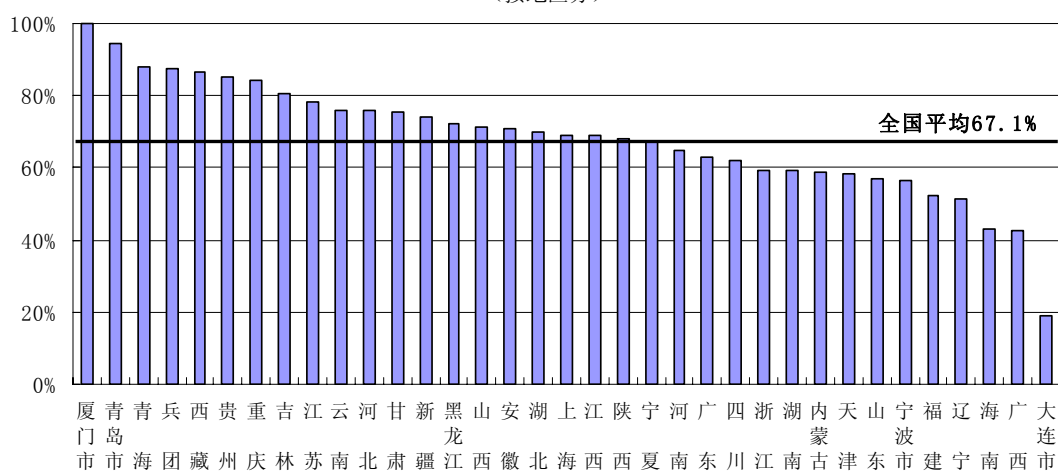

#### 五、工程进展情况

2009 年水利投资计划已开工项目累计投入劳动力 12319.2

万工日,累计完成土方 53036.5 万方,石方 6318.4 万方,砼 722.5 万方,金属结构 28.7 万吨。累计新建及加固堤防长度 371.0 公里,河道清淤疏浚和岸线整治 36.7 公里,累计治理水土流失面积 2139.6 平方公里。

---

发送：部领导，总工程师、总规划师、副总工程师，部有关司局、直属单位；国家发展改革委投资司、农经司；监察部综合室；国家审计署投资司、农林水审计局；有关省（自治区、直辖市）政府主管领导、水利（水务）厅（局），有关计划单列市水利（水务）局，新疆生产建设兵团水利局。

---

共印 150 份
