

扩大内需中央水利投资计划落实情况

旬报

第 26 期

水利部规划计划司

2010 年 1 月 20 日

一、投资计划下达情况

2009 年累计安排中央水利建设投资计划共计 435.03 亿元（不含南水北调 45 亿元），其中 2009 年新增中央水利预算内投资计划（以下简称第二批投资）140 亿元，扩大内需第三批中央水利建设投资计划（以下简称第三批投资）180 亿元以及扩大内需第四批中央预算内投资计划（以下简称第四批投资）115.03 亿元，分别累计投入农村饮水安全工程、大中型病险水库除险加固工程、大型灌区续建配套与节水改造工程和重大水利项目 152 亿元、88 亿元、32 亿元和 163.03 亿元。截至 2010 年 1 月 20 日，各省（区、市）已下达到项目单位的中央投资计划 434.33 亿元：其中第二、三批中央投资计划 320 亿元已全部下达；第四批投资计划已下达 114.33 亿元，占投资计划的 99.8%（不含西藏一江两河专项非水利部门实施项目投资 0.5 亿元）。第四批中央投资计划按工程类型分，大型灌区续建配套与节水改造工程和重大水利项目分别有 32.0 亿元和 82.33 亿元的投资下达到项目单位，


下达率分别为 100%和 99.8%。重大水利项目中除水保及生态项目有 2000 万中央投资尚未下达外，其余已全部下达。

第二、第三批中央水利建设投资要求地方配套共计 225.0 亿元（包括银行贷款）。截至 1 月 20 日，各省（区、市）已下达地方配套投资计划 224.7 亿元，占要求配套的 99.9%，计划未全部下达的有山东。各直属单位、省（区、市）已下达第四批中央水利建设投资地方配套投资计划 108.1 亿元，占要求配套的 99.1%，计划未全部下达的有贵州、海南、广东、山东。

二、资金到位情况


截至 1 月 20 日，第二、第三批中央投资 320 亿元已全部拨付项目单位。第二、第三批地方配套投资已拨付项目单位 213.1 亿元，拨付率为 94.7%（见图 1），其中省级配套投资 92.9 亿元，地县级配套投资 84.1 亿元，其他配套投资 36.1 亿元。按项目类型分，农村饮水安全项目拨付率为 100%；大中型病险水库除险加固工程为 91%；重大水利工程为 88%。

图1 第二、三批新增水利投资地方配套投资拨付率

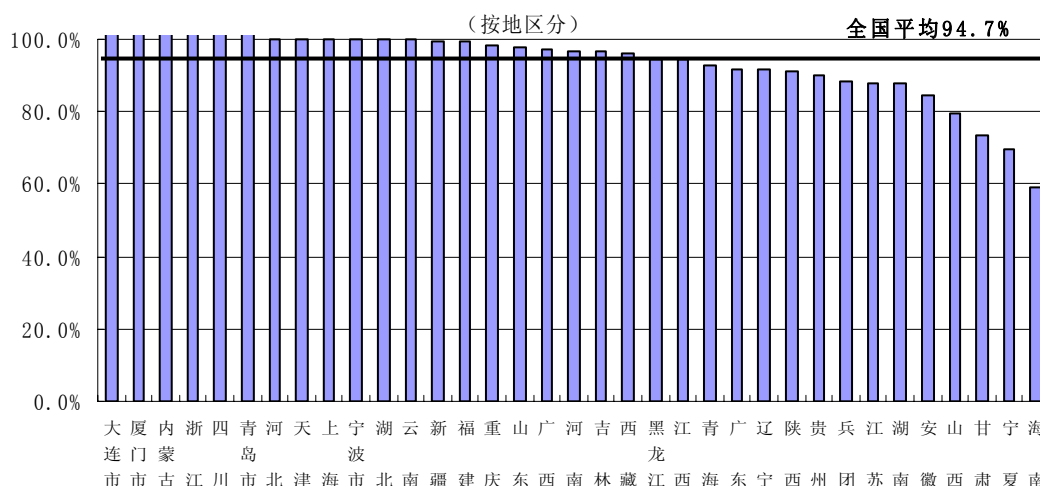

第四批投资，各直属单位、省（区、市）已拨付项目单位中央投资 111.2 亿元，拨付率为 97.1%。中央投资未全部拨付的有甘肃、新疆、贵州、河北、广东、兵团和西藏。已拨付地方配套 81.3 亿元，拨付率为 74.6%（见图 2）。其中省级配套投资 20.8 亿元，地县级配套投资 35.0 亿元，其他配套投资 25.5 亿元。按项目类型分，灌区项目地方配套拨付率为 70.8%，重大水利工程为 75.5%。

图2 第四批新增水利投资地方配套投资拨付率
(按地区分)

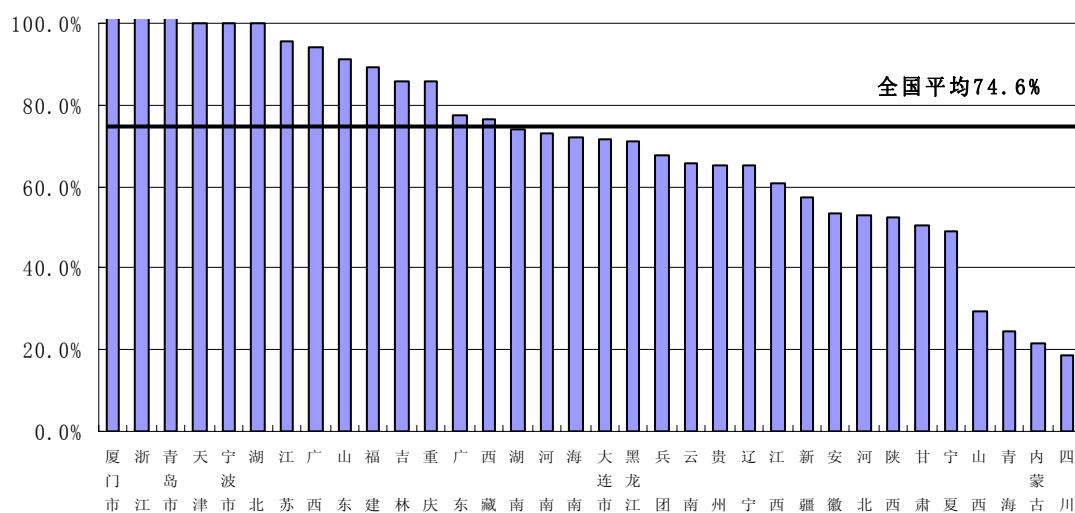

三、前期工作和开工情况

2009 年中央水利投资计划各地已分解落实水利建设项目 4851 个，其中第二、第三批水利投资计划项目 3321 个，第四批 1530 个。

1、项目开工情况。截至 1 月 20 日，第二、第三批水利投资计划项目中，全国已有 3320 个项目开工建设，开工率为 99.97%，除山东外已全部开工；全国已有 2594 个项目完工。第四批水利


投资计划项目中，全国已有 1258 个项目开工建设，开工率为 82.2%；已有 281 个项目完工。开工率低于 70%的有山西、四川、吉林和新疆。

2、前期工作情况。根据已报送的数据，第二、第三批投资已有 2961 个项目完成初步设计或实施方案的编制或审查工作；2409 个项目完成技施设计；当前报送需开展招标的标段（标的）13561 个，已完成 11631 个，已完成招标投资 263.9 亿元，占需招标投资的 92.5%；2196 个项目完成设备采购合同。第四批投资已有 1038 个项目完成初步设计或实施方案的编制或审查工作；715 个项目已完成技施设计；当前报送需开展招标的标段（标的）1463 个，已完成 1112 个，已完成招标投资 63.9 亿元，占需招标投资的 73.4%；395 个项目完成设备采购合同。

四、投资完成情况


截至 1 月 20 日，第二、第三批投资已累计完成 493.6 亿元，其中，中央投资 303.7 亿元，地方配套投资 189.9 亿元，投资计划完成率分别为 94.9%（见图 3）和 84.4%。在完成的中央投资中，农村饮水安全项目 151.98 亿元，占计划的 99.99%；大中型病险水库除险加固工程 80.5 亿元，占计划的 91.5%；重大水利项目 71.2 亿元，占计划的 89.0%。

图3 第二、三批新增中央水利投资完成率

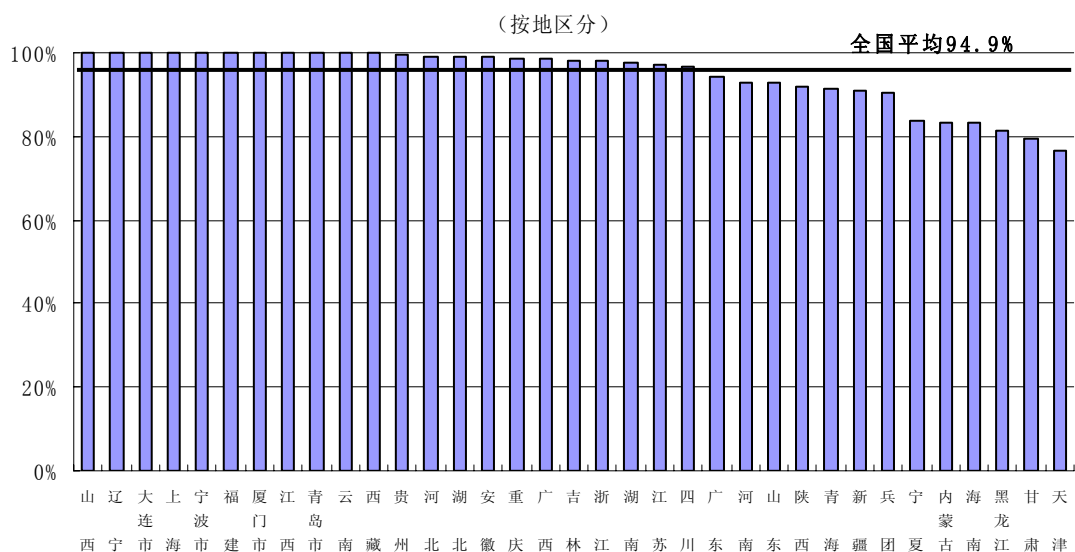

第四批投资已累计完成 127.5 亿元，其中，中央投资 69.7 亿元，地方配套投资 57.8 亿元，投资计划完成率分别为 60.9%（见图 4）和 53.0%。在完成的中央投资中，大型灌区续建配套与节水改造 19.7 亿元，占计划的 61.6%；重大水利项目完成投资 49.9 亿元，占计划的 60.5%。

图4 第四批新增中央水利投资完成率

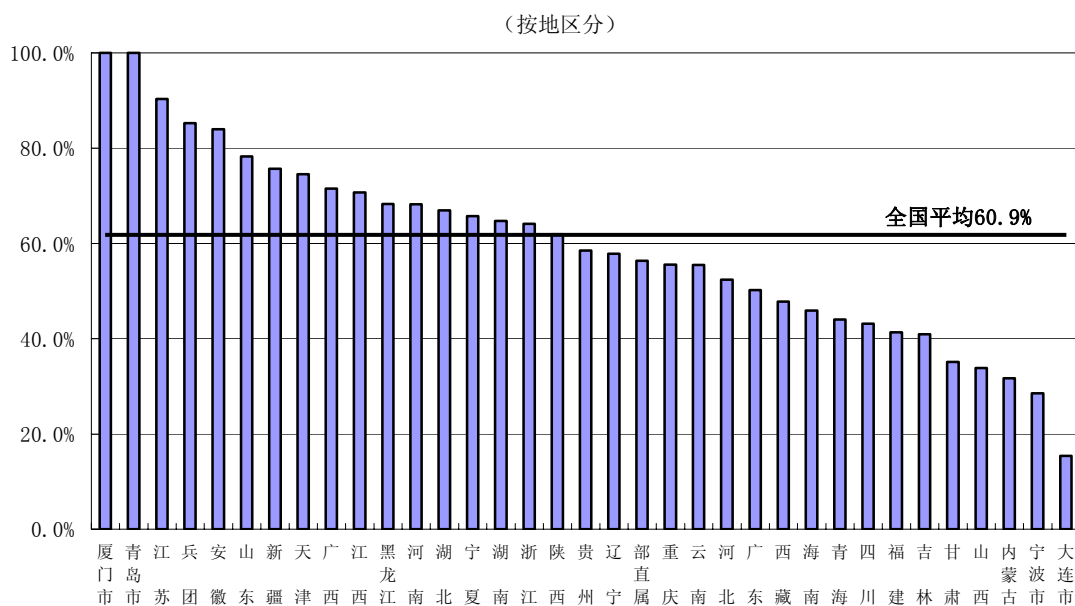

五、工程进展情况

2009 年水利投资计划已开工项目累计投入劳动力 19117.6 万工日,累计完成土方 79808.0 万方,石方 8376.0 万方,砼 1353.2 万方,金属结构 55.0 万吨。累计新建及加固堤防长度 1035.3 公里,河道清淤疏浚和岸线整治 348.5 公里,累计新增渠道整治和防渗长度 2511.5 公里,累计治理水土流失面积 5956.7 平方公里。

发送：部领导，总工程师、总规划师、副总工程师，部有关司局、直属单位；国家发展改革委投资司、农经司；监察部综合室；国家审计署投资司、农林水审计局；有关省（自治区、直辖市）政府主管领导、水利（水务）厅（局），有关计划单列市水利（水务）局，新疆生产建设兵团水利局。

共印 150 份
