

# 扩大内需中央水利投资计划落实情况

# 旬报

第 30 期

水利部规划计划司

2010 年 3 月 10 日

---


## 一、投资计划下达情况

2009 年共累计安排中央扩大内需第二、三、四批水利建设投资计划 435.03 亿元（不含南水北调 45 亿元），其中，农村饮水安全工程、大中型病险水库除险加固工程、大型灌区续建配套与节水改造工程和重大水利项目分别投资 152 亿元、88 亿元、32 亿元和 163.03 亿元。截至 2010 年 3 月 10 日，第二、三批中央投资计划 320 亿元已全部下达，第四批中央投资计划 114.53 亿元（不含西藏一江两河专项非水利部门实施项目投资 0.5 亿元）已下达 99.9%，其中 32 亿元大型灌区续建配套与节水改造工程投资计划已全部下达，重大水利工程中除水保及生态项目有 1000 万中央投资尚未下达外，其余已全部下达。


第二、三、四批中央水利建设投资计划要求地方配套投资共计 334.0 亿元（包括银行贷款）。截至 3 月 10 日，各省（区、市）已下达地方配套投资 99.9%，其中计划未全部下达的有海南、广东和山东。

## 二、资金到位情况

截至3月10日，第二、第三批中央投资已全部拨付项目单位，第二、第三批地方配套投资已拨付95.6%（见图1），其中农村饮水安全项目拨付率为100%，大中型病险水库除险加固工程为92.8%；重大水利工程为89.0%。

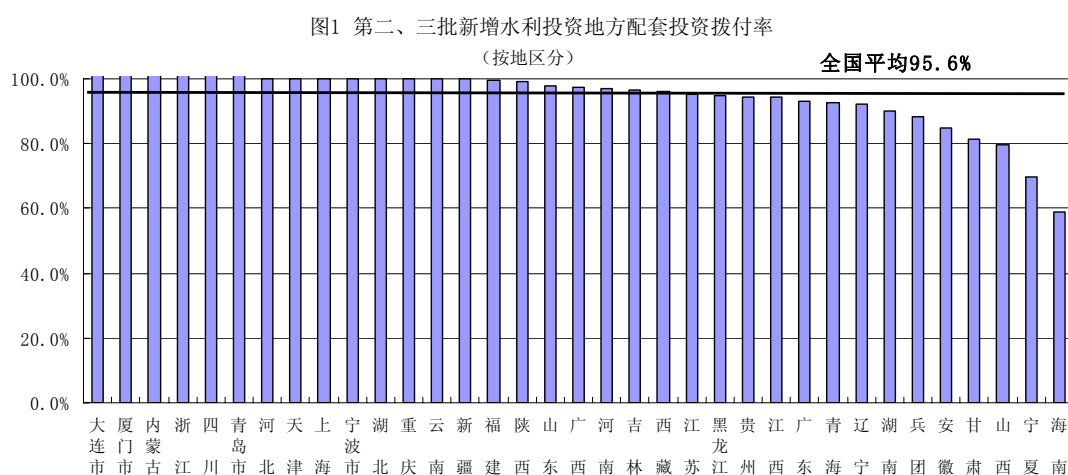

第四批中央投资，各直属单位、省（区、市）已拨付项目单位97.5%，其中未全部拨付的有新疆、河北、广东、兵团和西藏。已拨付地方配套投资79.7%（见图2）。其中灌区项目已拨付73.0%，重大水利工程已拨付81.3%。

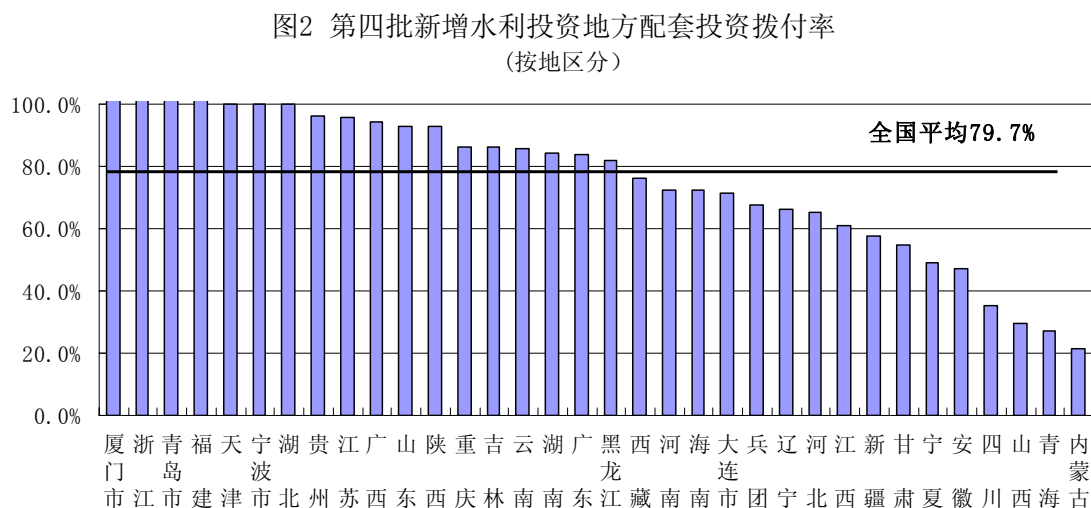

### 三、前期工作和开工情况

2009 年中央水利投资计划各地已分解落实水利建设项目 4864 个，其中第二、第三批水利投资计划项目 3321 个，第四批 1543 个。


1、项目开工情况。截至 3 月 10 日，第二、第三批水利投资计划项目中，全国已有 3320 个项目开工建设，开工率为 99.97%；全国已有 2664 个项目完工。第四批水利投资计划项目中，全国已有 1319 个项目开工建设，开工率为 85.5%，开工率低于 80% 的有四川、吉林和新疆；已有 379 个项目完工。

2、前期工作情况。根据已报送的数据，第二、第三批投资已有 2961 个项目完成初步设计或实施方案的编制或审查工作；2409 个项目完成技施设计；当前报送需开展招标的标段（标的）13561 个，已完成 11639 个，已完成招标投标投资 264.6 亿元，占需招标投标投资的 92.8%；2204 个项目完成设备采购合同。第四批投资已有 1048 个项目完成初步设计或实施方案的编制或审查工作；727 个项目已完成技施设计；当前报送需开展招标的标段（标的）1488 个，已完成 1142 个，已完成招标投标投资 65.1 亿元，占需招标投标投资的 74.7%；421 个项目完成设备采购合同。


### 四、投资完成情况

截至 3 月 10 日，第二、第三批投资已累计完成 504.7 亿元，其中，中央投资 307.9 亿元，地方配套投资 196.8 亿元，投资计划完成率分别为 96.2%（见图 3）和 87.5%。在完成的中央投资

中，农村饮水安全项目 151.98 亿元，占计划的 99.99%；大中型病险水库除险加固工程 82.0 亿元，占计划的 93.2%；重大水利项目 73.9 亿元，占计划的 92.4%。

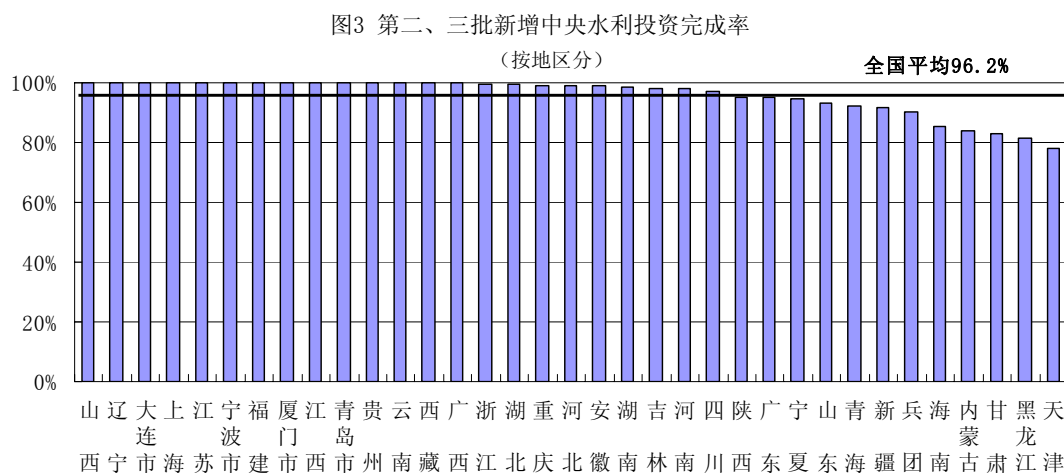

第四批投资已累计完成 148.6 亿元，其中，中央投资 79.3 亿元，地方配套投资 69.3 亿元，投资计划完成率分别为 69.3%（见图 4）和 63.3%。在完成的中央投资中，大型灌区续建配套与节水改造 22.5 亿元，占计划的 70.3%；重大水利项目完成投资 56.8 亿元，占计划的 68.4%。

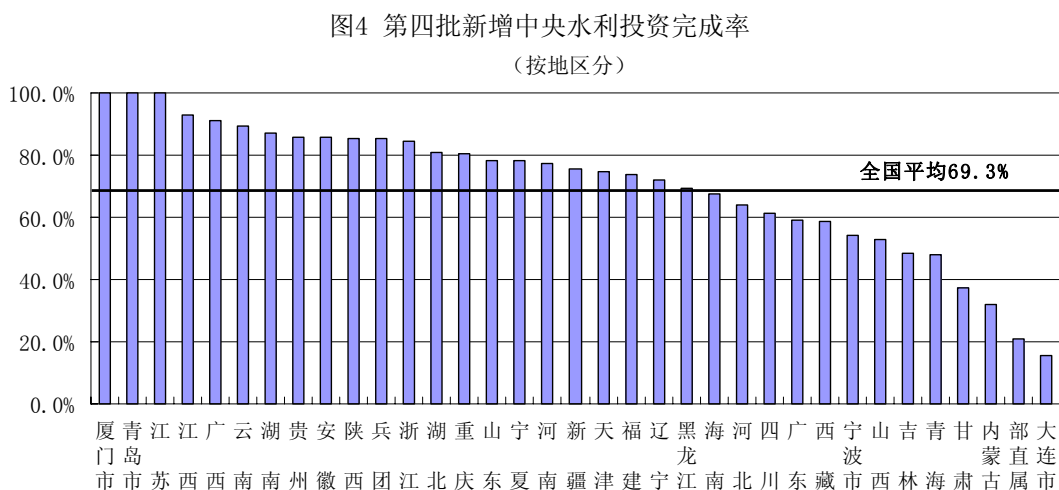

## 五、工程进展情况

2009 年水利投资计划已开工项目累计投入劳动力 20003.9 万工日,累计完成土方 84416.0 万方,石方 9792.3 万方,砼 1470.6 万方,金属结构 62.6 万吨。累计新建及加固堤防长度 1774.6 公里,河道清淤疏浚和岸线整治 348.5 公里,累计新增渠道整治和防渗长度 2645.3 公里,累计治理水土流失面积 6616.8 平方公里。

---

发送：部领导，总工程师、总规划师、副总工程师，部有关司局、直属单位；国家发展改革委投资司、农经司；监察部综合室；国家审计署投资司、农林水审计局；有关省（自治区、直辖市）政府主管领导、水利（水务）厅（局），有关计划单列市水利（水务）局，新疆生产建设兵团水利局。

---

共印 150 份
