

扩大内需中央水利投资计划落实情况

旬报

第 36 期

水利部规划计划司

2010 年 5 月 10 日

一、投资计划下达情况

2009 年共累计安排中央扩大内需第二、三、四批水利建设投资计划 435.03 亿元（不含南水北调 45 亿元），其中，农村饮水安全工程、大中型病险水库除险加固工程、大型灌区续建配套与节水改造工程和重大水利项目分别投资 152 亿元、88 亿元、32 亿元和 163.03 亿元。截至 2010 年 5 月 10 日，第二、三批中央投资计划 320 亿元已全部下达，第四批中央投资计划 114.53 亿元（不含西藏一江两河专项非水利部门实施项目投资 0.5 亿元）已下达 99.9%，其中 32 亿元大型灌区续建配套与节水改造工程投资计划已全部下达，重大水利工程中除水保及生态项目有 1000 万中央投资尚未下达外，其余已全部下达。

第二、三、四批中央水利建设投资计划要求地方配套投资共计 334.0 亿元（包括银行贷款）。截至 5 月 10 日，各省（区、市）已下达地方配套投资 99.9%，其中计划未全部下达的有广东和山东。

三、前期工作和开工情况

2009 年中央水利投资计划各地已分解落实水利建设项目 4862 个，其中第二、第三批水利投资计划项目 3322 个，第四批 1540 个。

1、项目开工情况。截至 5 月 10 日，第二、第三批水利投资计划项目中，全国已有 3321 个项目开工建设，开工率为 99.97%；全国已有 2794 个项目完工。第四批水利投资计划项目中，全国已有 1400 个项目开工建设，开工率为 90.9%，未全部开工的有内蒙古、吉林、黑龙江、山东、广东、海南、四川、宁夏、甘肃、新疆和兵团，已有 740 个项目完工。


2、前期工作情况。根据已报送的数据，第二、第三批投资已有 2974 个项目完成初步设计或实施方案的编制或审查工作；2415 个项目完成技施设计；当前报送需开展招标的标段（标的）13592 个，已完成 11986 个，已完成招标投资 268 亿元，占需招标投资的 94.0%；2261 个项目完成设备采购合同。第四批投资已有 1088 个项目完成初步设计或实施方案的编制或审查工作；768 个项目已完成技施设计；当前报送需开展招标的标段（标的）1697 个，已完成 1367 个，已完成招标投资 82.23 亿元，占需招标投资的 94.2%；528 个项目完成设备采购合同。

四、投资完成情况

截至 5 月 10 日，第二、第三批投资已累计完成 518.8 亿元，其中，中央投资 312.4 亿元，地方配套投资 206.4 亿元，投资计


划完成率分别为 97.6%（见图 3）和 91.7%。在完成的中央投资中，农村饮水安全项目 152 亿元，已全部完成计划；大中型病险水库除险加固工程 83.6 亿元，占计划的 95.0%；重大水利项目 76.8 亿元，占计划的 96.0%。

图3 第二、三批扩大内需中央水利投资完成率
(按地区分)

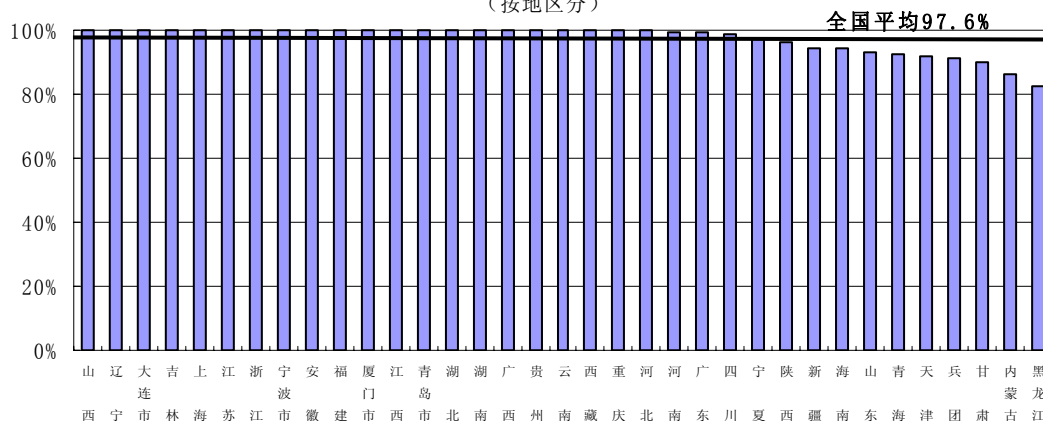

第四批投资已累计完成 182.1 亿元，其中，中央投资 95.4 亿元，地方配套投资 86.7 亿元，投资计划完成率分别为 82.8%（见图 4）和 79.5%。在完成的中央投资中，大型灌区续建配套与节水改造 29.6 亿元，占计划的 92.3%；重大水利项目完成投资 65.8 亿元，占计划的 79.1%。

图4 第四批扩大内需中央水利投资完成率
(按地区分)

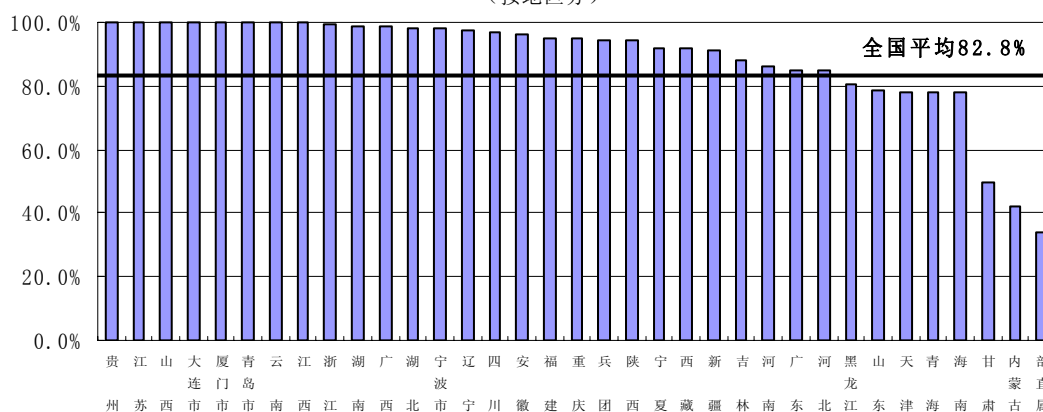

五、工程进展情况

2009 年水利投资计划已开工项目累计投入劳动力 30526.0 万工日，累计完成土方 89620.4 万方，石方 14722.2 万方，砼 1632.5 万方，金属结构 69.0 万吨。累计新建及加固堤防长度 2068.7 公里，河道清淤疏浚和岸线整治 364.5 公里，累计新增渠道整治和防渗长度 2886.2 公里，累计治理水土流失面积 7188.5 平方公里。

发送：部领导，总工程师、总规划师、副总工程师，部有关司局、直属单位；国家发展改革委投资司、农经司；监察部综合室；国家审计署投资司、农林水审计局；有关省（自治区、直辖市）政府主管领导、水利（水务）厅（局），有关计划单列市水利（水务）局，新疆生产建设兵团水利局。

共印 150 份
