

扩大内需以来中央水利投资计划落实情况

旬报

第 42 期

水利部规划计划司

2010 年 7 月 10 日

一、投资计划下达情况


2009 年共累计安排中央扩大内需第二、三、四批水利建设投资计划 435.03 亿元（不含南水北调 45 亿元），其中农村饮水安全工程、大中型病险水库除险加固工程、大型灌区续建配套与节水改造工程和重大水利工程分别投资 152 亿元、88 亿元、32 亿元和 163.03 亿元；要求地方配套投资共计 334 亿元（包括银行贷款）。截至 7 月 10 日，第二、三、四批中央水利投资计划和地方配套投资计划已全部下达。

2010 年已下达各省（区、市）中央水利投资计划 300.5 亿元，其中农村饮水安全工程、大中型病险水库除险加固工程、大型灌区续建配套与节水改造工程和重大水利工程分别投资 200 亿元、21.8 亿元、57.4 亿元和 21.4 亿元；要求地方配套 174.2 亿元。截至 7 月 10 日，2010 年中央水利投资计划各省（区、市）已下达到项目单位 159.6 亿元，投资计划下达率为 53.1%，其中农村饮水安全工程、大中型病险水库除险加固工程、大型灌区续

建配套与节水改造工程和重大水利工程分别下达 112.8 亿元、17.7 亿元、20.3 亿元和 8.8 亿元；已下达地方配套投资 74.7 亿元，占地方配套投资计划的 42.8%。


二、资金到位情况

截至 7 月 10 日，第二、第三批中央投资已全部拨付项目单位，第二、第三批地方配套投资已拨付 99.3%（见图 1），其中农村饮水安全项目拨付率为 100%，大中型病险水库除险加固工程为 96.6%，重大水利工程为 95.0%。

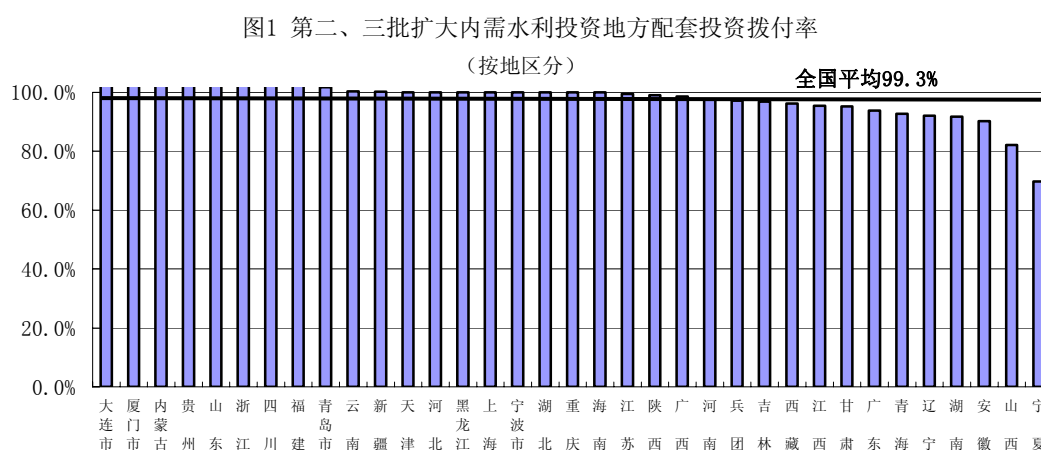

第四批中央投资，各直属单位、省（区、市）已拨付项目单位 99.4%，其中未全部拨付的有广东。已拨付地方配套投资的 90.4%（见图 2），其中灌区项目已拨付 84.3%，重大水利工程已拨付 91.8%。

图2 第四批扩大内需水利投资地方配套投资拨付率
(按地区分)

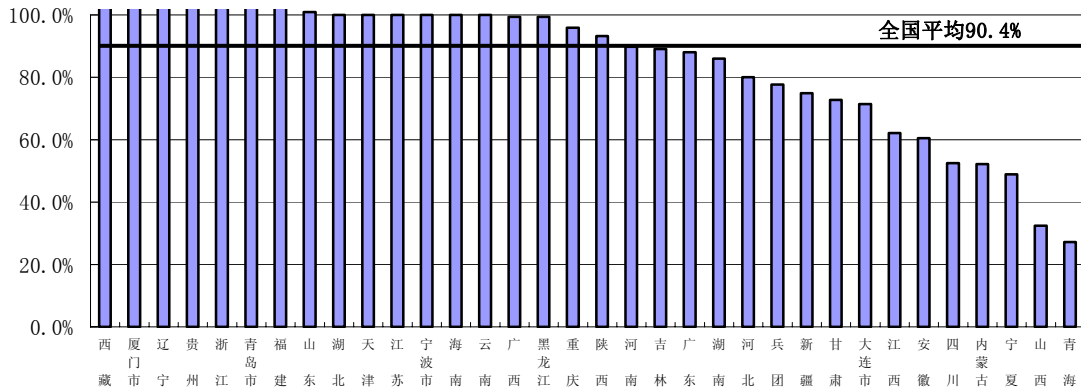

2010年中央水利投资已拨付项目单位中央投资91.0亿元，到位率为30.3%，其中农村饮水安全工程、大中型病险水库除险加固工程、大型灌区续建配套与节水改造工程和重大水利工程分别为67.8亿元、15.7亿元、6.2亿元和1.4亿元；已落实地方配套投资59.6亿元，落实率为34.2%，其中农村饮水安全工程、大中型病险水库除险加固工程、大型灌区续建配套与节水改造工程和重大水利工程分别为45.5亿元、9.0亿元、4.9亿元和0.2亿元。

三、前期工作和开工情况

2009年中央水利投资计划各地已分解落实水利建设项目4862个，其中第二、第三批中央水利投资计划项目3322个，第四批1540个。2010年中央水利投资计划已分解落实水利建设项目1247个。

1、项目开工情况。截至7月10日，第二、第三批中央水利投资计划项目已全部开工，完工项目数为2869个。第四批中央

水利投资计划项目中，全国已有 1450 个项目开工建设，开工率为 94.2%，未全部开工的有吉林、广东、四川、甘肃和新疆，已有 889 个项目完工。2010 年中央水利投资项目已有 522 个项目开工建设，其中广西开工项目个数最多，达 118 个。

2、前期工作情况。根据已报送的数据，第二、第三批中央水利投资计划已有 2978 个项目完成初步设计或实施方案的编制或审查工作；2444 个项目完成技施设计；当前报送需开展招标的标段（标的）13618 个，已完成 12069 个，已完成招标投资 293 亿元，占需招标投资的 96.6%；2272 个项目完成设备采购合同。第四批中央水利投资计划已有 1094 个项目完成初步设计或实施方案的编制或审查工作；776 个项目已完成技施设计；当前报送需开展招标的标段（标的）1778 个，已完成 1488 个，已完成招标投资 86.2 亿元，占需招标投资的 99.2%；588 个项目完成设备采购合同。2010 年中央水利投资计划有 708 个项目完成初步设计或实施方案的编制或审查工作；513 个项目完成技施设计；当前报送需开展招标的标段（标的）3429 个，已完成 1456 个，已完成招标投资 43.2 亿元，占需招标投资的 76.5%；223 个项目完成设备采购合同。

四、投资完成情况

截至 7 月 10 日，第二、第三批投资已累计完成 524.5 亿元，其中中央投资 315.4 亿元，地方配套投资 209.1 亿元，投资计划完成率分别为 98.6%（见图 3）和 93.0%。在完成的中央投资中，

2010 年投资已累计完成 40.1 亿元，其中中央投资 25.0 亿元，地方配套投资 15.1 亿元，完成率分别为 8.3%和 8.7%。在完成的中央投资中，农村饮水安全项目 19.5 亿元，大中型病险水库除险加固工程 5.2 亿元，大型灌区续建配套与节水改造工程 0.1 亿元，重大水利工程 0.2 亿元。

五、工程进展情况

2009 年中央水利投资计划已开工项目累计投入劳动力 31078.1 万工日，累计完成土方 91744.2 万方，石方 14885.0 万方，砼 1755.4 万方，金属结构 70.1 万吨。累计新建及加固堤防长度 2839.6 公里，河道清淤疏浚和岸线整治 522 公里，累计新增渠道整治和防渗长度 3118.2 公里，累计治理水土流失面积 7225.6 平方公里。

2010 年中央水利投资计划已开工项目累计投入劳动力 980.5 万工日，累计完成土方 3474.3 万方，石方 407.6 万方，砼 55.5 万方，金属结构 2.1 万吨。

六、2010 年中央水利投资计划数据报送情况

2010 年中央水利投资计划数据报送及时且质量较好的地区有：河北、山西、内蒙、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、山东、河南、湖北、湖南、广西、海南、重庆、陕西、贵州、云南、西藏、甘肃、宁夏、新疆、宁波和青岛。

请江西、广东、四川、青海、大连和兵团水利（水务）厅（局）尽快分解下达投资计划至项目单位，并及时报送旬报数据。

发送：部领导，总工程师、总规划师、副总工程师，部有关司局、直属单位；国家发展改革委投资司、农经司；监察部综合室；国家审计署投资司、农林水审计局；有关省（自治区、直辖市）政府主管领导、水利（水务）厅（局），有关计划单列市水利（水务）局，新疆生产建设兵团水利局。

共印 150 份
