

# 扩大内需以来中央水利投资计划落实情况

# 旬报

第 47 期

水利部规划计划司

2010 年 8 月 31 日

---


## 一、投资计划下达情况

2009 年共累计安排中央扩大内需第二、三、四批水利建设投资计划 435.03 亿元（不含南水北调 45 亿元），其中农村饮水安全工程、大中型病险水库除险加固工程、大型灌区续建配套与节水改造工程和重大水利工程分别投资 152 亿元、88 亿元、32 亿元和 163.03 亿元；要求地方配套投资共计 334 亿元（包括银行贷款）。截至 8 月 31 日，第二、三、四批中央水利投资计划和地方配套投资计划已全部下达。

2010 年已下达各省（区、市）中央水利投资计划 427.5 亿元，其中农村饮水安全工程、大中型病险水库除险加固工程、大型灌区续建配套与节水改造工程和重大水利工程分别投资 200 亿元、21.7 亿元、60.0 亿元和 145.7 亿元；要求地方配套 332.2 亿元。截至 8 月 31 日，2010 年中央水利投资计划各省（区、市）已下达到项目单位 306.1 亿元，投资计划下达率为 71.6%，其中农村饮水安全工程、大中型病险水库除险加固工程、大型灌区续



图2 第四批扩大内需水利投资地方配套投资拨付率  
(按地区分)

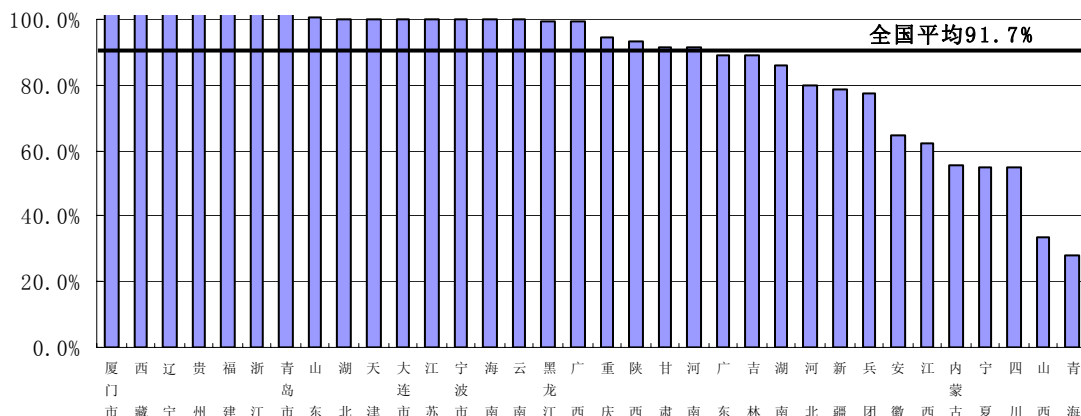

2010年中央水利投资已拨付项目单位中央投资199.5亿元，到位率为46.7%，其中农村饮水安全工程、大中型病险水库除险加固工程、大型灌区续建配套与节水改造工程和重大水利工程分别为133.3亿元、17.0亿元、18.1亿元和31.2亿元；已落实地方配套投资136.8亿元，落实率为41.2%，其中农村饮水安全工程、大中型病险水库除险加固工程、大型灌区续建配套与节水改造工程和重大水利工程分别为73.9亿元、12.7亿元、16.0亿元和34.3亿元。

### 三、前期工作和开工情况

2009年中央水利投资计划各地已分解落实水利建设项目4862个，其中第二、第三批中央水利投资计划项目3322个，第四批1540个。2010年中央水利投资计划已分解落实水利建设项目2857个。

1、项目开工情况。截至8月31日，第二、第三批中央水利投资计划项目已全部开工，完工项目数为2947个。第四批中央

水利投资计划项目中，全国已有 1534 个项目开工建设，开工率为 99.6%，未全部开工的有广东和甘肃，已有 1056 个项目完工。2010 年中央水利投资项目已有 1456 个项目开工建设，其中广西开工项目个数最多，达 202 个。


**2、前期工作情况。**根据已报送的数据，第二、第三批中央水利投资计划项目需开展招标的标段（标的）13682 个，已完成 12127 个，已完成招标投资 296.9 亿元，占需招标投资的 97.9%。第四批中央水利投资计划已有 1117 个项目完成初步设计或实施方案的编制或审查工作；843 个项目已完成技施设计；当前报送需开展招标的标段（标的）1823 个，已完成 1558 个，已完成招标投资 90.0 亿元，占需招标投资的 99.6%；617 个项目完成设备采购合同。2010 年中央水利投资计划有 1574 个项目完成初步设计或实施方案的编制或审查工作；1140 个项目完成技施设计；当前报送需开展招标的标段（标的）7785 个，已完成 5827 个，已完成招标投资 115.0 亿元，占需招标投资的 72.3%；790 个项目完成设备采购合同。

#### **四、投资完成情况**

截至 8 月 31 日，第二、第三批投资已累计完成 528.0 亿元，其中中央投资 316.7 亿元，地方配套投资 211.3 亿元，投资计划完成率分别为 99.0%（见图 3）和 93.9%。在完成的中央投资中，农村饮水安全工程 152 亿元，已全部完成计划；大中型病险水库除险加固工程 86.1 亿元，占计划的 97.8%；重大水利工程 78.7


亿元，占计划的 98.4%。

图3 第二、三批扩大内需中央水利投资完成率

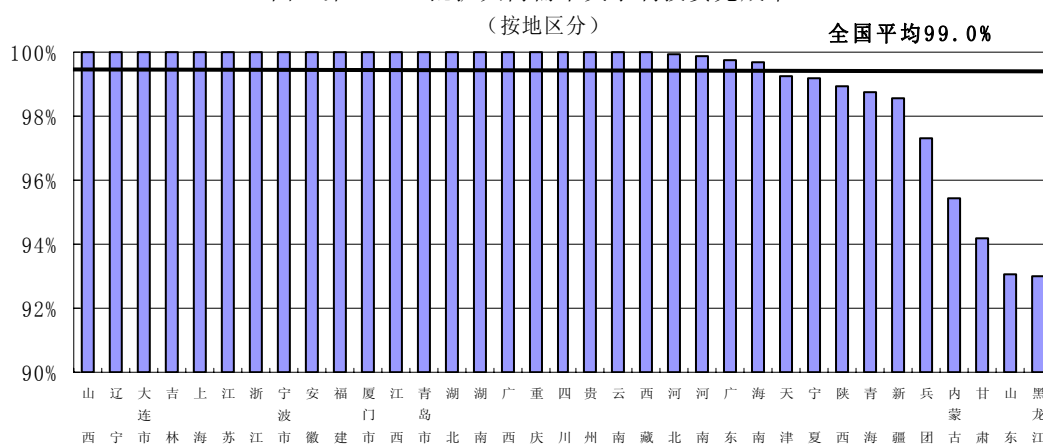

第四批投资已累计完成 199.7 亿元，其中中央投资 104.7 亿元，地方配套投资 95.0 亿元，投资计划完成率分别为 91.0% (见图 4) 和 87.1%。在完成的中央投资中，大型灌区续建配套与节水改造工程 31.5 亿元，占计划的 98.3%；重大水利工程完成投资 73.2 亿元，占计划的 88.1%。

图4 第四批扩大内需中央水利投资完成率

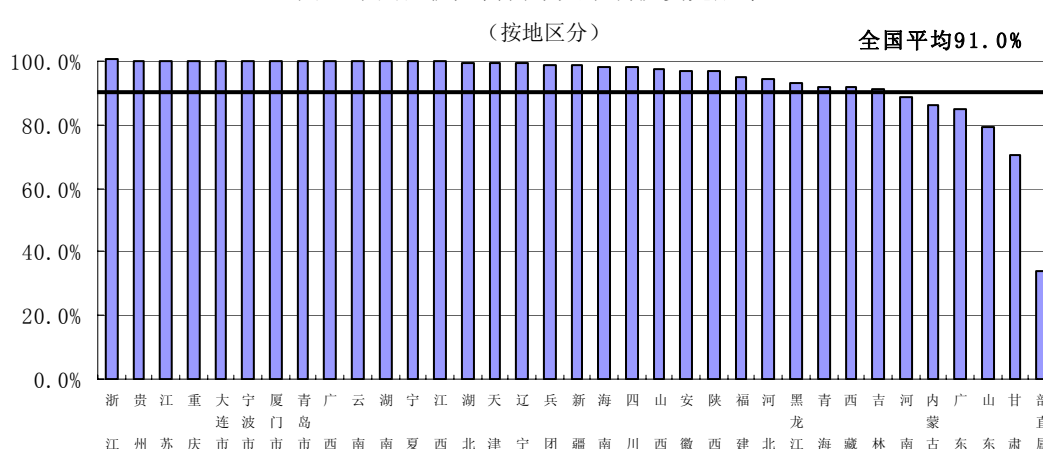

2010年投资已累计完成139.7亿元，其中中央投资88.4亿元，地方配套投资51.3亿元，完成率分别为20.7%和15.4%。在完成的中央投资中，农村饮水安全工程70.6亿元，大中型病险水库除险加固工程8.9亿元，大型灌区续建配套与节水改造工程0.8亿元，重大水利工程8.1亿元。

## 五、工程进展情况

2009年中央水利投资计划已开工项目累计投入劳动力31443.0万工日，累计完成土方93405.5万方，石方10879.4万方，砼1808.7万方，金属结构70.8万吨。累计新建及加固堤防长度2860.2公里，河道清淤疏浚和岸线整治529公里，累计新增渠道整治和防渗长度3145.1公里，累计治理水土流失面积7249.0平方公里。

2010年中央水利投资计划已开工项目累计投入劳动力4295.7万工日，累计完成土方14305.5万方，石方742.5万方，砼169.3万方，金属结构5.6万吨。

## 六、2010年中央水利投资计划数据报送情况

请天津、大连、厦门和兵团水利（水务）厅（局）尽快分解下达2010年中央水利投资计划至项目单位，并及时报送旬报数据。

---

发送：部领导，总工程师、总规划师、副总工程师，部有关司局、直属单位；国家发展改革委投资司、农经司；监察部综合室；国家审计署投资司、农林水审计局；有关省（自治区、直辖市）政府主管领导、水利（水务）厅（局），有关计划单列市水利（水务）局，新疆生产建设兵团水利局。

---

共印 150 份
