

扩大内需以来中央水利投资计划落实情况

旬报

第 48 期

水利部规划计划司


2010 年 9 月 10 日

一、投资计划下达情况

2009 年共累计安排中央扩大内需第二、三、四批水利建设投资计划 435.03 亿元（不含南水北调 45 亿元），其中农村饮水安全工程、大中型病险水库除险加固工程、大型灌区续建配套与节水改造工程和重大水利工程分别投资 152 亿元、88 亿元、32 亿元和 163.03 亿元；要求地方配套投资共计 334 亿元（包括银行贷款）。截至 9 月 10 日，第二、三、四批中央水利投资计划和地方配套投资计划已全部下达。

2010 年已下达各省（区、市）中央水利投资计划 508.5 亿元，其中农村饮水安全工程、大中型病险水库除险加固工程、大型灌区续建配套与节水改造工程和重大水利工程分别投资 200 亿元、21.9 亿元、60.0 亿元和 226.6 亿元；要求地方配套 438.6 亿元。截至 9 月 10 日，2010 年中央水利投资计划各省（区、市）已下达到项目单位 330.1 亿元，投资计划下达率为 64.9%，其中农村饮水安全工程、大中型病险水库除险加固工程、大型灌区续

图2 第四批扩大内需水利投资地方配套投资拨付率
(按地区分)

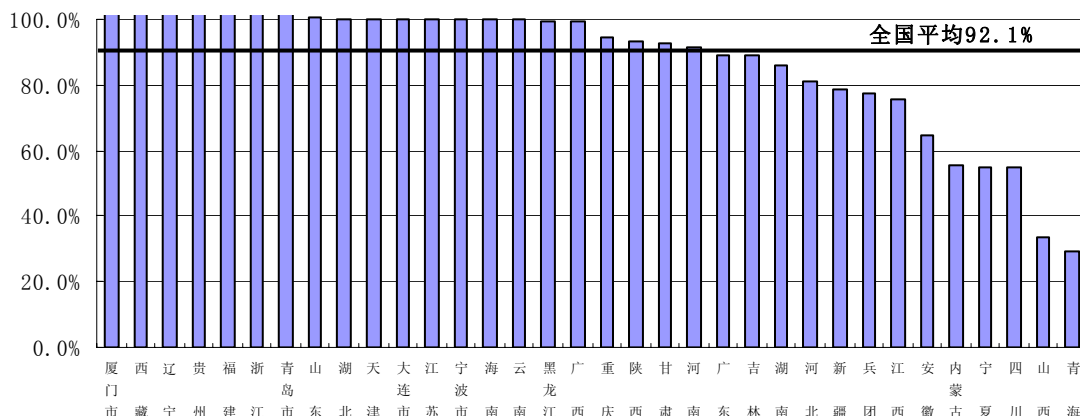

2010年中央水利投资已拨付项目单位中央投资241.8亿元，到位率为47.5%，其中农村饮水安全工程、大中型病险水库除险加固工程、大型灌区续建配套与节水改造工程和重大水利工程分别为159.6亿元、17.1亿元、20.8亿元和44.3亿元；已落实地方配套投资164.4亿元，落实率为37.5%，其中农村饮水安全工程、大中型病险水库除险加固工程、大型灌区续建配套与节水改造工程和重大水利工程分别为85.5亿元、12.7亿元、16.0亿元和50.2亿元。

三、前期工作和开工情况

2009年中央水利投资计划各地已分解落实水利建设项目4862个，其中第二、第三批中央水利投资计划项目3322个，第四批1540个。2010年中央水利投资计划已分解落实水利建设项目3098个。

1、项目开工情况。截至9月10日，第二、第三批中央水利投资计划项目已全部开工，完工项目数为2954个。第四批中央

水利投资计划项目中，全国已有 1537 个项目开工建设，开工率为 99.8%，未全部开工的有广东和甘肃，已有 1109 个项目完工。2010 年中央水利投资项目已有 1719 个项目开工建设，其中广西开工项目个数最多，达 202 个。


2、前期工作情况。根据已报送的数据，第二、第三批中央水利投资计划项目需开展招标的标段（标的）13685 个，已完成 12131 个，已完成招标投资 297.0 亿元，占需招标投资的 97.9%。第四批中央水利投资计划已有 1119 个项目完成初步设计或实施方案的编制或审查工作；847 个项目已完成技施设计；当前报送需开展招标的标段（标的）1825 个，已完成 1561 个，已完成招标投资 90.3 亿元，占需招标投资的 99.8%；619 个项目完成设备采购合同。2010 年中央水利投资计划有 1813 个项目完成初步设计或实施方案的编制或审查工作；1315 个项目完成技施设计；当前报送需开展招标的标段（标的）9233 个，已完成 6753 个，已完成招标投资 154.2 亿元，占需招标投资的 70.0%；921 个项目完成设备采购合同。

四、投资完成情况

截至 9 月 10 日，第二、第三批投资已累计完成 528.6 亿元，其中中央投资 316.8 亿元，地方配套投资 211.8 亿元，投资计划完成率分别为 99.0%（见图 3）和 94.2%。在完成的中央投资中，农村饮水安全工程 152 亿元，已全部完成计划；大中型病险水库除险加固工程 86.1 亿元，占计划的 97.9%；重大水利工程 78.7


亿元，占计划的 98.4%。

图3 第二、三批扩大内需中央水利投资完成率

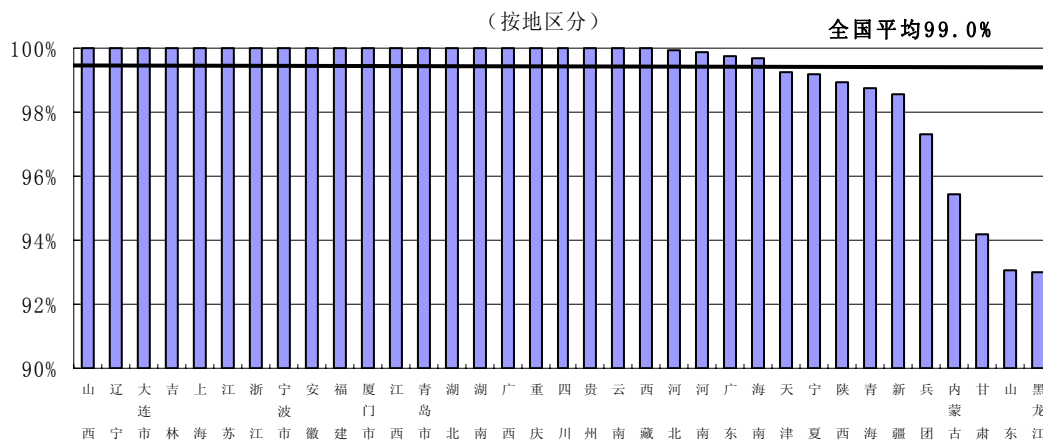


第四批投资已累计完成 202.0 亿元，其中中央投资 105.7 亿元，地方配套投资 96.3 亿元，投资计划完成率分别为 91.9% (见图 4) 和 88.3%。在完成的中央投资中，大型灌区续建配套与节水改造工程 31.5 亿元，占计划的 98.4%；重大水利工程完成投资 74.2 亿元，占计划的 89.4%。

图4 第四批扩大内需中央水利投资完成率

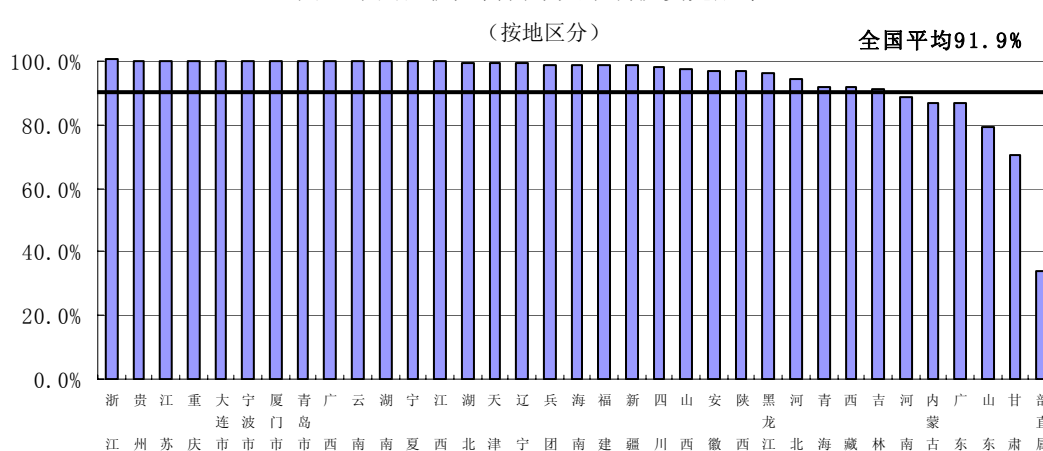

2010 年投资已累计完成 176.8 亿元，其中中央投资 109.4 亿元，地方配套投资 67.4 亿元，完成率分别为 21.5%（见图 5）和 15.4%。在完成的中央投资中，农村饮水安全工程 89.3 亿元，大中型病险水库除险加固工程 10.1 亿元，大型灌区续建配套与节水改造工程 1.3 亿元，重大水利工程 8.7 亿元。

图5 2010年扩大内需中央水利投资完成率
(按地区分)

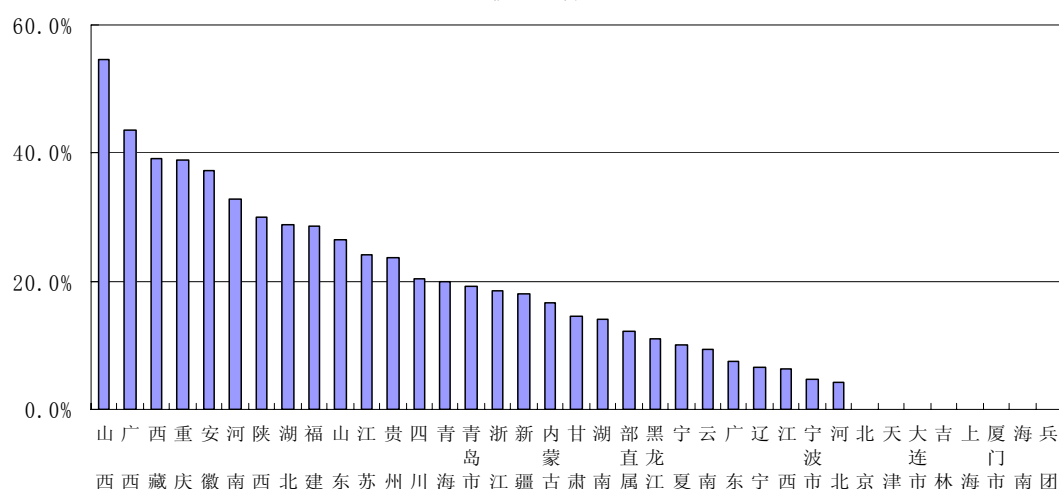

五、工程进展情况

2009 年中央水利投资计划已开工项目累计投入劳动力 31474.3 万工日，累计完成土方 93428.6 万方，石方 10890.9 万方，砼 1812.0 万方，金属结构 71.0 万吨。累计新建及加固堤防长度 2863.1 公里，河道清淤疏浚和岸线整治 530 公里，累计新增渠道整治和防渗长度 3146.7 公里，累计治理水土流失面积 7250.1 平方公里。

2010 年中央水利投资计划已开工项目累计投入劳动力 5536.2 万工日，累计完成土方 16539.7 万方，石方 987.9 万方，砼 194.7 万方，金属结构 6.6 万吨。累计解决农村饮水安全人口

2259.3 万人，累计新建及加固堤防长度 135.3 公里，河道清淤疏浚和岸线整治 79.2 公里，累计新增渠道整治和防渗长度 91.6 公里，累计治理水土流失面积 660.5 平方公里。

六、2010 年中央水利投资计划数据报送情况

请大连、厦门和兵团水利（水务）厅（局）尽快分解下达 2010 年中央水利投资计划至项目单位，并及时报送旬报数据。

发送：部领导，总工程师、总规划师、副总工程师，部有关司局、直属单位；国家发展改革委投资司、农经司；监察部综合室；国家审计署投资司、农林水审计局；有关省（自治区、直辖市）政府主管领导、水利（水务）厅（局），有关计划单列市水利（水务）局，新疆生产建设兵团水利局。

共印 150 份
