

# 扩大内需以来中央水利投资计划落实情况

# 旬报

第 50 期

水利部规划计划司

2010 年 9 月 30 日

---


## 一、投资计划下达情况

2009 年共累计安排中央扩大内需第二、三、四批水利建设投资计划 435.03 亿元（不含南水北调 45 亿元），其中农村饮水安全工程、大中型病险水库除险加固工程、大型灌区续建配套与节水改造工程和重大水利工程分别投资 152 亿元、88 亿元、32 亿元和 163.03 亿元；要求地方配套投资共计 334 亿元（包括银行贷款）。截至 9 月 30 日，第二、三、四批中央水利投资计划和地方配套投资计划已全部下达。

2010 年已下达各省（区、市）中央水利投资计划 520.4 亿元，其中农村饮水安全工程、大中型病险水库除险加固工程、大型灌区续建配套与节水改造工程和重大水利工程分别投资 200 亿元、21.9 亿元、60.0 亿元和 238.5 亿元；要求地方配套 442.1 亿元。截至 9 月 30 日，2010 年中央水利投资计划各省（区、市）已下达到项目单位 373.0 亿元，投资计划下达率为 71.7%，其中农村饮水安全工程、大中型病险水库除险加固工程、大型灌区续



图2 第四批扩大内需水利投资地方配套投资拨付率  
(按地区分)

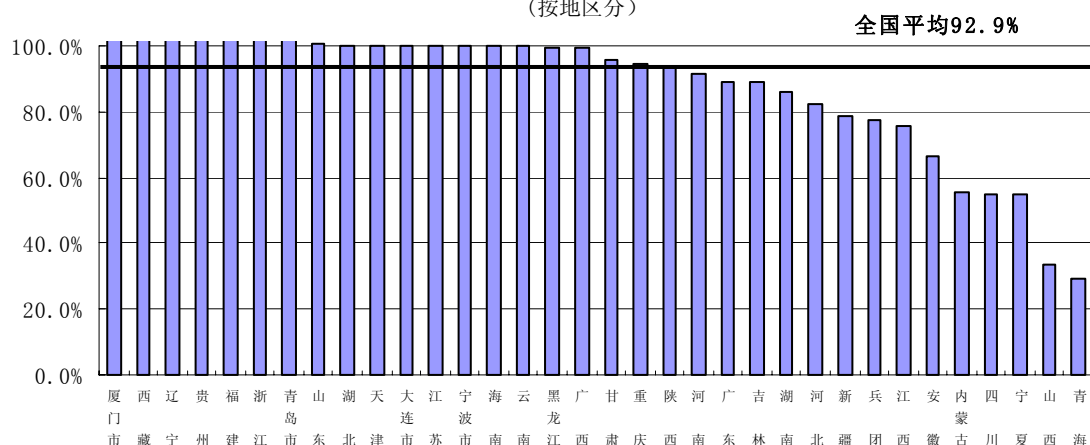

2010年中央水利投资已拨付项目单位中央投资274.0亿元，到位率为52.7%，其中农村饮水安全工程、大中型病险水库除险加固工程、大型灌区续建配套与节水改造工程和重大水利工程分别为172.4亿元、17.8亿元、22.2亿元和61.7亿元；已落实地方配套投资190.8亿元，落实率为43.2%，其中农村饮水安全工程、大中型病险水库除险加固工程、大型灌区续建配套与节水改造工程和重大水利工程分别为92.1亿元、11.2亿元、17.3亿元和70.3亿元。

### 三、前期工作和开工情况

2009年中央水利投资计划各地已分解落实水利建设项目4862个，其中第二、第三批中央水利投资计划项目3322个，第四批1540个。2010年中央水利投资计划已分解落实水利建设项目3321个。

1、项目开工情况。截至9月30日，第二、第三批中央水利投资计划项目已全部开工，完工项目数为2962个。第四批中央

水利投资计划项目中，全国已有 1537 个项目开工建设，开工率为 99.8%，未全部开工的有广东和甘肃，已有 1128 个项目完工。2010 年中央水利投资项目已有 2263 个项目开工建设，其中广西开工项目个数最多，达 209 个。


**2、前期工作情况。**根据已报送的数据，第二、第三批中央水利投资计划项目需开展招标的标段（标的）13685 个，已完成 12252 个，已完成招标投资 297.0 亿元，占需招标投资的 97.9%。第四批中央水利投资计划已有 1125 个项目完成初步设计或实施方案的编制或审查工作；854 个项目已完成技施设计；当前报送需开展招标的标段（标的）1825 个，已完成 1567 个，已完成招标投资 90.3 亿元，占需招标投资的 99.8%；623 个项目完成设备采购合同。2010 年中央水利投资计划有 2175 个项目完成初步设计或实施方案的编制或审查工作；1511 个项目完成技施设计；当前报送需开展招标的标段（标的）10748 个，已完成 8206 个，已完成招标投资 174.5 亿元，占需招标投资的 71.2%；1124 个项目完成设备采购合同。

#### **四、投资完成情况**

截至 9 月 30 日，第二、第三批投资已累计完成 530.3 亿元，其中中央投资 317.9 亿元，地方配套投资 212.4 亿元，投资计划完成率分别为 99.3%（见图 3）和 94.4%。在完成的中央投资中，农村饮水安全工程 152 亿元，已全部完成计划；大中型病险水库除险加固工程 86.9 亿元，占计划的 98.7%；重大水利工程 79.0


亿元，占计划的 98.8%。

图3 第二、三批扩大内需中央水利投资完成率

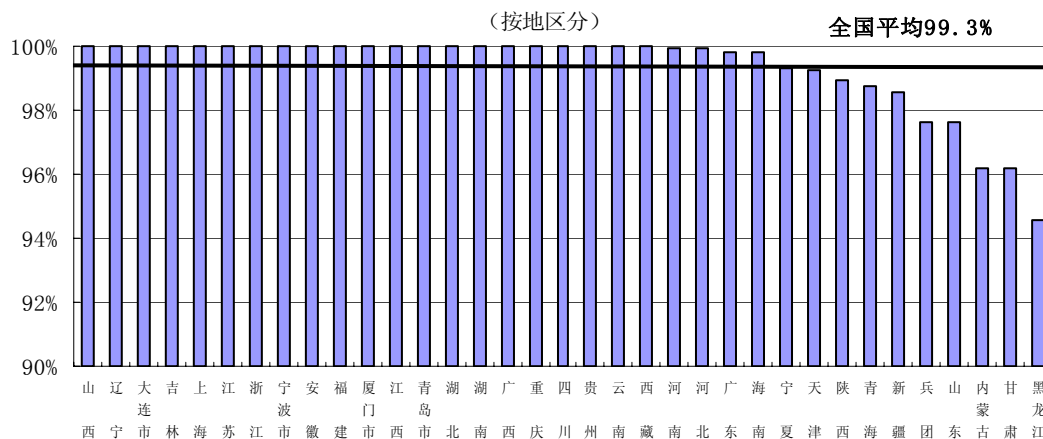


第四批投资已累计完成 204.7 亿元，其中中央投资 107.3 亿元，地方配套投资 97.4 亿元，投资计划完成率分别为 93.3% (见图 4) 和 89.3%。在完成的中央投资中，大型灌区续建配套与节水改造工程 31.5 亿元，占计划的 98.5%；重大水利工程完成投资 75.8 亿元，占计划的 91.2%。

图4 第四批扩大内需中央水利投资完成率

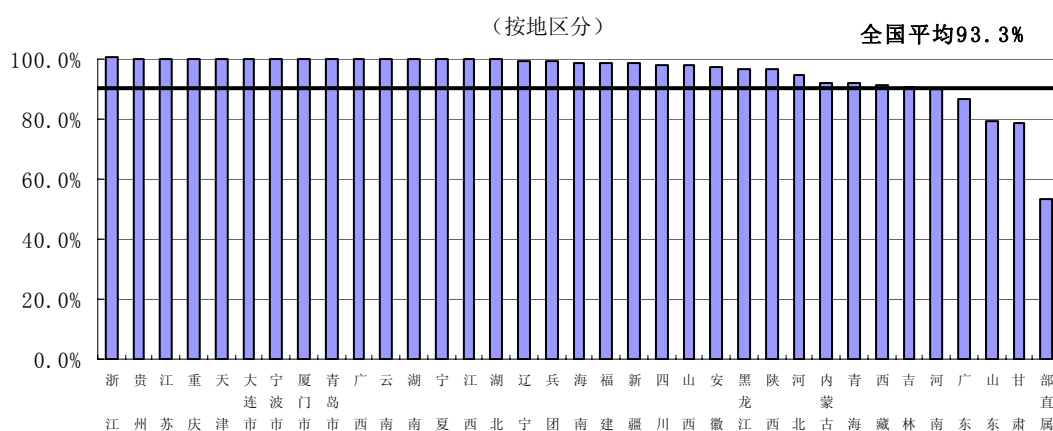

2010 年投资已累计完成 237.6 亿元，其中中央投资 149.9 亿元，地方配套投资 87.7 亿元，完成率分别为 28.8%（见图 5）和 19.8%。在完成的中央投资中，农村饮水安全工程 120.6 亿元，大中型病险水库除险加固工程 11.5 亿元，大型灌区续建配套与节水改造工程 3.6 亿元，重大水利工程 14.3 亿元。

图5 2010年扩大内需中央水利投资完成率

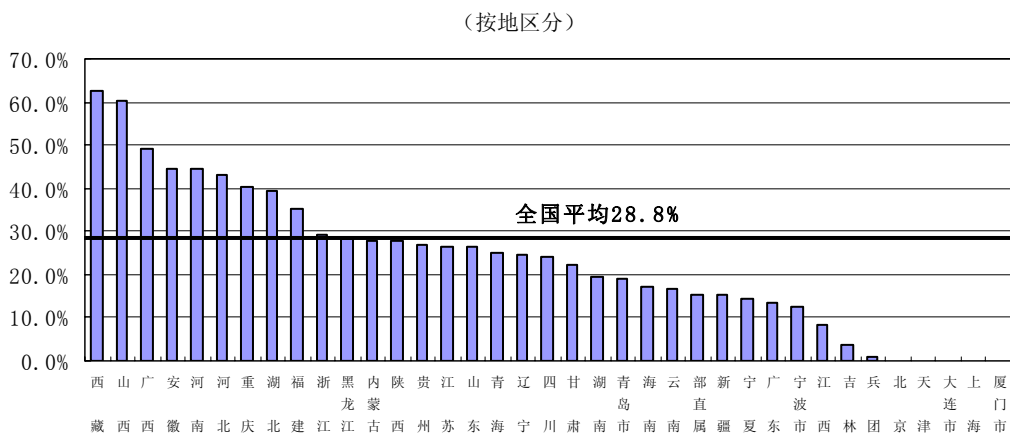

## 五、工程进展情况

2009 年中央水利投资计划已开工项目累计投入劳动力 31516.3 万工日，累计完成土方 94164.9 万方，石方 10929.6 万方，砼 1820.3 万方，金属结构 71.2 万吨。累计新建及加固堤防长度 2863.6 公里，河道清淤疏浚和岸线整治 531 公里，累计新增渠道整治和防渗长度 3147.0 公里，累计治理水土流失面积 7250.9 平方公里。

2010 年中央水利投资计划已开工项目累计投入劳动力 6884.2 万工日，累计完成土方 23518.8 万方，石方 1433.9 万方，

砼 278.9 万方，金属结构 8.6 万吨。累计解决农村饮水安全人口 2629.6 万人，累计新建及加固堤防长度 166.9 公里，河道清淤疏浚和岸线整治 85.8 公里，累计新增渠道整治和防渗长度 107.9 公里，累计治理水土流失面积 21.9 平方公里。

#### **六、2010 年中央水利投资计划数据报送情况**

请北京、大连和厦门水利（水务）厅（局）尽快分解下达 2010 年中央水利投资计划至项目单位，并及时报送旬报数据。

---

发送：部领导，总工程师、总规划师、副总工程师，部有关司局、直属单位；国家发展改革委投资司、农经司；监察部综合室；国家审计署投资司、农林水审计局；有关省（自治区、直辖市）政府主管领导、水利（水务）厅（局），有关计划单列市水利（水务）局，新疆生产建设兵团水利局。

---

共印 150 份
