

扩大内需以来中央水利投资计划落实情况

旬报

第 54 期

水利部规划计划司

2010 年 11 月 10 日

一、投资计划下达情况


2009 年共累计安排中央扩大内需第二、三、四批水利建设投资计划 435.03 亿元（不含南水北调 45 亿元），其中农村饮水安全工程、大中型病险水库除险加固工程、大型灌区续建配套与节水改造工程和重大水利工程分别投资 152 亿元、88 亿元、32 亿元和 163.03 亿元；要求地方配套投资共计 334 亿元（包括银行贷款）。截至 11 月 10 日，第二、三、四批中央水利投资计划和地方配套投资计划已全部下达。

2010 年已下达各省（区、市）中央水利投资计划 650.3 亿元（含中央水利建设基金 14.2 亿元），其中农村饮水安全工程、大中型病险水库除险加固工程、大型灌区续建配套与节水改造工程和重大水利工程分别投资 200 亿元、26.4 亿元、71.0 亿元和 352.8 亿元；要求地方配套 470.2 亿元。截至 11 月 10 日，2010 年中央水利投资计划各省（区、市）已下达到项目单位 441.9 亿元，投资计划下达率为 68.0%，其中农村饮水安全工程、大中型

病险水库除险加固工程、大型灌区续建配套与节水改造工程和重大水利工程分别下达 200 亿元、23.0 亿元、59.4 亿元和 159.4 亿元；已下达地方配套投资 307.9 亿元，占地方配套投资计划的 65.5%。

二、资金到位情况

截至 11 月 10 日，第二、第三批中央投资已全部拨付项目单位，第二、第三批地方配套投资已拨付 99.9%（见图 1），其中农村饮水安全工程拨付率为 100%，大中型病险水库除险加固工程为 97.0%，重大水利工程为 96.4%。

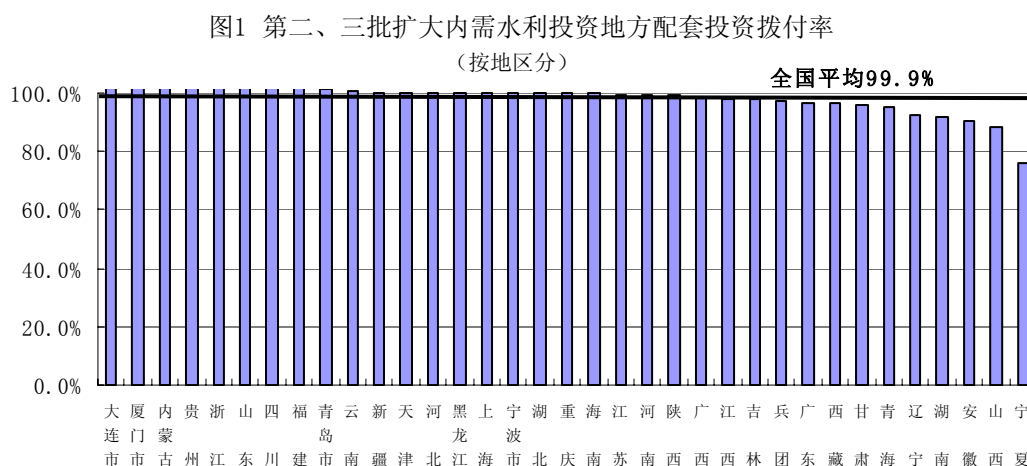

第四批中央投资已全部拨付项目单位，地方配套投资已拨付 91.6%（见图 2），其中大型灌区续建配套与节水改造工程已拨付 86.1%，重大水利工程已拨付 92.9%。


中央水利投资计划项目中，全国已有 1541 个项目开工建设，开工率为 99.9%，广东省遂溪县遂溪镇向阳移民安置区坡改梯综合治理项目未开工，已有 1184 个项目完工。2010 年中央水利投资项目已有 2955 个项目开工建设，其中广西开工项目个数最多，达 212 个。

2、前期工作情况。根据已报送的数据，第二、第三批中央水利投资计划项目需开展招标的标段（标的）13688 个，已完成 12256 个，已完成招标投资 297.1 亿元，占需招标投资的 97.9%。第四批中央水利投资计划已有 1125 个项目完成初步设计或实施方案的编制或审查工作；854 个项目已完成技施设计；当前报送需开展招标的标段（标的）1825 个，已完成 1568 个，已完成招标投资 90.5 亿元，占需招标投资的 99.9%；626 个项目完成设备采购合同。2010 年中央水利投资计划有 2625 个项目完成初步设计或实施方案的编制或审查工作；1922 个项目完成技施设计；当前报送需开展招标的标段（标的）15642 个，已完成 13662 个，已完成招标投资 264.2 亿元，占需招标投资的 71.5%；1464 个项目完成设备采购合同。


四、投资完成情况

截至 11 月 10 日，第二、第三批投资已累计完成 532.5 亿元，其中中央投资 319.4 亿元，地方配套投资 213.1 亿元，投资计划完成率分别为 99.8%（见图 3）和 94.7%。在完成的中央投资中，农村饮水安全工程 152 亿元，已全部完成计划；大中型病险水库

除险加固工程 87.7 亿元，占计划的 99.6%；重大水利工程 79.7 亿元，占计划的 99.6%。

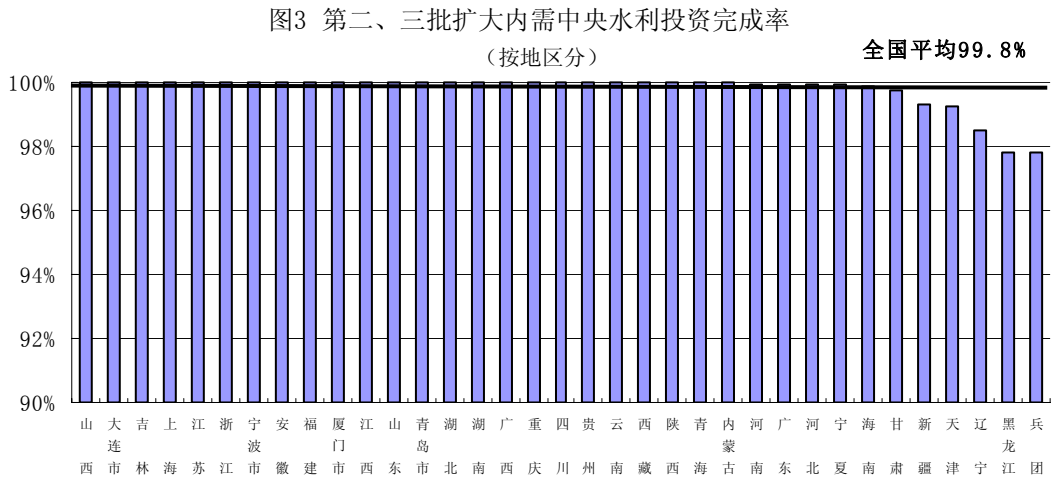

第四批投资已累计完成 207.7 亿元，其中中央投资 110.7 亿元，地方配套投资 97.1 亿元，投资计划完成率分别为 96.2% (见图 4) 和 89.0%。在完成的中央投资中，大型灌区续建配套与节水改造工程 31.6 亿元，占计划的 98.9%；重大水利工程完成投资 79.0 亿元，占计划的 95.2%。

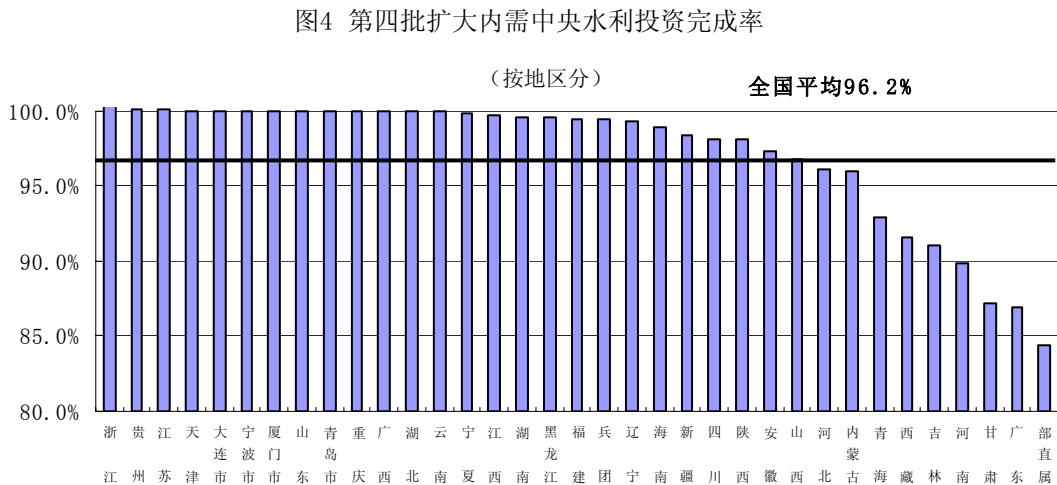

方，砼 532.0 万方，金属结构 20.1 万吨。累计解决农村饮水安全人口 4892.3 万人，累计新建及加固堤防长度 257.4 公里，河道清淤疏浚和岸线整治 96.9 公里，累计新增渠道整治和防渗长度 517.6 公里，累计治理水土流失面积 87.1 平方公里。

发送：部领导，总工程师、总规划师、副总工程师，部有关司局、直属单位；国家发展改革委投资司、农经司；监察部综合室；国家审计署投资司、农林水审计局；有关省（自治区、直辖市）政府主管领导、水利（水务）厅（局），有关计划单列市水利（水务）局，新疆生产建设兵团水利局。

共印 130 份
