

扩大内需以来中央水利投资计划落实情况

旬报

第 56 期

水利部规划计划司

2010 年 11 月 30 日

一、投资计划下达情况


2009 年共累计安排中央扩大内需第二、三、四批水利建设投资计划 435.03 亿元（不含南水北调 45 亿元），其中农村饮水安全工程、大中型病险水库除险加固工程、大型灌区续建配套与节水改造工程和重大水利工程分别投资 152 亿元、88 亿元、32 亿元和 163.03 亿元；要求地方配套投资共计 334 亿元（包括银行贷款）。截至 11 月 30 日，第二、三、四批中央水利投资计划和地方配套投资计划已全部下达。

2010 年已下达中央水利投资计划 650.3 亿元（含中央水利建设基金 14.2 亿元），其中农村饮水安全工程、大中型病险水库除险加固工程、大型灌区续建配套与节水改造工程和重大水利工程分别投资 200 亿元、26.4 亿元、71.0 亿元和 352.8 亿元；要求地方配套 470.2 亿元。截至 11 月 30 日，2010 年中央水利投资计划已下达到项目单位 488.8 亿元，投资计划下达率为 75.2%，其中农村饮水安全工程、大中型病险水库除险加固工程、大型灌

区续建配套与节水改造工程和重大水利工程分别下达 200 亿元、24.7 亿元、62.9 亿元和 201.2 亿元；已下达地方配套投资 346.0 亿元，占地方配套投资计划的 73.6%。


二、资金到位情况

截至 11 月 30 日，第二、第三批中央投资已全部拨付项目单位，第二、第三批地方配套投资已拨付 99.9%（见图 1），其中农村饮水安全工程拨付率为 100%，大中型病险水库除险加固工程为 97.0%，重大水利工程为 96.4%。

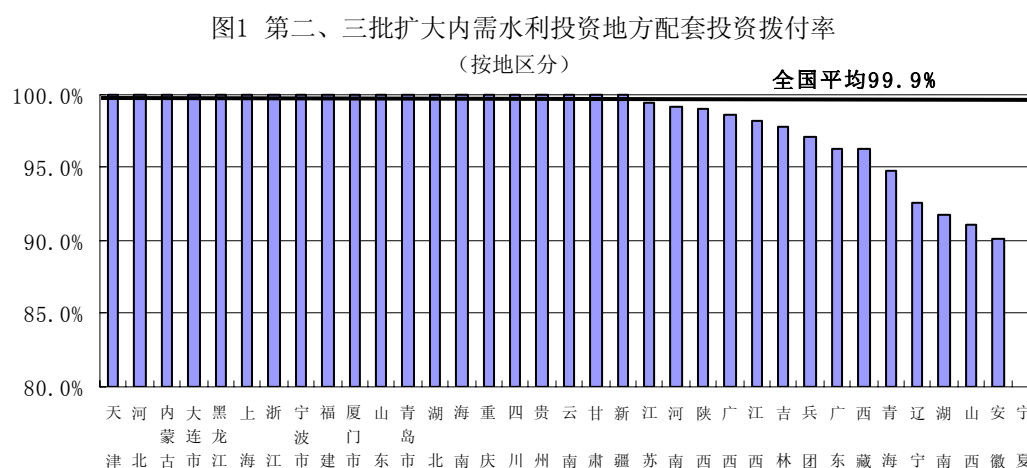

第四批中央投资已全部拨付项目单位，地方配套投资已拨付 92.0%（见图 2），其中大型灌区续建配套与节水改造工程已拨付 86.2%，重大水利工程已拨付 93.3%。

图2 第四批扩大内需水利投资地方配套投资拨付率
(按地区分)

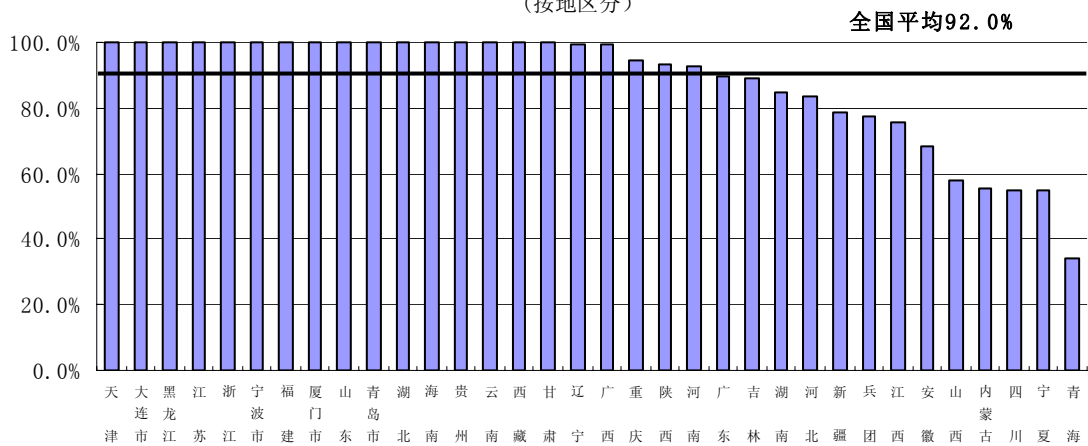

2010年中央水利投资已拨付项目单位中央投资429.9亿元，到位率为66.1%，其中农村饮水安全工程、大中型病险水库除险加固工程、大型灌区续建配套与节水改造工程和重大水利工程分别为199.0亿元、23.0亿元、54.3亿元和153.7亿元；已落实地方配套投资305.9亿元，落实率为65.0%，其中农村饮水安全工程、大中型病险水库除险加固工程、大型灌区续建配套与节水改造工程和重大水利工程分别为114.9亿元、12.9亿元、30.8亿元和147.2亿元。

三、前期工作和开工情况

2009年中央水利投资计划各地已分解落实水利建设项目4864个，其中第二、第三批中央水利投资计划项目3322个，第四批1542个。2010年中央水利投资计划已分解落实水利建设项目3828个。

1、项目开工情况。截至11月30日，第二、第三批中央水利投资计划项目已全部开工，完工项目数为3017个。第四批中


中央水利投资计划项目已全部开工，完工项目数为 1213 个。2010 年中央水利投资项目已有 3234 个项目开工建设，其中广西开工项目个数最多，达 222 个。

2、前期工作情况。根据已报送的数据，第二、第三批中央水利投资计划项目需开展招标的标段（标的）13688 个，已完成 12450 个，已完成招标投资 298.5 亿元，占需招标投资的 98.4%。第四批中央水利投资计划已有 1125 个项目完成初步设计或实施方案的编制或审查工作；855 个项目已完成技施设计；当前报送需开展招标的标段（标的）1825 个，已完成 1571 个，已完成招标投资 90.7 亿元，占需招标投资的 99.9%；628 个项目完成设备采购合同。2010 年中央水利投资计划有 2756 个项目完成初步设计或实施方案的编制或审查工作；2052 个项目完成技施设计；当前报送需开展招标的标段（标的）17936 个，已完成 15968 个，已完成招标投资 281.4 亿元，占需招标投资的 73.4%；1663 个项目完成设备采购合同。

四、投资完成情况


截至 11 月 30 日，第二、第三批投资已累计完成 534.0 亿元，其中中央投资 319.5 亿元，地方配套投资 214.5 亿元，投资计划完成率分别为 99.8%（见图 3）和 95.3%。在完成的中央投资中，农村饮水安全工程 152 亿元，已全部完成计划；大中型病险水库除险加固工程 87.7 亿元，占计划的 99.6%；重大水利工程 79.8 亿元，占计划的 99.8%。

图3 第二、三批扩大内需中央水利投资完成率

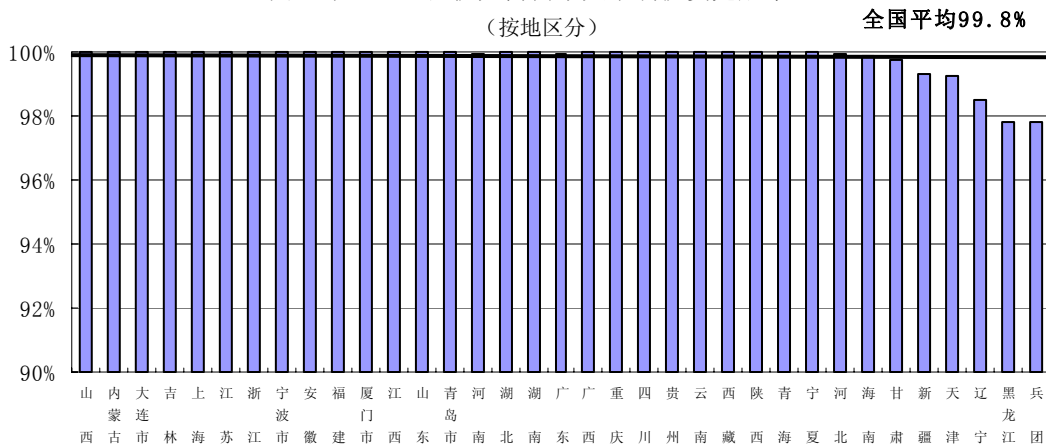

第四批投资已累计完成 209.4 亿元，其中中央投资 111.3 亿元，地方配套投资 98.0 亿元，投资计划完成率分别为 96.8%（见图 4）和 89.9%。在完成的中央投资中，大型灌区续建配套与节水改造工程 31.6 亿元，占计划的 98.9%；重大水利工程完成投资 79.7 亿元，占计划的 96.0%。

图4 第四批扩大内需中央水利投资完成率

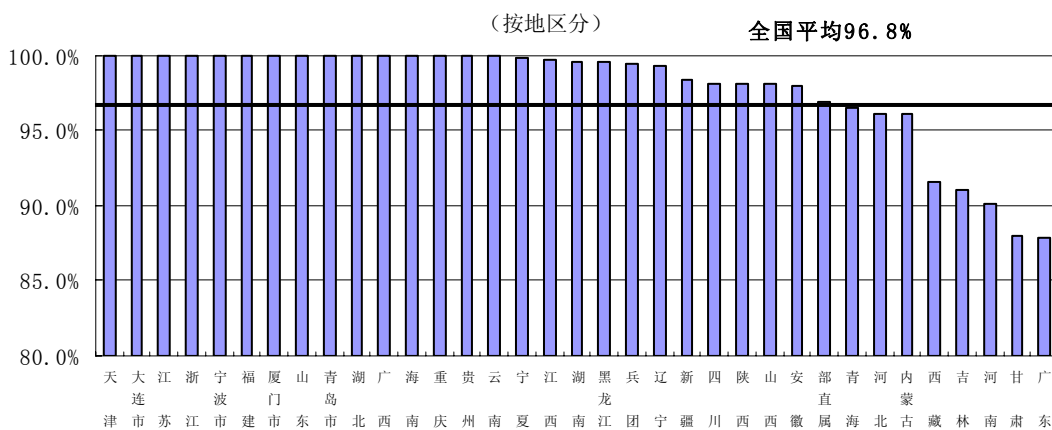

2010 年投资已累计完成 518.0 亿元，其中中央投资 305.3

全人口 5998.8 万人，累计新建及加固堤防长度 262.0 公里，河道清淤疏浚和岸线整治 122.6 公里，累计新增渠道整治和防渗长度 670.1 公里，累计治理水土流失面积 165.2 平方公里。

发送：部领导，总工程师、总规划师、副总工程师，部有关司局、直属单位；国家发展改革委投资司、农经司；监察部综合室；国家审计署投资司、农林水审计局；有关省（自治区、直辖市）政府主管领导、水利（水务）厅（局），有关计划单列市水利（水务）局，新疆生产建设兵团水利局。

共印 130 份
