

扩大内需以来中央水利投资计划落实情况

旬报

第 59 期

水利部规划计划司

2010 年 12 月 31 日

一、投资计划下达情况

2009 年共累计安排中央扩大内需第二、三、四批水利建设投资计划 435.03 亿元（不含南水北调 45 亿元），其中农村饮水安全工程、大中型病险水库除险加固工程、大型灌区续建配套与节水改造工程和重大水利工程分别投资 152 亿元、88 亿元、32 亿元和 163.03 亿元；要求地方配套投资共计 334 亿元（包括银行贷款）。截至 12 月 31 日，第二、三、四批中央水利投资计划和地方配套投资计划已全部下达。

2010 年已下达中央水利投资计划 650.3 亿元（含中央水利建设基金 14.2 亿元），其中农村饮水安全工程、大中型病险水库除险加固工程、大型灌区续建配套与节水改造工程和重大水利工程分别投资 200 亿元、26.4 亿元、71.0 亿元和 352.8 亿元；要求地方配套 487.1 亿元。截至 12 月 31 日，2010 年中央水利投资计划已下达到项目单位 549.7 亿元，投资计划下达率为 84.5%，其中农村饮水安全工程、大中型病险水库除险加固工程、大型灌

区续建配套与节水改造工程和重大水利工程分别下达 200 亿元、24.3 亿元、64.6 亿元和 260.7 亿元；已下达地方配套投资 419.3 亿元，占地方配套投资计划的 86.1%。

二、资金到位情况

截至 12 月 31 日，第二、第三批中央投资已全部拨付项目单位，地方配套投资拨付率低于 95% 的有西藏、宁夏、山西、湖南、安徽、青海、广东。农村饮水安全工程拨付率为 100%，大中型病险水库除险加固工程为 97.5%，重大水利工程为 96.4%。

第四批中央投资已全部拨付项目单位，地方配套投资已拨付 92.7%，其中低于 80% 的有青海、西藏、宁夏、内蒙古、四川、山西、安徽、江西、兵团、新疆。大型灌区续建配套与节水改造工程已拨付 91.2%，重大水利工程已拨付 93.0%。

2010 年中央水利投资已拨付项目单位中央投资 494.9 亿元，到位率为 76.1%，其中农村饮水安全工程、大中型病险水库除险加固工程、大型灌区续建配套与节水改造工程和重大水利工程分别为 200.0 亿元、23.3 亿元、58.6 亿元和 213.0 亿元；已落实地方配套投资 384.6 亿元，落实率为 79.0%，其中农村饮水安全工程、大中型病险水库除险加固工程、大型灌区续建配套与节水改造工程和重大水利工程分别为 116.2 亿元、13.9 亿元、35.8 亿元和 218.7 亿元。

三、前期工作和开工情况

2009 年中央水利投资计划各地已分解落实水利建设项目

4864 个，其中第二、第三批中央水利投资计划项目 3322 个，第四批 1542 个。2010 年中央水利投资计划已分解落实水利建设项目 4196 个。


1、**项目开工情况。**截至 12 月 31 日，第二、第三批中央水利投资计划项目已全部开工，完工项目数为 3098 个。第四批中央水利投资计划项目已全部开工，完工项目数为 1262 个。2010 年中央水利投资项目已有 3631 个项目开工建设。

2、**前期工作情况。**根据已报送的数据，第二、第三批中央水利投资计划项目需开展招标的标段（标的）13688 个，已完成 12450 个，已完成招标投资 298.6 亿元，占需招标投资的 98.4%。第四批中央水利投资计划已有 1125 个项目完成初步设计或实施方案的编制或审查工作；857 个项目已完成技施设计；当前报送需开展招标的标段（标的）1825 个，已完成 1572 个，已完成招标投资 90.7 亿元，占需招标投资的 99.9%；628 个项目完成设备采购合同。2010 年中央水利投资计划有 3019 个项目完成初步设计或实施方案的编制或审查工作；2233 个项目完成技施设计；当前报送需开展招标的标段（标的）18378 个，已完成 16806 个，已完成招标投资 330.4 亿元，占需招标投资的 73.2%；1836 个项目完成设备采购合同。


四、投资完成情况

截至 12 月 31 日，第二、第三批投资已累计完成 536.7 亿元，其中中央投资 319.9 亿元，地方配套投资 216.8 亿元，投资计划

完成率分别为 99.9%（见图 1）和 96.4%。在完成的中央投资中，农村饮水安全工程 152 亿元，已全部完成计划；大中型病险水库除险加固工程 87.9 亿元，占计划的 99.9%；重大水利工程 79.8 亿元，占计划的 99.8%。

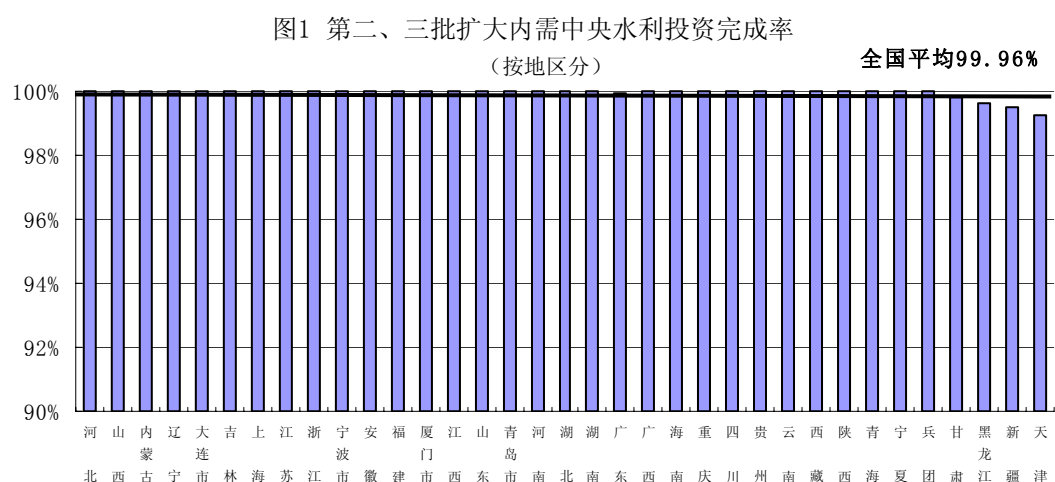


第四批投资已累计完成 213.1 亿元，其中中央投资 112.5 亿元，地方配套投资 100.6 亿元，投资计划完成率分别为 97.8%（见图 2）和 92.2%。在完成的中央投资中，大型灌区续建配套与节水改造工程 31.8 亿元，占计划的 99.4%；重大水利工程完成投资 80.7 亿元，占计划的 97.2%。

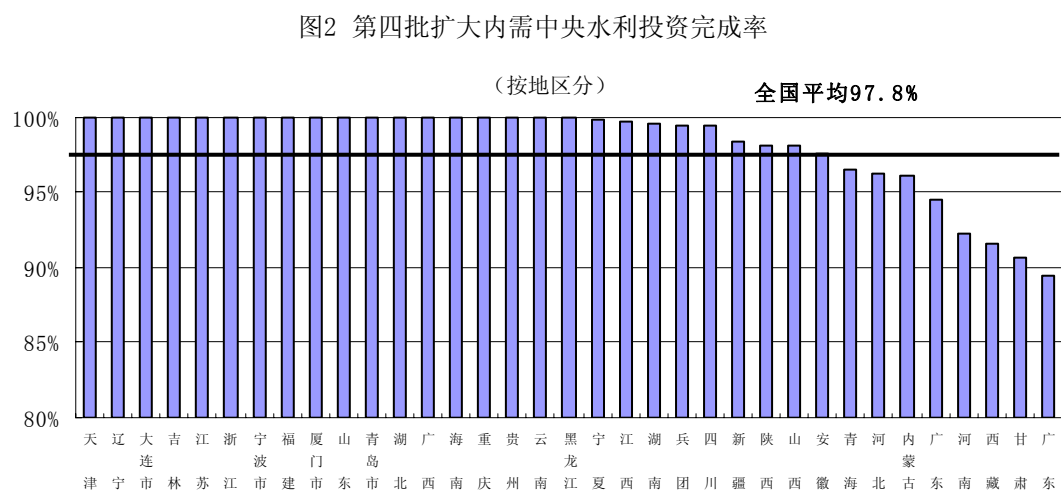

2010 年投资已累计完成 655.4 亿元，其中中央投资 384.2 亿元，地方配套投资 271.2 亿元，完成率分别为 59.1%（见图 3）和 55.7%。在完成的中央投资中，农村饮水安全工程 199.7 亿元，占计划的 99.8%；大中型病险水库除险加固工程 20.3 亿元，占计划的 76.9；大型灌区续建配套与节水改造工程 37.4 亿元，占计划的 52.7%；重大水利工程 126.8 亿元，占计划的 35.9%。

图3 2010年扩大内需中央水利投资完成率

（按地区分）

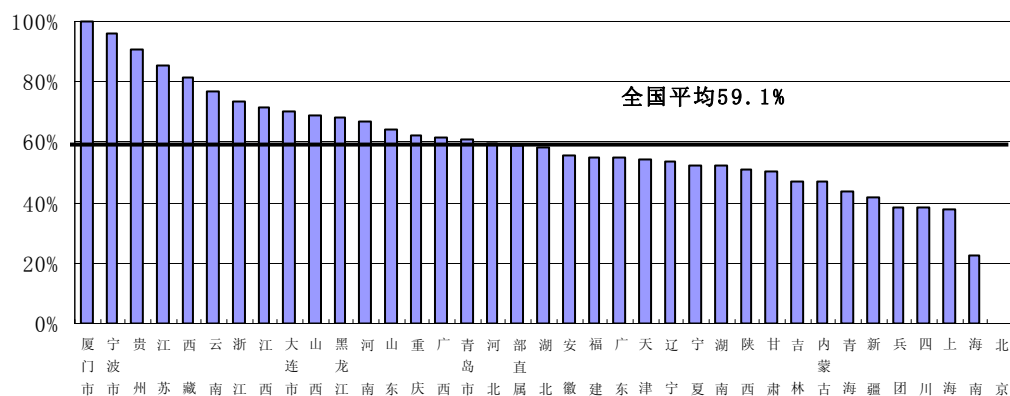

五、工程进展情况

2009 年中央水利投资计划已开工项目累计投入劳动力 32797.8 万工日，累计完成土方 95974.4 万方，石方 11049.8 万方，砼 1872.9 万方，金属结构 72.3 万吨。累计新建及加固堤防长度 2865.9 公里，河道清淤疏浚和岸线整治 535 公里，累计新增渠道整治和防渗长度 3148.9 公里，累计治理水土流失面积 7252.8 平方公里。

2010 年中央水利投资计划已开工项目累计投入劳动力 14121.8 万工日，累计完成土方 59517.0 万方，石方 4347.1 万

方，砼 835.2 万方，金属结构 26.2 万吨。累计解决农村饮水安全人口 6186 万人，累计新建及加固堤防长度 352.6 公里，河道清淤疏浚和岸线整治 151.3 公里，累计新增渠道整治和防渗长度 1165.7 公里，累计治理水土流失面积 350.2 平方公里。

请各省（区、市）水利（水务）厅（局）逐级落实责任，强化各级旬报填报人和审核人的责任感，加强旬报数据的审核把关，确保旬报数据准确及时报送。

发送：部领导，总工程师、总规划师、副总工程师，部有关司局、直属单位；国家发展改革委投资司、农经司；监察部综合室；国家审计署投资司、农林水审计局；有关省（自治区、直辖市）政府主管领导、水利（水务）厅（局），有关计划单列市水利（水务）局，新疆生产建设兵团水利局。

共印 130 份
