

# 中央水利投资计划执行情况

# 旬报

第 4 期

水利部规划计划司

2011 年 2 月 20 日

---

2010 年累计安排中央水利投资计划 908.3 亿元（不含南水北调 65 亿元），其中中央预算内投资 650.3 亿元（含中央水利建设基金 14.2 亿元），主要安排农村饮水安全工程 200 亿元、大中型病险水库除险加固工程 26.4 亿元、大型灌区续建配套与节水改造工程 71.0 亿元、重大水利工程 352.8 亿元；中央财政水利专项资金 258 亿元，主要安排中小河流治理 80 亿元、小型病险水库除险加固 100 亿元、小型农田水利建设 78 亿元。

## 一、投资计划下达情况

2010 年中央预算内水利投资 650.3 亿元，要求地方配套投资 487.1 亿元。截至 2011 年 2 月 20 日，已下达到项目单位中央投资计划 630.6 亿元，地方配套投资计划 467.3 亿元，投资计划下达率分别为 97.0%和 95.9%。其中农村饮水安全工程、大中型病险水库除险加固工程、大型灌区续建配套与节水改造工程、重大水利工程分别下达中央投资计划 200 亿元、26.3 亿元、70.0 亿元、334.3 亿元，投资计划下达率分别为 100%、99.6%、98.6%

和 94.7%。

2010 年中央财政水利专项投资计划涉及中央投资 258 亿元，截至 2011 年 2 月 20 日，共下达项目单位中央投资计划 240.5 亿元，投资计划下达率为 93.2%；当前报送地方自行配套投资 144.4 亿元，计划下达率为 94.1%；其中中小河流治理、小型病险水库除险加固和小型农田水利建设分别下达中央投资 75.9 亿元、87.5 亿元和 77.1 亿元，投资计划下达率分别为 94.9%、87.5% 和 98.8%。

## 二、资金到位情况

截至 2011 年 2 月 20 日，2010 年中央预算内水利投资计划已拨付到位项目单位中央投资 581.4 亿元，地方配套投资 383.6 亿元，到位率分别为 89.4%和 78.8%（见图 1）。其中，农村饮水安全工程、大中型病险水库除险加固工程、大型灌区续建配套与节水改造工程、重大水利工程分别拨付到位地方配套投资 116.2 亿元、13.3 亿元、32.9 亿元、221.1 亿元，到位率分别为 100%、84.4%、71.6%和 69.6%。



专项投资计划 3527 个。

1、项目开工情况。截至 2011 年 2 月 20 日，2010 年中央水利投资项目共有 7216 个项目开工建设，开工率为 85.0%。其中中央预算内水利投资计划开工 4289 个，中央财政水利专项投资计划开工 2927 个，开工率分别为 86.5%和 83.0%。


2、前期工作情况。截至 2011 年 2 月 20 日，2010 年中央预算内水利投资计划共有 3995 个项目完成初步设计或实施方案的编制或审查工作；3584 个项目完成技施设计；当前报送需开展招标的标段（标的）19233 个，已完成 18457 个，已完成招标投标投资 404.5 亿元，占需招标投标投资的 81.9%；2199 个项目完成设备采购合同。2010 年中央财政水利专项投资计划有 2544 个项目完成初步设计或实施方案的编制或审查工作；1973 个项目完成技施设计；当前报送需开展招标的标段（标的）3676 个，已完成 3203 个，已完成招标投标投资 125.4 亿元；1108 个项目完成设备采购合同。

#### 四、投资完成情况

截至 2011 年 2 月 20 日，2010 年中央预算内水利投资计划已累计完成投资 748.1 亿元，其中中央投资 441.3 亿元，地方配套投资 306.9 亿元，完成率分别为 67.9%（见图 3）和 63.0%。在完成的中央投资中，农村饮水安全工程 199.8 亿元、大中型病险水库除险加固工程 21.7 亿元、大型灌区续建配套与节水改造工程 44.0 亿元、重大水利工程 175.7 亿元，完成率分别为 99.9%、


82.2%、62.0%和 49.8%。

图3 2010年中央预算内投资完成率  
(按地区分)

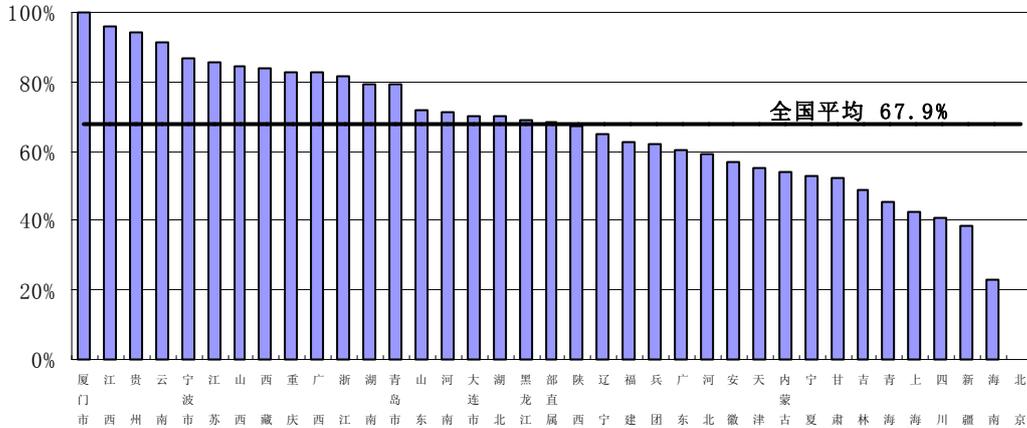

2010年中央财政水利专项投资计划已累计完成212.5亿元，其中中央投资130.3亿元，地方配套投资82.2亿元，完成率分别为50.5%（见图4）和53.6%。在完成的中央投资中，中小河流治理34.4亿元、小型病险水库除险加固49.6亿元、小型农田水利建设46.2亿元，完成率分别为43.0%、49.6%和59.3%。

图4 2010年中央财政水利专项投资完成率  
(按地区分)

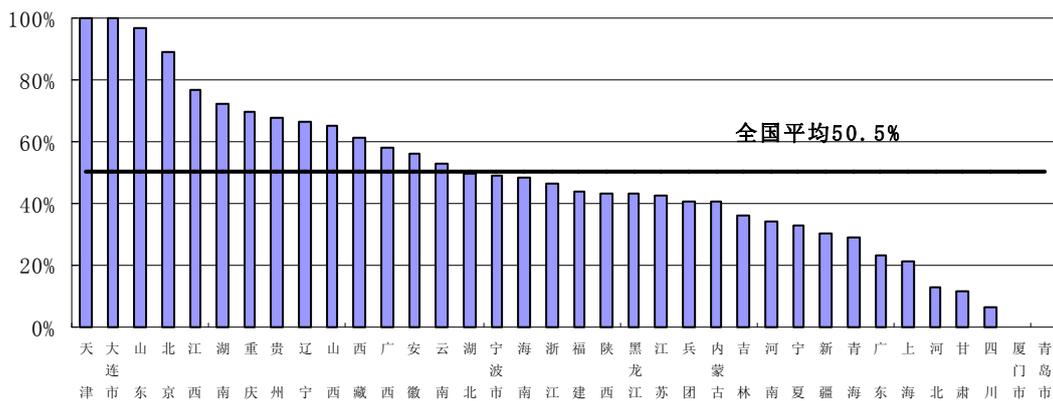

## 五、工程进展情况

2010年中央水利投资计划已开工项目累计投入劳动力

17148.4 万工日，累计完成土方 79861.1 万方，石方 7981.7 万方，砼 1706.6 万方，金属结构 30.3 万吨。累计解决农村饮水安全人口 6186.4 万人，累计新建及加固堤防长度 675.2 公里，河道清淤疏浚和岸线整治 552.7 公里，累计新增渠道整治和防渗长度 2498.7 公里，累计治理水土流失面积 1876.9 平方公里。

---

发送：部领导，总工程师、总规划师，部有关司局、直属单位；国家发展改革委投资司、农经司；财政部经建司、农业司；监察部综合室；国家审计署投资司、农林水审计局；有关省（自治区、直辖市）政府主管领导、水利（水务）厅（局），有关计划单列市水利（水务）局，新疆生产建设兵团水利局。

---

共印 130 份
