

中央水利投资计划执行情况

旬报

第 7 期

水利部规划计划司

2011 年 3 月 20 日

2010 年累计安排中央水利投资计划 908.3 亿元（不含南水北调 65 亿元），其中中央预算内投资 650.3 亿元（含中央水利建设基金 14.2 亿元），主要安排农村饮水安全工程 200 亿元、大中型病险水库除险加固工程 26.4 亿元、大型灌区续建配套与节水改造工程 71.0 亿元、重大水利工程 352.8 亿元；中央财政水利专项资金 258 亿元，主要安排中小河流治理 80 亿元、小型病险水库除险加固 100 亿元、小型农田水利建设 78 亿元。

一、投资计划下达情况

2010 年中央预算内水利投资 650.3 亿元，要求地方配套投资 487.1 亿元。截至 2011 年 3 月 20 日，已下达到项目单位中央投资计划 637.2 亿元，地方配套投资计划 470.7 亿元，投资计划下达率分别为 98.0%和 96.6%。其中农村饮水安全工程、大中型病险水库除险加固工程、大型灌区续建配套与节水改造工程、重大水利工程分别下达中央投资计划 200 亿元、26.2 亿元、70.3 亿元、340.7 亿元，投资计划下达率分别为 100%、99.1%、


99.0%和 96.6%。

2010 年中央财政水利专项投资计划涉及中央投资 258 亿元,截至 2011 年 3 月 20 日,共下达项目单位中央投资计划 239.6 亿元,投资计划下达率为 92.9%;当前报送地方自行配套投资 148.3 亿元,计划下达率为 95.2%;其中中小河流治理、小型病险水库除险加固和小型农田水利建设分别下达中央投资 74.2 亿元、88.5 亿元和 77.0 亿元,投资计划下达率分别为 92.7%、88.5%和 98.7%。

二、资金到位情况


截至 2011 年 3 月 20 日,2010 年中央预算内水利投资计划已拨付到位项目单位中央投资 606.6 亿元,地方配套投资 394.8 亿元,到位率分别为 93.3%和 81.0%(见图 1)。其中,农村饮水安全工程、大中型病险水库除险加固工程、大型灌区续建配套与节水改造工程、重大水利工程分别拨付到位地方配套投资 116.4 亿元、13.8 亿元、33.6 亿元、231.0 亿元,到位率分别为 100%、87.0%、73.1%和 72.7%。

图1 2010年中央预算内投资地方配套投资拨付率
(按地区分)

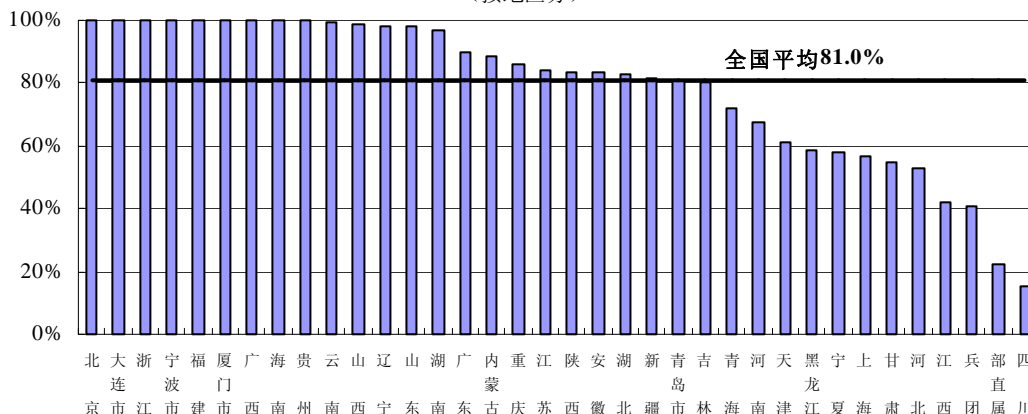

2010年中央财政水利专项投资计划已拨付到位项目单位中央投资232.3亿元，地方配套投资125.7亿元，到位率分别为90.0%和80.7%（见图2）。其中，中小河流治理、小型病险水库除险加固和小型农田水利建设分别拨付到位地方配套投资29.7亿元、16.4亿元和79.6亿元，到位率分别为83.9%、71.4%和81.8%。

图2 2010年中央财政水利专项投资计划地方配套投资拨付率
(按地区分)

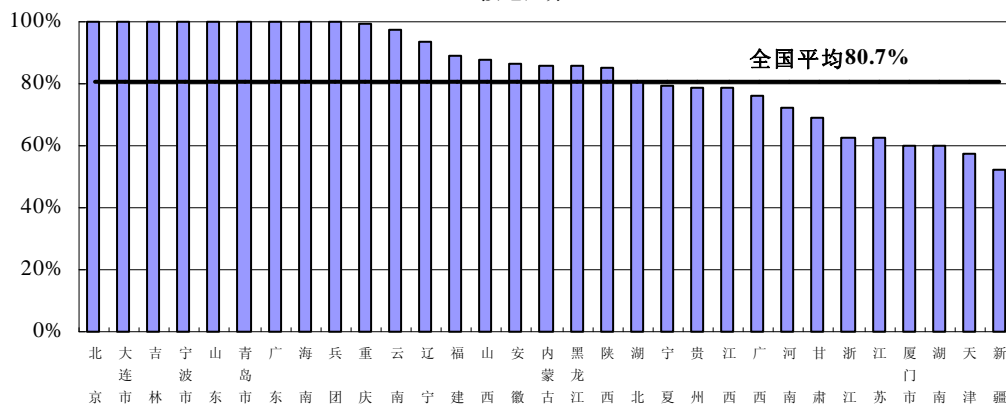

三、前期工作和开工情况

2010年中央水利投资计划已分解落实水利建设项目8599

个，其中中央预算内水利建设投资计划 5303 个，中央财政水利专项投资计划 3296 个。

1、项目开工情况。截至 2011 年 3 月 20 日，2010 年中央水利投资项目共有 7495 个项目开工建设，开工率为 87.2%。其中中央预算内水利投资计划开工 4695 个，中央财政水利专项投资计划开工 2800 个，开工率分别为 88.5%和 85.0%。


2、前期工作情况。截至 2011 年 3 月 20 日，2010 年中央预算内水利投资计划共有 4333 个项目完成初步设计或实施方案的编制或审查工作；3897 个项目完成技施设计；当前报送需开展招标的标段（标的）20219 个，已完成 18383 个，已完成招标投资 422.6 亿元，占需招标投资的 76.2%；2509 个项目完成设备采购合同。2010 年中央财政水利专项投资计划有 2384 个项目完成初步设计或实施方案的编制或审查工作；2049 个项目完成技施设计；当前报送需开展招标的标段（标的）4240 个，已完成 3737 个，已完成招标投资 146.1 亿元；762 个项目完成设备采购合同。

四、投资完成情况

截至 2011 年 3 月 20 日，2010 年中央预算内水利投资计划已累计完成投资 813.6 亿元，其中中央投资 478.3 亿元，地方配套投资 335.3 亿元，完成率分别为 73.6%（见图 3）和 68.8%。在完成的中央投资中，农村饮水安全工程 199.8 亿元、大中型病险水库除险加固工程 22.6 亿元、大型灌区续建配套与节水改


造工程 49.1 亿元、重大水利工程 206.8 亿元，完成率分别为 99.9%、85.5%、69.1%和 58.6%。

图3 2010年中央预算内投资完成率
(按地区分)

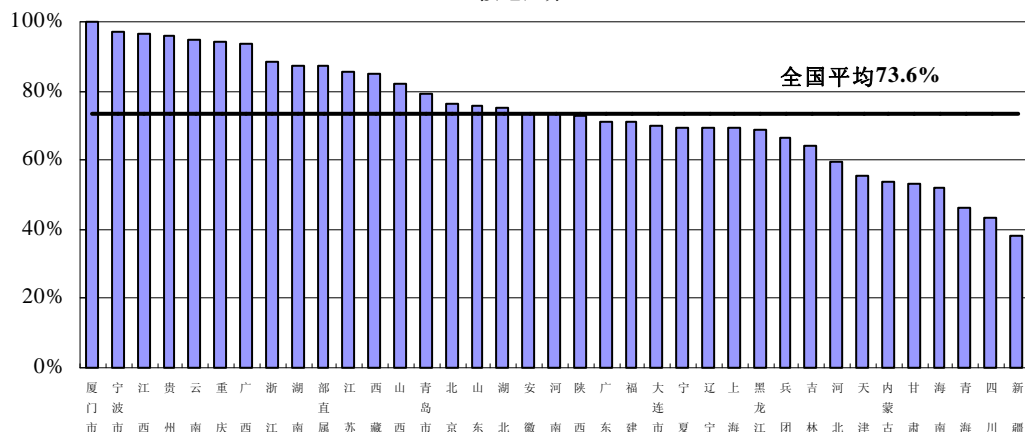

2010 年中央财政水利专项投资计划已累计完成 248.5 亿元，其中中央投资 156.9 亿元，地方配套投资 91.6 亿元，完成率分别为 60.8%（见图 4）和 58.8%。在完成的中央投资中，中小河流治理 41.2 亿元、小型病险水库除险加固 58.3 亿元、小型农田水利建设 57.4 亿元，完成率分别为 51.5%、58.3%和 73.6%。

图4 2010年中央财政水利专项投资完成率
(按地区分)

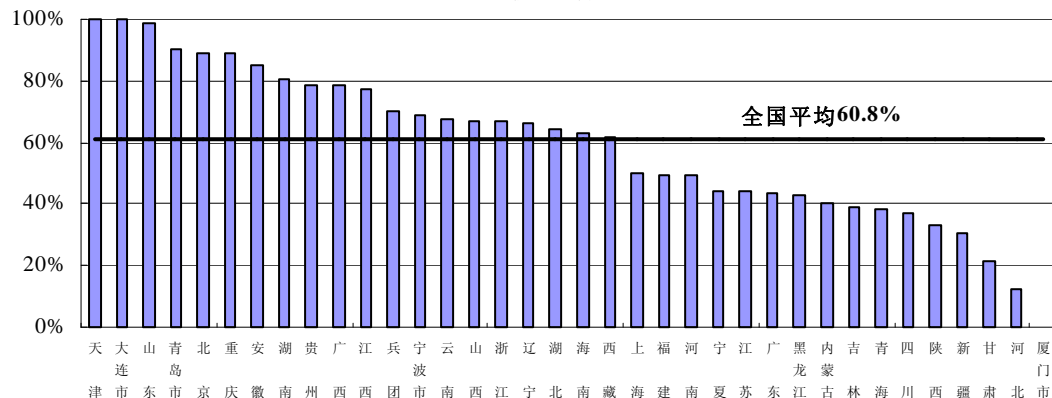

五、工程进展情况

2010 年中央水利投资计划已开工项目累计投入劳动力 18687.9 万工日，累计完成土方 92432.8 万方，石方 9679.0 万方，砼 1667.7 万方，金属结构 32.6 万吨。累计解决农村饮水安全人口 6186.4 万人，累计新建及加固堤防长度 1076.1 公里，河道清淤疏浚和岸线整治 676.8 公里，累计新增渠道整治和防渗长度 8108.3 公里，累计治理水土流失面积 2007.8 平方公里。

上期旬报中，甘肃将部分小型病险水库除险加固工程相关数据误报为大中型病险水库除险加固工程，本期更正，导致本期大中型病险水库除险加固工程数据变小。

本期旬报起，安徽不再将没有中央财政投资只有地方投资的小型病险水库除险加固工程列入报送范围，导致本期小型病险水库除险加固工程拨付到位投资变小，而到位率变大。

陕西小型农田水利建设数据报送有误，本期更正。

请各省（自治区、直辖市）水利（水务）厅（局）加强旬报数据报送质量，严格做好数据审核工作。

发送：部领导，总工程师、总规划师，部有关司局、直属单位；国家发展改革委投资司、农经司；财政部经建司、农业司；监察部综合室；国家审计署投资司、农林水审计局；有关省（自治区、直辖市）政府主管领导、水利（水务）厅（局），有关计划单列市水利（水务）局，新疆生产建设兵团水利局。

共印 130 份
