

中央水利投资计划执行情况

旬报

第 13 期

水利部规划计划司

2011 年 5 月 20 日

2010 年累计安排中央水利投资计划 908.3 亿元（不含南水北调 65 亿元），其中中央预算内投资 650.3 亿元（含中央水利建设基金 14.2 亿元），主要安排农村饮水安全工程 200 亿元、大中型病险水库除险加固工程 26.4 亿元、大型灌区续建配套与节水改造工程 71.0 亿元、重大水利工程 352.8 亿元；中央财政水利专项资金 258 亿元，主要安排中小河流治理 80 亿元、小型病险水库除险加固 100 亿元、小型农田水利建设 78 亿元。

2011 年累计安排中央水利投资计划 406.2 亿元，其中中央预算内投资 90.2 亿元，主要安排农村饮水安全工程 40 亿元、大型灌区续建配套与节水改造工程 20 亿元、重大水利工程 30.2 亿元；中央财政水利专项资金 316 亿元，主要安排中小河流治理 90 亿元、小型病险水库除险加固 158 亿元、小型农田水利建设 68 亿元。

一、投资计划下达情况

2010 年中央预算内水利投资 650.3 亿元，要求地方配套投

资 487.1 亿元。截至 2011 年 5 月 20 日，已下达到项目单位中央投资计划 647.0 亿元、地方配套投资计划 504.4 亿元，投资计划下达率分别为 99.5%和 100%。其中农村饮水安全工程、大中型病险水库除险加固工程、大型灌区续建配套与节水改造工程、重大水利工程分别下达中央投资计划 200 亿元、26.4 亿元、70.8 亿元、349.8 亿元，投资计划下达率分别为 100%、100%、99.7%和 99.1%。

2010 年中央财政水利专项资金预算共 258 亿元，截至 2011 年 5 月 20 日，共分解下达到项目单位 246.3 亿元，预算分解下达率为 95.5%，其中中小河流治理、小型病险水库除险加固和小型农田水利建设分别下达 79.6 亿元、89.6 亿元和 77.2 亿元，预算分解下达率分别为 99.4%、89.6%和 99.0%。当前下达地方预算 152.4 亿元，下达率为 95.1%。

2011 年中央预算内水利投资 90.2 亿元，要求地方配套投资 43.6 亿元。截至 2011 年 5 月 20 日，已下达到项目单位中央投资计划 47.1 亿元、地方配套投资计划 22.5 亿元，投资计划下达率分别为 52.2%和 51.7%。其中农村饮水安全工程、大型灌区续建配套与节水改造工程、重大水利工程分别下达中央投资计划 31.8 亿元、10.9 亿元、4.4 亿元，投资计划下达率分别为 79.6%、54.3%和 14.6%。


2011 年中央财政水利专项资金预算共 316 亿元，截至 2011 年 5 月 20 日，共分解下达项目单位 101.1 亿元，预算分解下达

率为 32.0%，其中中小河流治理、小型病险水库除险加固和小型农田水利建设分别下达 43.2 亿元、44.0 亿元和 13.9 亿元，预算分解下达率分别为 48.0%、27.8%和 20.4%。当前报送下达地方预算 24.1 亿元，下达率为 98.1%；。

二、资金到位情况


截至 2011 年 5 月 20 日，2010 年中央预算内水利投资计划已拨付到位项目单位中央投资 629.9 亿元、地方配套投资 446.7 亿元，到位率分别为 96.9%和 91.7%（见图 1）。其中，农村饮水安全工程、大中型病险水库除险加固工程、大型灌区续建配套与节水改造工程、重大水利工程分别拨付到位地方配套投资 116.7 亿元、14.1 亿元、37.3 亿元、278.6 亿元，到位率分别为 100%、89.5%、81.2%和 87.6%。

图1 2010年中央预算内投资地方配套投资拨付率
(按地区分)

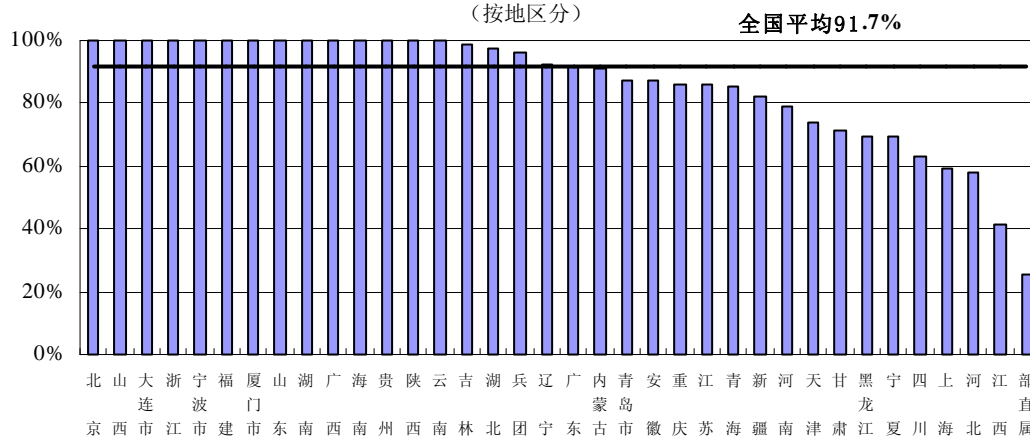

亿元，到位率分别为 79.8%、50.8%和 90.6%。

图2 2010年中央财政水利专项投资计划地方配套投资拨付率
(按地区分)

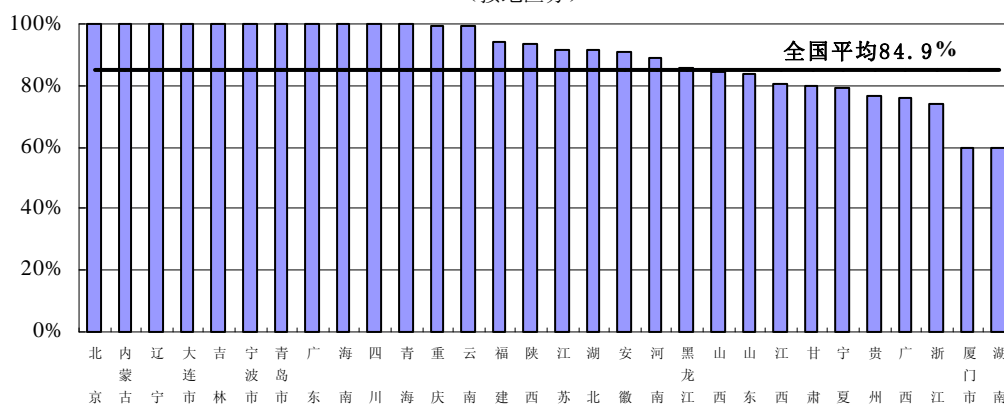

截至 2011 年 5 月 20 日，2011 年中央预算内水利投资计划已拨付到位项目单位中央投资 11.5 亿元、地方配套投资 1.9 亿元，到位率分别为 12.8%和 4.4%；2011 年中央财政水利专项资金已拨付项目单位 52.2 亿元、地方配套资金 11.6 亿元，到位率分别为 16.5%和 47.0%。

三、前期工作和开工情况

2010 年中央水利投资计划已分解落实水利建设项目 9232 个，其中中央预算内水利建设投资计划 5561 个，中央财政水利专项资金 3671 个。

2011 年中央水利投资计划已分解落实水利建设项目 1271 个，其中中央预算内水利建设投资计划 334 个，中央财政水利专项资金 937 个。

1、前期工作情况。截至 2011 年 5 月 20 日，2010 年中央预算内水利投资计划共有 4575 个项目完成初步设计或实施方案的


编制或审查工作；4143个项目完成技施设计；当前报送需开展招标的标段（标的）20626个，已完成19784个，已完成招标投标投资439.1亿元，占需招标投标投资的76.6%；2714个项目完成设备采购合同。2010年中央财政水利专项资金有2854个项目完成初步设计或实施方案的编制或审查工作；2463个项目完成技施设计；当前报送需开展招标的标段（标的）5048个，已完成4687个，已完成招标投标投资164.7亿元；903个项目完成设备采购合同。

截至2011年5月20日，2011年中央预算内水利投资计划共有108个项目完成初步设计或实施方案的编制或审查工作；69个项目完成技施设计；当前报送需开展招标的标段（标的）311个，已完成220个，已完成招标投标投资4.6亿元；30个项目完成设备采购合同。2011年中央财政水利专项资金有506个项目完成初步设计或实施方案的编制或审查工作；358个项目完成技施设计；当前报送需开展招标的标段（标的）423个，已完成274个，已完成招标投标投资6.8亿元；57个项目完成设备采购合同。

2、项目开工情况。截至2011年5月20日，2010年中央水利投资项目共有8502个项目开工建设，开工率为92.1%。其中中央预算内水利投资计划开工5076个，中央财政水利专项资金开工3426个，开工率分别为91.3%和93.3%。

截至2011年5月20日，2011年中央水利投资项目共有210个项目开工建设。其中中央预算内水利投资计划开工20个，中

图4 2010年中央财政水利专项投资完成率
(按地区分)

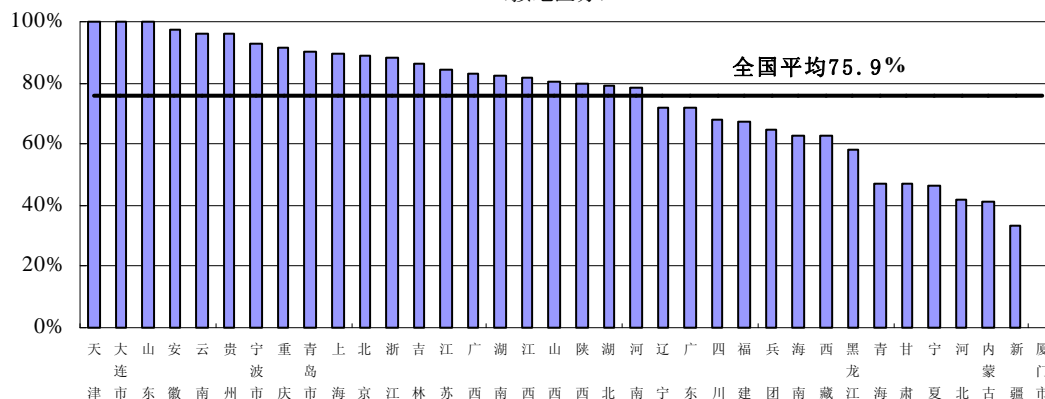

截至2011年5月20日，2011年中央预算内水利投资计划已累计完成投资2.0亿元，其中中央投资1.5亿元、地方配套投资0.5亿元。在完成的中央投资中，农村饮水安全工程1.5亿元、大型灌区续建配套与节水改造工程0.02亿元。

2011年中央财政水利专项资金已累计完成6.7亿元，其中中央资金4.7亿元、地方配套资金2.0亿元。在完成的中央资金中，中小河流治理1.1亿元、小型病险水库除险加固0.5亿元、小型农田水利建设3.1亿元。

五、工程进展情况

2010年中央水利投资计划已开工项目累计投入劳动力27837.3万工日，累计完成土方130751.4万方，石方13397.6万方，砼2470.3万方，金属结构40.9万吨。累计解决农村饮水安全人口6186.4万人，累计新建及加固堤防长度2203.9公里，河道清淤疏浚和岸线整治2908.1公里，累计新增渠道整治和防渗长度19915.6公里，累计治理水土流失面积5523.7平方

公里。

2011年中央水利投资计划已开工项目累计投入劳动力93.9万工日，累计完成土方999.5万方，石方15.1万方，砼2.9万方。

上期旬报中，山东2010年小型病险水库除险加固工程地方配套数据报送错误，辽宁、广东2010年已完成钢材工程量数据报送错误，陕西2011年已完成石方工程量数据报送错误，本期更正，导致相关数据变小。

目前，黑龙江、江苏、山东、四川中小河流治理未分解到项目；江苏、湖南、海南、四川、西藏小型病险水库除险加固工程未分解到项目；内蒙古、黑龙江、江苏、海南、四川、新疆小型农田水利建设未分解到县。

北京、大连、吉林、黑龙江、上海、宁波、厦门、青岛、湖北、广东、广西、海南、重庆、西藏、宁夏、新疆、兵团还未上报2011年中央水利投资落实情况。

请各省（自治区、直辖市）水利（水务）厅（局）进一步加强旬报工作，按要求及时上报，已分解到项目的，逐项目报送信息。

发送：部领导，总工程师、总规划师，部有关司局、直属单位；国家发展改革委投资司、农经司；财政部经建司、农业司；监察部综合室；国家审计署投资司、农林水审计局；有关省（自治区、直辖市）政府主管领导、水利（水务）厅（局），有关计划单列市水利（水务）局，新疆生产建设兵团水利局。

共印 130 份
