

中央水利投资计划执行情况

旬报

第 15 期

水利部规划计划司

2011 年 6 月 10 日

2010 年累计安排中央水利投资计划 908.3 亿元（不含南水北调 65 亿元），其中中央预算内投资 650.3 亿元（含中央水利建设基金 14.2 亿元），主要安排农村饮水安全工程 200 亿元、大中型病险水库除险加固工程 26.4 亿元、大型灌区续建配套与节水改造工程 71.0 亿元、重大水利工程 352.8 亿元；中央财政水利专项资金 258 亿元，主要安排中小河流治理 80 亿元、小型病险水库除险加固 100 亿元、小型农田水利建设 78 亿元。

2011 年累计安排中央水利投资计划 567.0 亿元，其中中央预算内投资 251.0 亿元，主要安排农村饮水安全工程 200 亿元、大型灌区续建配套与节水改造工程 20 亿元、重大水利工程 31.0 亿元；中央财政水利专项资金 316 亿元，主要安排中小河流治理 90 亿元、小型病险水库除险加固 158 亿元、小型农田水利建设 68 亿元。

一、投资计划下达情况

2010 年中央预算内水利投资 650.3 亿元，要求地方配套投

资 487.1 亿元。截至 2011 年 6 月 10 日，已下达到项目单位中央投资计划 648.0 亿元、地方配套投资计划 507.0 亿元，投资计划下达率分别为 99.7%和 100%。其中农村饮水安全工程、大中型病险水库除险加固工程、大型灌区续建配套与节水改造工程、重大水利工程分别下达中央投资计划 200 亿元、26.4 亿元、71.0 亿元、350.6 亿元，投资计划下达率分别为 100%、100%、100%和 99.4%。

2010 年中央财政水利专项资金预算共 258 亿元，截至 2011 年 6 月 10 日，共分解下达到项目单位 247.0 亿元，预算分解下达率为 95.7%，其中中小河流治理、小型病险水库除险加固和小型农田水利建设分别下达 78.9 亿元、90.8 亿元和 77.4 亿元，预算分解下达率分别为 98.6%、90.8%和 99.2%。当前下达地方预算 157.9 亿元，下达率为 98.2%。

2011 年中央预算内水利投资 251.0 亿元，要求地方配套投资 127.2 亿元。截至 2011 年 6 月 10 日，已下达到项目单位中央投资计划 68.9 亿元、地方配套投资计划 29.3 亿元，投资计划下达率分别为 27.4%和 13.0%。其中农村饮水安全工程、大型灌区续建配套与节水改造工程、重大水利工程分别下达中央投资计划 51.6 亿元、12.8 亿元、4.5 亿元，投资计划下达率分别为 25.8%、63.9%和 14.5%。


2011 年中央财政水利专项资金预算共 316 亿元，截至 2011 年 6 月 10 日，共分解下达项目单位 141.2 亿元，预算分解下达

率为 44.7%，其中中小河流治理、小型病险水库除险加固和小型农田水利建设分别下达 56.6 亿元、67.8 亿元和 16.9 亿元，预算分解下达率分别为 62.9%、42.9%和 24.8%。当前报送下达地方预算 27.1 亿元，下达率为 98.1%。

二、资金到位情况

截至 2011 年 6 月 10 日，2010 年中央预算内水利投资计划已拨付项目单位中央投资 632.6 亿元、地方配套投资 455.9 亿元，到位率分别为 97.3%和 93.6%（见图 1）。其中，农村饮水安全工程、大中型病险水库除险加固工程、大型灌区续建配套与节水改造工程、重大水利工程分别拨付到位地方配套投资 116.7 亿元、14.2 亿元、37.8 亿元、287.3 亿元，到位率分别为 100%、89.6%、82.3%和 90.3%。


图1 2010年中央预算内投资地方配套投资拨付率
(按地区分)

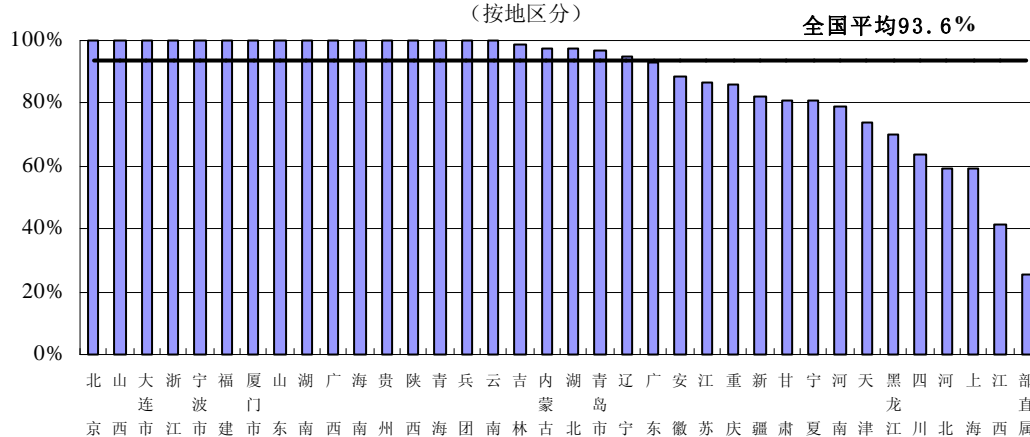

2010 年中央财政水利专项资金已拨付项目单位 243.8 亿元、地方配套资金 140.6 亿元，到位率分别为 94.5%和 87.4%（见图 2）。地方配套资金中，中小河流治理、小型病险水库除险加固和小型农田水利建设分别拨付到位 32.3 亿元、6.3 亿元和 102.0

亿元，到位率分别为 82.5%、51.1%和 93.3%。

图2 2010年中央财政水利专项投资计划地方配套投资拨付率
(按地区分)

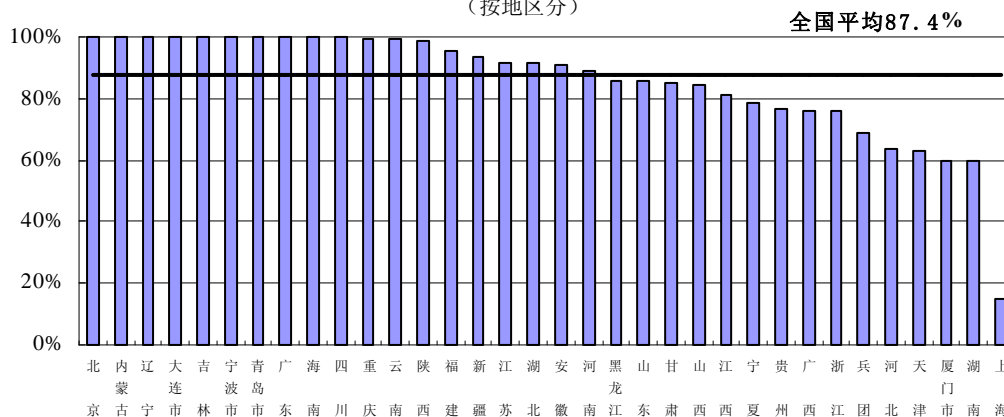

截至 2011 年 6 月 10 日，2011 年中央预算内水利投资计划已拨付项目单位中央投资 24.6 亿元、地方配套投资 7.2 亿元，到位率分别为 9.8%和 5.6%；2011 年中央财政水利专项资金已拨付项目单位 91.1 亿元、地方配套资金 13.1 亿元，到位率分别为 28.8%和 47.4%。

三、前期工作和开工情况

2010 年中央水利投资计划已分解落实水利建设项目 9592 个，其中中央预算内水利建设投资计划 5562 个，中央财政水利专项资金 4030 个。

2011 年中央水利投资计划已分解落实水利建设项目 2327 个，其中中央预算内水利建设投资计划 431 个，中央财政水利专项资金 1896 个。

1、前期工作情况。截至 2011 年 6 月 10 日，2010 年中央预算内水利投资计划共有 4623 个项目完成初步设计或实施方案的


编制或审查工作；4193个项目完成技施设计；当前报送需开展招标的标段（标的）20728个，已完成19937个，已完成招标投标投资446.6亿元，占需招标投标投资的76.9%；2752个项目完成设备采购合同。2010年中央财政水利专项资金有2973个项目完成初步设计或实施方案的编制或审查工作；2557个项目完成技施设计；当前报送需开展招标的标段（标的）5137个，已完成4803个，已完成招标投标投资165.9亿元；936个项目完成设备采购合同。

截至2011年6月10日，2011年中央预算内水利投资计划共有157个项目完成初步设计或实施方案的编制或审查工作；112个项目完成技施设计；当前报送需开展招标的标段（标的）458个，已完成310个，已完成招标投标投资7.6亿元；43个项目完成设备采购合同。2011年中央财政水利专项资金有863个项目完成初步设计或实施方案的编制或审查工作；542个项目完成技施设计；当前报送需开展招标的标段（标的）888个，已完成387个，已完成招标投标投资11.9亿元；81个项目完成设备采购合同。

2、项目开工情况。截至2011年6月10日，2010年中央水利投资项目共有9080个项目开工建设，开工率为94.7%。其中中央预算内水利投资计划开工5227个，中央财政水利专项资金开工3853个，开工率分别为94.0%和95.6%。

截至2011年6月10日，2011年中央水利投资项目共有599个项目开工建设。其中中央预算内水利投资计划开工81个，中

图4 2010年中央财政水利专项投资完成率
(按地区分)

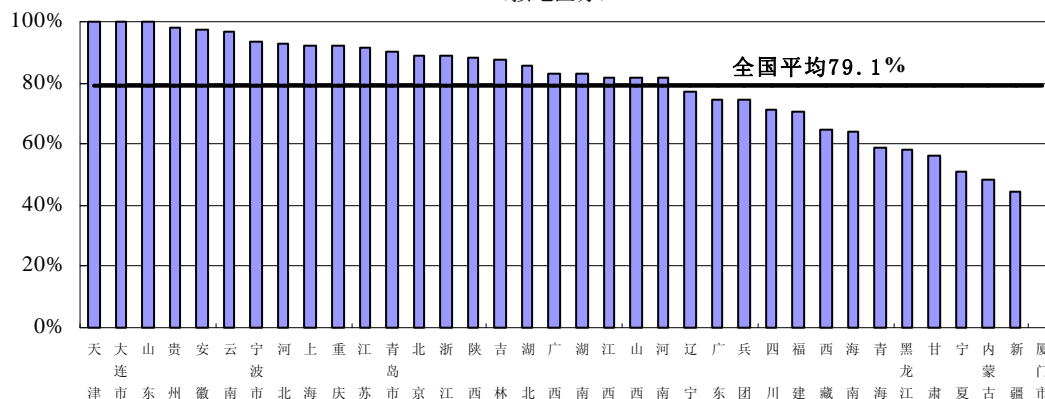

截至2011年6月10日，2011年中央预算内水利投资计划已累计完成投资16.1亿元，其中中央投资11.1亿元、地方配套投资5.0亿元。在完成的中央投资中，农村饮水安全工程5.1亿元、大型灌区续建配套与节水改造工程3.4亿元、重大水利工程2.6亿元。

2011年中央财政水利专项资金已累计完成11.2亿元，其中中央资金7.6亿元、地方配套资金3.6亿元。在完成的中央资金中，中小河流治理3.0亿元、小型病险水库除险加固1.2亿元、小型农田水利建设3.5亿元。

五、工程进展情况

2010年中央水利投资计划已开工项目累计投入劳动力28713.7万工日，累计完成土方134614.3万立方米，石方14320.8万立方米，砼2554.4万立方米，金属结构42.1万吨。累计解决农村饮水安全人口6186.4万人，累计新建及加固堤防长度2470.7公里，河道清淤疏浚和岸线整治3014.8公里，累

计新增渠道整治和防渗长度 19979.9 公里，累计治理水土流失面积 5610.4 平方公里。

2011 年中央水利投资计划已开工项目累计投入劳动力 385.6 万工日，累计完成土方 4159.7 万立方米，石方 629.2 万立方米，砼 13.1 万立方米。

目前，黑龙江、江苏、山东中小河流治理未分解到项目；江苏、四川、西藏小型病险水库除险加固工程未分解到项目；黑龙江、江苏、四川小型农田水利建设未分解到县。

北京、大连、黑龙江、宁波、厦门、青岛、广东、西藏、宁夏、新疆还未上报 2011 年中央水利投资落实情况。

请各省（自治区、直辖市）水利（水务）厅（局）进一步加强旬报工作，按要求及时上报，已分解到项目的，逐项目报送信息。

发送：部领导，总工程师、总规划师，部有关司局、直属单位；国家发展改革委投资司、农经司；财政部经建司、农业司；监察部综合室；国家审计署投资司、农林水审计局；有关省（自治区、直辖市）政府主管领导、水利（水务）厅（局），有关计划单列市水利（水务）局，新疆生产建设兵团水利局。

共印 130 份
